
IT-Projektmarketing

Öller I SS 2025




Literatur (1/2)



Tiemeyer, Ernst (Hrsg.) (2018).
Handbuch IT-Projektmanagement:
Vorgehensmodelle, Managementinstrumente,
Good Practices. Carl Hanser Verlag: München.

€ 54,-

Literatur (2/2)

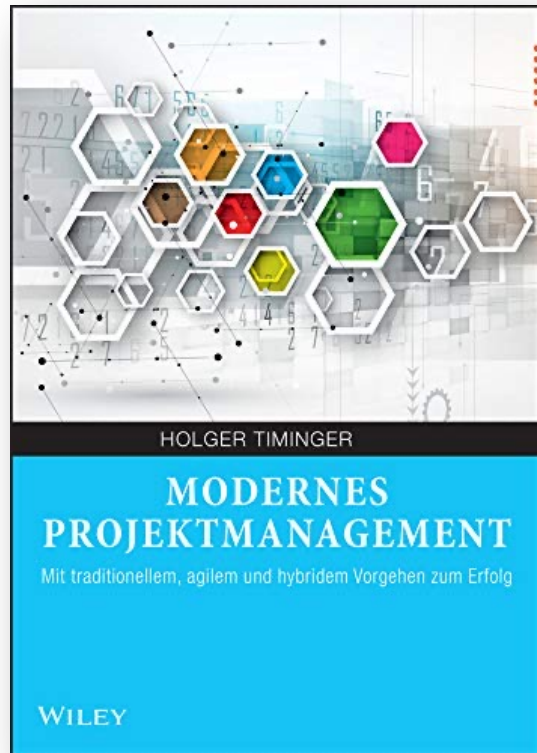

Timinger, Holger (2017). Modernes Projektmanagement – Mit traditionellem, agilem und hybridem Vorgehen zum Erfolg. Wiley-VCH Verlag: Weinheim.

€ 32,99,-

IT-Projektmarketing

IT-Projektmarketing

- Aufgabe des IT-Projektmarketings ist es Akzeptanz für das Produkt „Projekt“ zu schaffen
- $\text{Erfolg} = \text{Qualität} * \text{Akzeptanz}$
- Projektmarketing umfasst alle Aktivitäten, die dazu dienen, Projekte in ihrem Umfeld besser bekannt zu machen und die Akzeptanz ihrer Prozesse und Ergebnisse zu erhöhen
- Der Fokus beim Projektmarketing liegt auf der Kommunikation des Projekts
- Es umfasst all jene Aktivitäten, die der Erhöhung des Bekanntheitsgrades und der Imagestärkung dienen
- Projektmarketing soll helfen Informationsdefizite zu vermeiden und somit Befürchtungen der User zu reduzieren und „individuelle Informationsvervollständigungen“ zu reduzieren

Beispiele für Informationsdefizite

- Das Projektergebnis und der geplante Einsatz werden nicht bekannt gemacht
- Informationen über den Nutzen aus den Projektergebnissen für den Kunden und den Anwender fehlen
- Die strategische Bedeutung für das Unternehmen ist nicht bekannt
- Informationen über fachliche Herausforderungen in der technischen Realisierung fehlen
- Keine Information hinsichtlich der Komplexität des Projekts
- Nicht ausreichend Informationen hinsichtlich gesellschaftlicher und öffentlichkeitswirksamer Aspekte des Projekts

Anforderungen an das IT-Projektmarketing

- Daten durch entsprechende Informationen richtig darstellen
 - Beispiel:
 - im Rahmen der Meilenstein-Trendanalyse ist ein Verzug des Projektes ersichtlich
 - ohne weitere Informationen wird dieser Verzug der Projektleitung angekreidet
 - mit den entsprechenden Informationen dazu kann der Grund für den Verzug ersichtlich und verständlich gemacht werden

IT-Projektmarketing braucht... I

- rationale Faktoren in der Projektdarstellung (Hard Facts):
 - Kundennutzen
 - Anwendernutzen
 - wirtschaftlicher Nutzen für das Unternehmen
 - eingesetzte Technologie
 - Produktinnovationen
 - Methoden und Know-How für Projektabwicklung
 - Angaben zur Projektgröße (Projektkosten, Mitarbeiteranzahl, usw.)

IT-Projektmarketing braucht... II

- emotionale Faktoren in der Projektdarstellung (Soft Facts):
 - gesellschaftliche Position des Kunden
 - Art der Geschäfte des Kunden
 - Strategie des Unternehmens
 - Möglichkeit der fachlichen/ beruflichen Weiterentwicklung
 - Herausforderungen für die Mitarbeiter
 - handelnde Personen (PL, Team, usw.)
- die genannten emotionalen Faktoren beeinflussen die persönliche Haltung zum Projekt in Bezug auf:
 - die Motivation zur Mitarbeit
 - Mit(er)leben wollen
 - Zustimmung zum Projekt
 - Ethische Grundsätze

IT-Projektmarketing Konzepte

Produktmarketing vs. Projektmarketing

- das strategische Dreieck stellt die klassische Form des Produktmarketings vor:
 - Das Produkt, das von
 - einer Organisation
 - dem Markt/ den Zielgruppen werbend dargestellt wird.
- im Vergleich zum Projektmarketing:
 - Das Projekt, das von
 - der Projektorganisation
 - dem Umfeld werbend dargestellt wird.
- Grundsatz:
 - Die Art und der Umfang des IT-Projektmarketings kann variieren und muss je nach Situation und Projekt individuell angepasst werden.

Interne Ziele des Projektmarketings

- interne Ziele = nach innen gerichtete Ziele sollen Einfluss auf:
 - das Projektteam
 - das Management und
 - das gesamte Unternehmen haben
- folgende Themen sind in Hinblick auf die Zustimmung zum Projekt wichtig:
 - Identifikation mit den Projektzielen: durch den Projektleiter und alle –mitarbeiter
 - Sicherung von Kooperation und Mitarbeit: Vorgesetzte früh genug miteinbeziehen, um entsprechend notwendige Mitarbeiter zu bekommen
 - Transparenz: Regelmäßige Information über den aktuellen Stand, über Zusammenhänge, Ursachen und Entscheidungshintergründe, damit Mitarbeiter ausreichend Informationen haben, um Verbesserungsvorschläge einbringen zu können

Interne Ziele des Projektmarketings

- folgende Themen sind in Hinblick auf die Zustimmung zum Projekt wichtig:
 - Eigenmarketing: „Tue Gutes und sprich darüber.“ Aber Achtung: Mit Maß und Ziel (sollte nicht in Selbstverherrlichung ausarten).
 - Beziehung zum Kunden/ Auftraggeber: Regelmäßige Info über die Entwicklung und den Fortschritt des Projekts
 - Motivation: Ziel sollte es sein alle von der Sinnhaftigkeit des Projekts zu überzeugen und durch Einbindung, Anerkennung und Überzeugung die entsprechende Motivation zu erreichen
 - Bildung von Vertrauen: durch die entsprechende Kultur im Projekt (Kompetenz, Umsichtigkeit, Zuverlässigkeit und Engagement)

Externe Ziele des Projektmarketings

- externe Ziele sind auf die Zielgruppen im Projektumfeld ausgerichtet, die außerhalb des Unternehmens stehen (d.h. Kunden und Anwender)
 - bei internen Projekten sind die Kunden z.B.: die Mitarbeiter des Unternehmens
- externe Ziele sind:
 - Kundenbindung: durch eine professionelle Art und Weise, sowie ein gutes Auftreten dem Kunden gegenüber, um eine Bindung aufzubauen
 - Anregung zum Auftrag, Akquisition: die Projektidee entsprechend verkaufen; dies kann durch die Vorstellung von Referenzprojekten unterstrichen werden
 - Verbesserung der Marktpräsenz: gezielte Information über die Projektkompetenz
 - Attraktive Darstellung des Projekts: die attraktive Darstellung nach außen hat einen positiven Einfluss auf die Mitarbeiter, die in dem Projekt arbeiten (Aufwertung)

Aktive und Passive Projektmarketingmaßnahmen

- aktive Projektmarketingmaßnahmen:
 - Kommunikation von mindestens 2 Personen miteinander, wobei eine unmittelbare Reaktion möglich ist (Gespräch)
- passive Projektmarketingmaßnahmen:
 - die Informationen werden in unterschiedlichster Form (Brief, Mail, Plakat usw.) weitergegeben; Fragen und Feedback sind bei dieser Form zeitlich versetzt

Projektmarketing in der Projektinitiierung

- in diesem Fall werden die Maßnahmen unterstützend verwendet, um ein Projekt zu fixieren
- entscheidende Schritte zur weiteren Verfolgung einer Idee sind:
 - eine Präsentation der Grundidee inkl. dem Nutzen für das Unternehmen
 - die Darstellung von nicht quantifizierbaren Nutzaspekten (Know-How, Mitarbeitermotivation usw.)
 - Vergleiche mit anderen Unternehmen
 - Unterstützung durch Experten und Mitglieder des Managements
 - Darstellung des wirtschaftlichen Nutzens und einer nachhaltigen Wirkung (ROI, usw.)
 - Realisierungskonzept
- in welchem Umfang die Maßnahmen notwendig sind hängt von der Einstellung der Mitarbeiter und des Managements zu diesem Projekt ab (je mehr Zustimmung, desto weniger Marketing ist notwendig)

Projektmarketing in der Projektstartphase

- die erste Grundregel an dieser Stelle lautet ein einheitliches Erscheinungsbild zu schaffen:
 - aussagekräftiger Projektname
 - Projektlogo
 - Projektmotto
 - Projektraum
 - Projektposter /-plakat
- Kick-off Meeting:
 - eine der wichtigsten Maßnahmen in dieser Phase
 - die Mitarbeiter sollen mit allen Rahmenbedingungen vertraut gemacht werden
 - Förderung der Akzeptanz und der Motivation
- Projektstartworkshop:
 - hier arbeitet das Team das erste Mal zusammen, mit dem Ziel die Projektplanung zu erarbeiten

Projektmarketing in der Projektrealisierungsphase

- wichtig ist hier Transparenz zum aktuellen Projektfortschritt zu schaffen
- in dieser Phase muss regelmäßig der aktuelle Stand weitergegeben werden inkl. Zusammenhänge und Hintergründe bei Problemen
- das Erreichen von Meilensteinen sollte ebenfalls immer kommuniziert werden, da es einen positiven Einfluss auf die Motivation des Teams haben kann
- bei Projekten mit internen Veränderungen sollten „interne Informationsveranstaltungen“ angeboten werden, dies hilft die Akzeptanz zu erhöhen und Feedback zu bekommen
- zusätzlich sind Veranstaltungen mit einem sozialen Charakter wichtig, um das Gemeinschaftsgefühl zu fördern

Projektmarketing in der Projektabschlussphase I


- in dieser Phase soll das abgeschlossene Projekt mit seinem tatsächlichen Verlauf und dem Erreichen der Ziele dargestellt werden
- im Rahmen eines Projektabschlussworkshops soll die Darstellung des Projektabschlusses erarbeitet werden
- Folgende Inhalte sollten bei der Präsentation des Projektabschlusses nicht fehlen:
 - Wurden die ursprünglichen Ziele erreicht?
 - Welchen Nutzen hat das Projekt für das Unternehmen gebracht?
 - War das Projektteam den Herausforderungen gewachsen?
 - Wie ist der Kunde mit dem Ergebnis zufrieden?
 - Welche Erfahrungen gibt es aus diesem Projekt für die Zukunft?
 - Trägt das Projekt zur Imagestärkung des Unternehmens bei?

Projektmarketing in der Projektabschlussphase II

- zu den passiven Projektmarketingmaßnahmen zählen:
 - Projektabschlussbericht
 - Erfahrungsbericht
 - Projektportal im Intranet
 - Info in Firmenzeitung/ Newsletter
- Aktive Maßnahmen:
 - Abschlussveranstaltung mit Ergebnispräsentation
 - Abschlussfeier

Instrumente für das IT-Projektmarketing

- Kommunikation
 - die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Maß kommunizieren
- Präsentation/ Visualisierung
 - Ideenpräsentation
 - Ergebnispräsentation usw.
- Argumentation
 - Unsicherheiten beseitigen mithilfe von überprüfbaren Tatsachen, Berufung auf Experten, usw.
- situative Gesprächsführung
- Projektidentität
 - Projektname, Projektlogo, usw.
- Networking

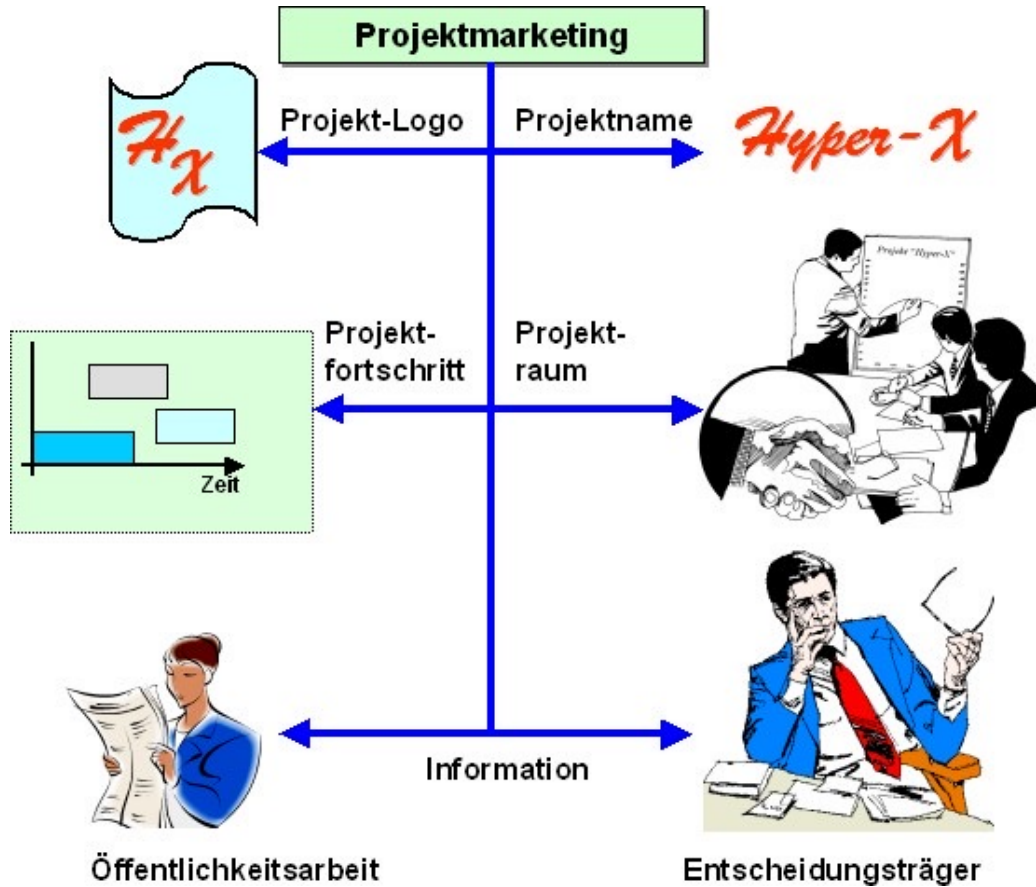

Fragen?

