
IT-Projektmanagement

➤ Funktionales Projektmanagement

- Projektreporting

Öller I | SS 2025




Literatur (1/2)



Tiemeyer, Ernst (Hrsg.) (2018).
Handbuch IT-Projektmanagement:
Vorgehensmodelle, Managementinstrumente,
Good Practices. Carl Hanser Verlag: München.

€ 54,-

Literatur (2/2)

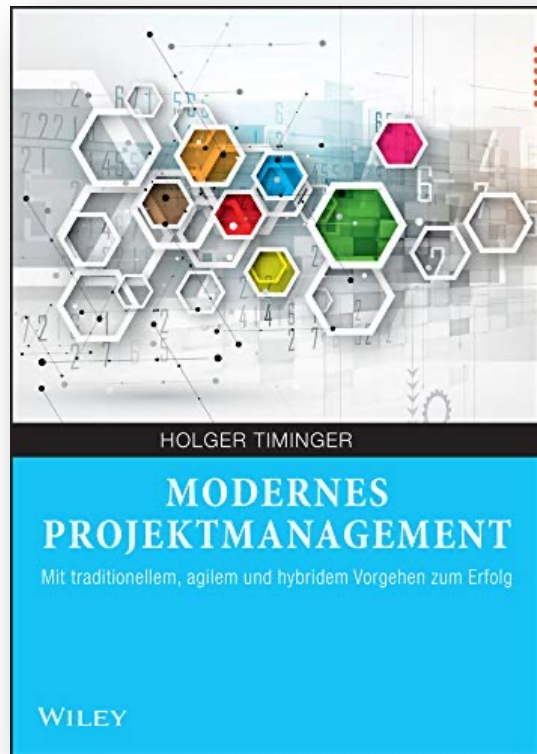

Timinger, Holger (2017). Modernes Projektmanagement – Mit traditionellem, agilem und hybridem Vorgehen zum Erfolg. Wiley-VCH Verlag: Weinheim.

€ 32,99,-

Projektreporting

Allgemeines zum Projektreporting

- Zur zielgerechten Steuerung und erfolgreichen Implementierung des Projekts sind in regelmäßigen Abständen geeignete Informationen je Zielgruppe (Auftraggeber, Kunde, Projektbüro, Projektlenkungsausschuss, usw.) notwendig
- Reporting ist ein wichtiges Koordinations- und Kommunikationsinstrument für IT-Projekte
- Das Reporting hilft den Projektstatus zu dokumentieren und Entscheidungen zu treffen
- Gute Projektreports stellen auf wenigen Seiten alle komplexen Zusammenhänge und Aktivitäten dar

Gestaltungsfragen des Reportings

- Der Inhalt (was?)
- Die Person des Berichterstatters und des Empfängers (wer?)
- Die Form (wie?)
- Der Zeitpunkt der Berichterstattung (wann?)

Zwecke des Reportings

- Unterstützung der Planung, Steuerung und Kontrolle der IT-Projekte
- Kommunikation mit Stakeholdern sowie Informationen zur Orientierung für die Projektmitarbeiter

Wesentliche Zielgruppen


- Projektauftraggeber
- Projektleitungen (Informationen zu anderen parallel laufenden Projekten)
- Projektteam
- Projektoffice
- Project Advisory Board
- Geschäftsführung
- Kunden

→ je nach Zielgruppe sind bei den Reportings unterschiedliche Informationen notwendig

Inhalte eines Projektreports I

■ Stand der Projektarbeiten (AP laut PSP bzw. Projektergebnisse laut PSP):

- erledigte AP
- in Arbeit
- in Unterbrechung
- offen

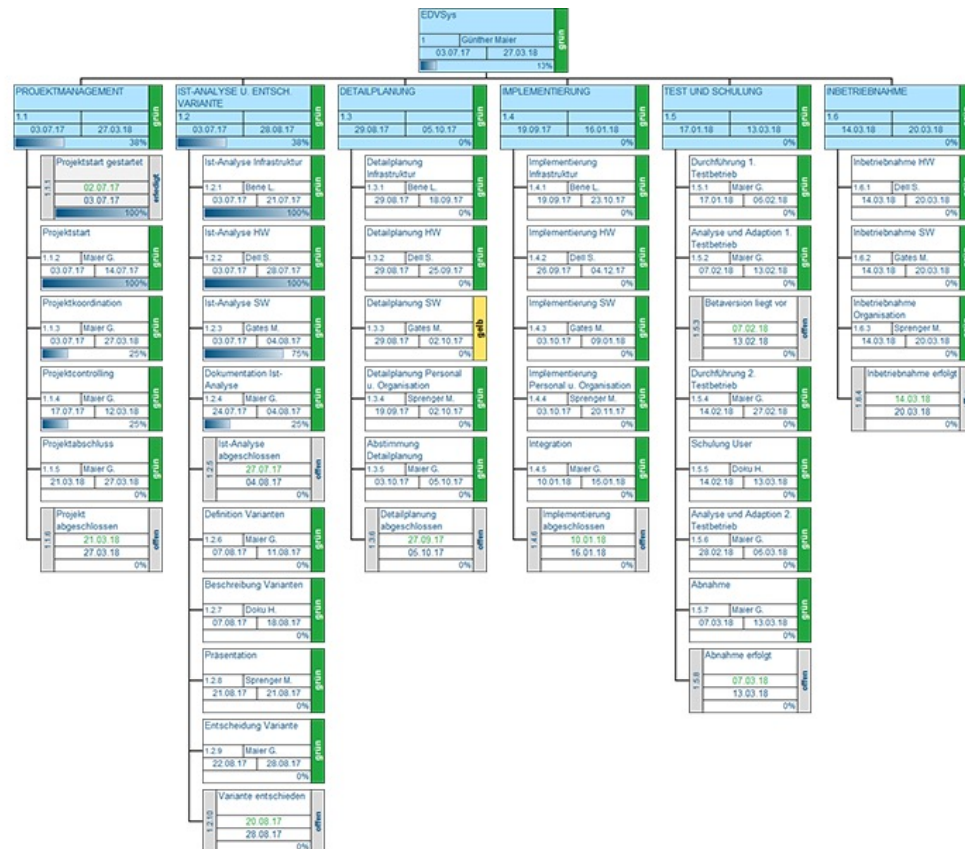

Inhalte eines Projektreports II

■ Terminplan der Projektaktivitäten/ Projektergebnisse

- Soll-Termine
- Ist-Termine

■ Kostenplan:

- Soll-Kosten
- Ist- Kosten

Kosten in t€	Plantermine	Isttermine	Plankosten	Istkosten	Plankosten kumuliert	Istkosten kumuliert
Projektstart	01.01.	01.01.	0	0	0	0
AP1	31.03.	31.03.	120	125	120	125
AP2	30.04.	20.05.	200	220	320	345
AP3	30.09.	30.10.	410	300	730	645
AP4	30.11.		120		850	
AP5	31.12.		100		950	
Projektende	31.12.		0		950	

■ Übersicht der Kapazitätsbelastung:

- Personentage

■ Abweichungsanalysen:

- Beschreibung der Auswirkungen von Abweichungen
- Unterbreitung von Vorschlägen als Steuerungsmaßnahme

Inhalte eines Projektreports III

- Stand des Projektbudgets (als Tabelle):
 - Planansatz
 - bisher verbraucht
 - noch verfügbar
 - Abweichung gegenüber dem Planansatz
- Hinweis auf Probleme, Risiken:
 - Aktuelle Engpässe in der Projektarbeit
 - Sachverhalte, die einer Änderung bedürfen
 - Ggf. Risikobewertung (wenn die Änderungen gravierend sind)
- Handlungsbedarf:
 - notwendige personelle Maßnahmen
 - notwendige Kosten- und Finanzplananpassungen
 - notwendige Veränderungen in den Aktivitäten (Plananpassungen)

Inhalte eines Projektreports IV

- Projektbezogene Kennzahlen:
 - Kostenbezogene Kennzahlen (was ist bereits angefallen, Restkosten)
 - Terminbezogene Kennzahlen (Plan-, Ist-Termine, Einhaltung Meilensteine)
 - Kapazitäten (Auslastung)
- Der Bericht sollte generell klare, zielorientierte Daten enthalten, empfängerorientiert aufbereitet sein und eine ansprechende Optik haben (grafische Darstellungen).

Gestaltung Projektreporting

- Durch folgende Faktoren kann die Aufmerksamkeit und Informationsaufnahme der Zuhörer im Statusmeeting erhöht werden:
 - die Nutzung von Farbe
 - Beweglichkeit der Anzeige
 - Art der Anzeige
 - Gruppierungen
 - Strukturierungen und
 - Skalierungen.

Projektberichtsplan I

- Im Rahmen des Projekts sind folgende Punkte festzulegen:
 - Berichtsarten
 - Berichtszeiten und –termine und
 - Übermittlungsform (Mail, online, in Papierform)
- Zusätzlich wird definiert, wer welche Berichte erstellt

Projektberichtsplan II

Berichtsart	Verantwortlich	Zeitpunkt	Empfänger
Statusbericht AP	AP-Verantwortlicher	Monatlich bzw. bei Abschluss AP	IT-Projektleiter bzw. Team
Projektplan	IT-Projektleiter	Vierteljährlich oder auf Anfrage	Projektlenausschuss, Projektbüro
Projektstatusbericht	IT-Projektleiter	Monatlich oder auf Anfrage	- Unternehmensführung - Projektlenausschuss - Projektbüro/ Auftraggeber/ Kunde
Meilensteinbericht	IT-Projektleiter	Bei Abschluss Projektphase oder Meilensteintermin	Teilnehmer Meilensteinabstimmung, Lenausschuss, Projektbüro
Zwischenbericht	IT-Projektleiter	Wie mit Auftraggeber vereinbart	Lenausschuss, Projektbüro, Auftraggeber, Kunde
QS-Bericht	QS-Beauftragter	Wie mit Auftraggeber vereinbart	Projektcontrolling, IT-Projektleitung

Projektberichtsplan III

- Anhand der Tabelle wird folgendes deutlich:
 - Mitarbeiter eines Arbeitspakets informieren den AP-Verantwortlichen über den Status ihrer Aufgaben
- Die Arbeitspaketverantwortlichen bereiten die Informationen über entsprechende AP auf und berichten direkt an den IT-Projektleiter
 - Alle Informationen werden vom IT-Projektleiter zusammengetragen und als Projektstatusbericht an die Unternehmensführung usw. übermittelt
 - Bei längeren (mehrjährigen) Projekten sind Zwischenberichte notwendig (an Projektleitungsausschuss usw.)

Beispiel Projektstatusbericht

Projektstatusbericht									
Projekt-Nr.:		P01							
Projekt:		Einführung ERP-Software							
Projektleiter:		Hans Mustermann							
Datum:		10.4.2017							
Kopie an:		Name1, Name2, Name3, Name4, Name5							
Zeit / Termine		Kosten / Budget		Ergebnisse / Qualität		Gesamtstatus		Was steht an?	
									
Zeit / Termine		Kosten / Budget		Ergebnisse / Qualität		Gesamtstatus		Nächste Schritte	
Entscheidungen									
Hier können Sie Bemerkungen erfassen. Die Ampel können Sie am unteren Rand einstellen.		Hier können Sie Bemerkungen erfassen. Die Ampel können Sie am unteren Rand einstellen.		Hier können Sie Bemerkungen erfassen. Die Ampel können Sie am unteren Rand einstellen.		Hier können Sie Bemerkungen erfassen. Die Ampel können Sie am unteren Rand einstellen.		Erfassen Sie hier Bemerkungen zu den nächsten Schritten im Projekt.	
Erfassen Sie hier die Entscheidungen, welche getroffen werden müssen.									
Ampelstatus	rot	Ampelstatus	grün	Ampelstatus	gelb	Ampelstatus	grün		


Checkliste Qualität Berichtswesen

- Ist ein formalisiertes Berichtswesen inkl. Berichtsplan vorhanden?
- Werden im Berichtswesen Einzelsichten wie Fortschritt im Projektergebnis, Termine, Kosten/ Aufwand ausreichend erfasst?
Gibt es auch eine Gesamtsicht?
- Sind die zeitlichen Abstände für die Einreichung der Berichte definiert?
- Erhält der Kunde eigens angepasste Berichte?
- Fließen im Rahmen von Berichtsstatusbesprechungen die Erkenntnisse gleich in die Überlegungen für Maßnahmen ein?
- Haben die Berichte eine Sanktions- oder Unterstützungsfunktion?
- Werden von Seiten des Managements Reaktionen auf Berichte gezeigt?

Meilensteintrendanalyse I


- Ist neben der Kostentrendanalyse eine Möglichkeit, Kennzahlen über die Projektlaufzeit hinweg zu verfolgen und Abweichungen festzustellen
- Hilft den inhaltlichen Projektfortschritt zu überwachen und zeigt, inwieweit Arbeitspakete zur Erreichung des Meilensteins zeitgerecht abgearbeitet werden
 - dadurch werden Abweichungen früh genug sichtbar und Korrekturmaßnahmen früh möglich

Meilensteintrendanalyse II

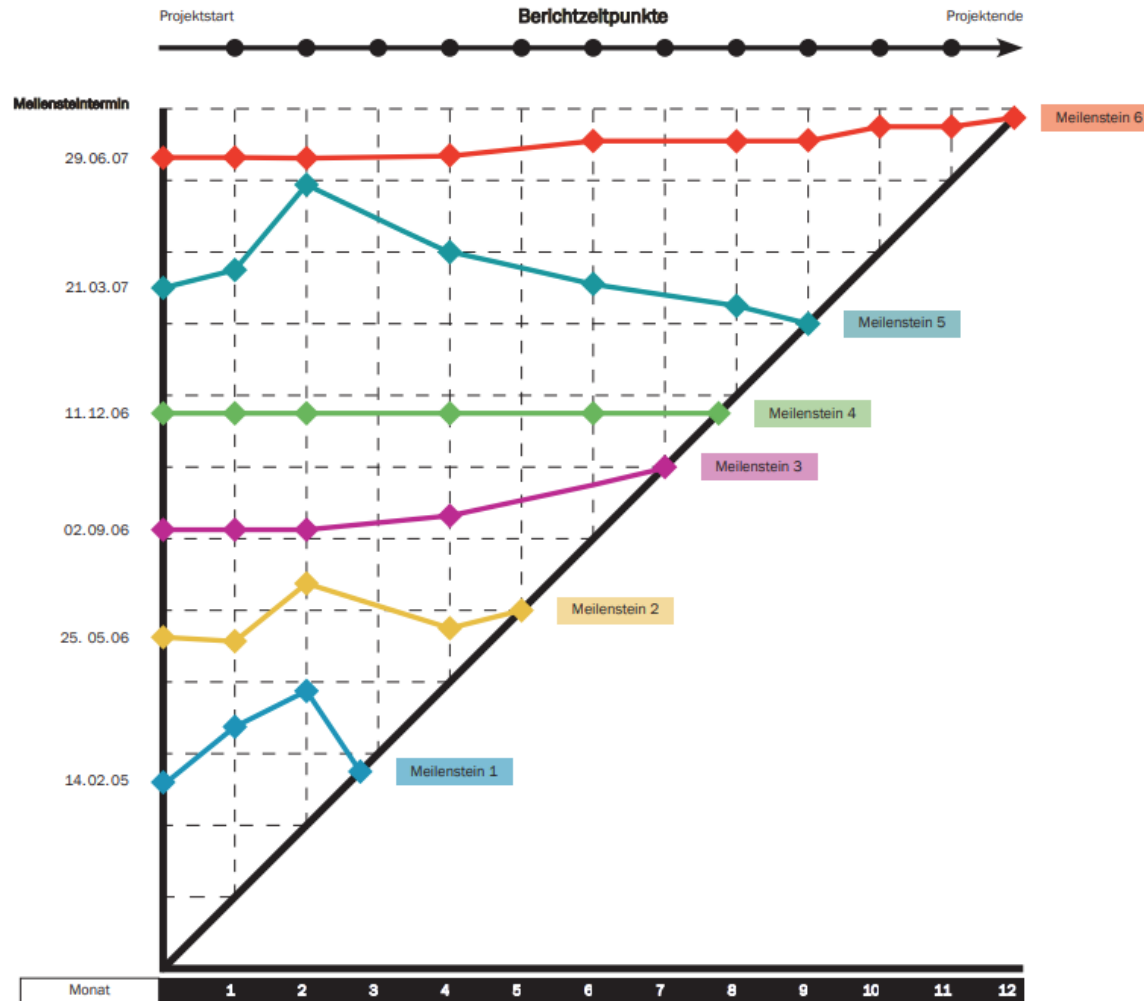

Kostentrendanalyse

- Zu jedem Berichtspunkt werden die Aufwände eingetragen und anschließend miteinander verbunden

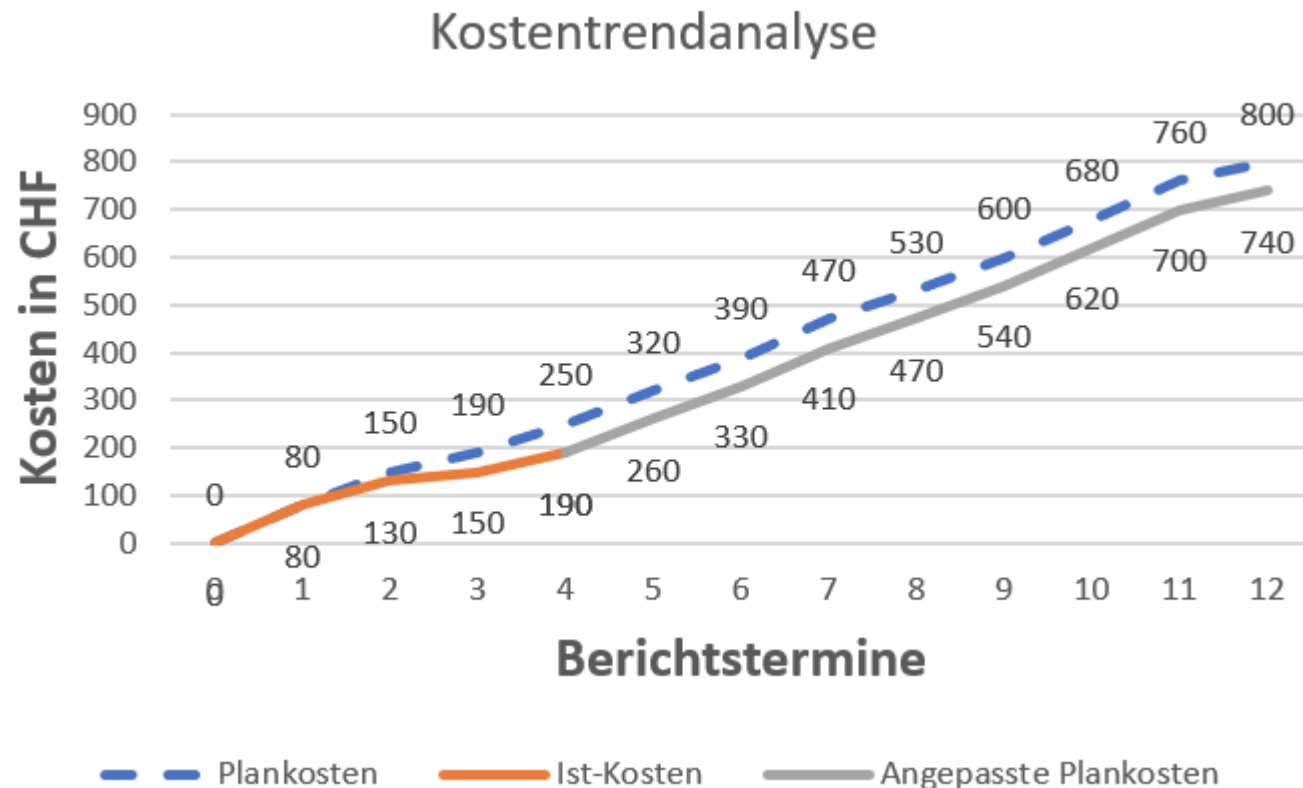

Maßnahmenentwicklung

- Auf Basis des Projektreports sollten bereits vor dem Präsentationstermin Maßnahmenvorschläge definiert werden
- Diese werden nach der Präsentation des Projektstatus präsentiert und fließen ggf. in die Entscheidungsfindung mit ein
