
Projektabschluss

Öller I SS 2025




Literatur (1/2)



Tiemeyer, Ernst (Hrsg.) (2018).
Handbuch IT-Projektmanagement:
Vorgehensmodelle, Managementinstrumente,
Good Practices. Carl Hanser Verlag: München.

€ 54,-


Literatur (2/2)

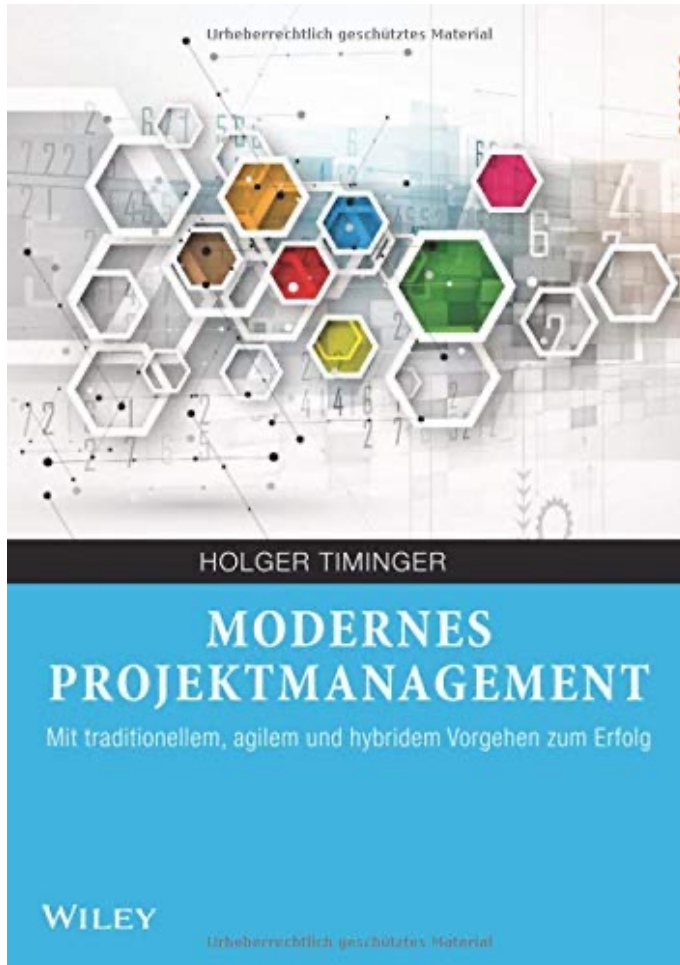

Timinger, Holger (2017).
Modernes Projektmanagement. Mit
traditionellen, agilem und hybridem Vorgehen
zum Erfolg, Wiley-VCH Verlag: Weinheim.

€ 34,-

Projektabschluss



Phasen des Projektabschlusses

- Abnahme des Projektgegenstandes
- Abschlussanalyse
- Abschluss Wissensmanagement
- Auflösung Projektteam und Infrastruktur
- Nachprojektphase

Abnahme Projektgegenstand

- Der Projektgegenstand muss zum Projektstart genau definiert sein
 - Was gehört genau zum Projektgegenstand und was muss am Ende genau übergeben werden?
- Die Abnahme muss in einem Protokoll (Abnahmeprotokoll) dokumentiert sein
- Inhalt des Abnahmeprotokolls:
 - Was wird genau übergeben (Projektgegenstand)?
 - Wie wurde es übergeben (gibt es irgendwelche Mängel)?
 - Welche Nacharbeiten sind notwendig?
 - hier muss auch dokumentiert werden was genau gemacht werden muss und wann dies fertig sein muss
 - Das Abnahmeprotokoll wird danach durch den Projektleiter und den Auftraggeber unterzeichnet

Alternativ – Projektabschlussbericht

Projektabschlussbericht		Auftraggeber:
Projektbeginn:	Projektende:	Projektleitung:
Projektziele und Aufgabenstellung: • Welches sind die im Projektauftrag vereinbarten Ziele und Aufgaben?		
Projektorganisation: • Welche Personen sind am Projekt beteiligt? Auftraggeber, Projektleiter, Projektmitarbeiter, externe Beteiligte		
Leistungen und Projektergebnisse: • Wurden die Projektziele (Sache, Termine, Kosten) erreicht? • Konzepte • Technische Umsetzung • Qualitätsmerkmale		
Ereignisse während der Durchführung: • Wie ist das Projekt verlaufen? • Darstellung von Schwierigkeiten sowie positiven Ereignissen • Kritische Probleme		
Nachkalkulation: • Tatsächlich entstandene Projektkosten im Vergleich zu den geplanten Projektkosten.		
Ort, Datum		
<i>Unterschriften</i>	<i>Auftraggeber</i>	<i>Projektleitung</i>

Abnahmetests

- Bei IT-Projekten sind entsprechende Abnahmetests notwendig, die im Rahmen von Protokollen dokumentiert werden sollten
- Diese Protokolle sollten die Einzeltests und deren Ergebnisse enthalten
- Zusätzlich wird hier auch definiert, ob noch gewisse Nacharbeiten oder Fehlerbehebungen notwendig sind
- Folgende Abnahmetestvarianten gibt es:
 - Produkttest: wird bei Softwareprodukten durchgeführt; Ziel ist es alle möglichen Situation durchzuspielen
 - Abschlusstest: wird bei Hardwareprodukten durchgeführt; Prototyp kommt hier als Regelprodukt zum Einsatz
 - Akzeptanztest: für Hardware- und Softwareprodukte, die für einen speziellen Kunden entwickelt wurden; findet unter kundenspezifischen Bedingungen statt
 - Pilottest: Gesamttest einer gesamten IT-Lösung unter Echtbedingungen

Abschlussanalyse

- Diese hilft bei der Erfolgsbewertung des Projekts
- Zusätzlich werden in diesem Rahmen Verbesserungsmöglichkeiten für andere Projekte identifiziert
- Hierfür werden die Projektdefinition, die Projektplanung und die Projektsteuerung analysiert
- Zur Abschlussanalyse gehören:
 - die Nachkalkulation des Projekts
 - eine Analyse der Projektziele
 - die Evaluierung des Projekts durch wichtige Stakeholder

Projektnachkalkulation

Nachkalkulation des Projekts

Arbeitspaket	geplant BAC [Euro]	genehmigter Änderungsantrag	geändert BAC [Euro]	AC [Euro]	Ab- weichung [Euro]	Begründung
1.3.2 Datenbank implementieren	20.000	CR100053: Zusätzliche Aufnahme einer weiteren Adress- zeile im Datenmodell	24.000	26.000	+2.000	Nachträgliche Änderung des Datenmodells war aufwändiger als geschätzt
1.3.3 Drucker- schnittstelle implementieren	10.000	-	-	10.000	-	-
1.3.4 Benutzer- oberfläche entwerfen	30.000	CR100054: Anforderung, dass Oberfläche auch auf mobilen Geräten an- wendbar ist hinzugefügt	45.000	40.000	-5.000	Zukauf einer Software Bibliothek führt zu ein- facherer Implementierung
1.3.5 Handbuch erstellen	10.000	-	-	13.000	+3.000	keine strukturierte Aufwandsschätzung
...						
Summe						
Zusammenfassende Beurteilung:						

Bewertung und Analyse der Projektziele

- Hier stellen sich folgende Fragen:
 - Wurden die Projektziele alle erreicht?
 - Traten nicht identifizierte Zielkonflikte auf?
 - Mussten (Teil)-Ziele zugunsten anderer (Teil)-Ziele zurückgestellt werden?
 - Welche Ursachen führten zu nicht erreichten Zielen?

Evaluierung des Projekts durch Stakeholder

- Im Rahmen eines Analyseworkshops mit den wichtigsten Stakeholdern kann die Einschätzung des Projekterfolgs gemacht werden
- Eventuell kann dies im Rahmen einer informellen Befragung, durch strukturierte Interviews oder Fragebögen gemacht werden

Abschluss des Wissensmanagements I

- Ziel ist es das Wissen und die Erfahrungen aus dem Projekt anderen Mitarbeitern oder ganzen Organisationseinheiten zur Verfügung zu stellen
- Alle Dokumente des Projekts müssen in diesem Rahmen zur Nachvollziehbarkeit archiviert werden:
 - Projektpläne und -verträge
 - Protokolle
 - Dokumentation des Projektgegenstands
 - Nachkalkulation
 - Evaluierung des Projekts

Abschluss des Wissensmanagements II

- Zur Wissenssicherung am Ende des Projekts können verwendet werden:
 - Wikis (Intranet)
 - Checklisten (sollten nach jedem Projekt weiterentwickelt werden)
 - Tabellen mit Erfahrungen aus der Aufwandsschätzung
 - Vorlagen für die Erstellung gewisser Dokumente (Projekthandbuch, Protokolle usw.)
 - Erfahrungsaustausch durch Berichte, Vorträge usw.
 - Aktualisierung des unternehmensspezifischen Vorgehensmodells

Auflösung des Projektteams und der Infrastruktur

- Meist ist nach Abnahme des Projektgegenstands die Luft im Projekt raus
- Mitarbeiter, die keine Arbeitspakete mehr haben werden abgezogen und für andere Projekte eingesetzt
- Hier ist das Können und der Einsatz des Projektleiters gefragt, um die restlichen Arbeiten erledigen zu lassen und das Projekt trotz alledem zu einem sauberen Abschluss zu bringen
- daher muss:
 - der Projektabschluss sorgfältig geplant sein
 - vor der Freigabe von Ressourcen geprüft werden, ob alle Aufgaben erledigt wurden
 - positives Feedback an die Projektmitarbeiter und deren Vorgesetzte weitergegeben werden
 - durch eine Projektabschlussbesprechung für ein klares Ende gesorgt werden
 - die Besprechung sollte im Projekt nicht zu spät angesetzt werden, da alle Mitarbeiter aus dem Projekt dabei sein sollten

Projektabschlussbesprechung

- Der Zweck dieser Besprechung ist es:
 - eine Analyse und Bewertung des Projekts durchzuführen
 - das Wissen und die Erfahrungen sicherzustellen
 - den restlichen Projektplan bis Projektende vorzustellen
 - die restlichen, offenen Aufgaben zu verteilen
 - die getane Arbeit wertzuschätzen im Rahmen einer Feier

Nachprojektphase

- Diese Phase gehört nicht mehr zum Projekt und ist die Nutzungs-oder Anwendungsphase des Projektgegenstands
- In dieser Phase können gewisse Verbesserungen ersichtlich werden
 - diese dürfen jedoch nicht mehr Gegenstand des Projekts sein, ansonsten besteht die Gefahr, dass das Projekt nie zu einem sauberen Abschluss kommt
- In dieser Phase werden teilweise noch Wartungsverträge oder
- Supportunterstützungen vereinbart

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

„Es ist kein Drama,
wenn das Projekt nicht nach Plan läuft.

Es ist ein Drama,
wenn der Projektmanager
nichts davon weiß...“

Peter Hobbs
