

2 Projektvorbereitung

2.1 Prozess: Vorbereiten eines Projekts | Starting Up a Project (SU)

Der Zweck des Prozesses „Vorbereiten eines Projekts“ dient dazu, mit geringstmöglichem Mittelaufwand herauszufinden, ob es sich um ein durchführbares und lohnendes Projekt handelt. Ferner geht es darum, die Projektinitiierung vorzubereiten und erste Verantwortlichkeiten für die Durchführung des Projekts zu definieren.


Bereits vor Beginn des Projekts startet dieser Prozess. Oft wird in der Praxis dieser Prozess einer Phase gleichgestellt, in PRINCE2 jedoch nur als Prozess. Der Auslöser, also der Input für den Prozess, ist das Projektmandat. Dieses ist ein Managementprodukt, welches mit notwendigen Informationen hinsichtlich erster Projektinformationen ausgestattet ist.

Durch den Prozess „Vorbereiten eines Projekts“ soll sichergestellt werden:

- 1. ... dass alle für die Initiierung notwendigen Rollen und Verantwortlichkeiten geklärt sind¹⁾**

Wie in folgendem Schaubild zu sehen, ist die Klärung von Rollen und Verantwortlichkeiten einer der ersten Schritte. Durch den Schritt „Auftraggeber und Projektmanager ernennen“ soll sichergestellt werden, dass bereits vor Projektbeginn die richtigen und wichtigsten Personen zur Steuerung und zum Management eines Projekts vorhanden und benannt sind. Die genauen Beschreibungen der Rollen des Projektmanagers und Auftraggebers werden dann im Thema „Organisation“ in Abschnitt 2.3 beschrieben. In diesem Prozessschritt wird im Übrigen auch das Projekt-tagebuch erstellt.

Prozess Vorbereiten eines Projekts (SU)

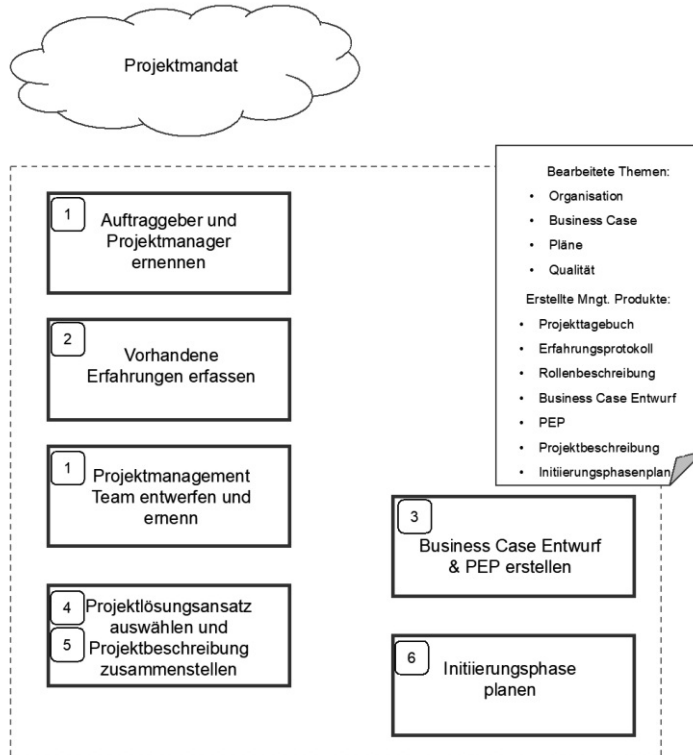

7 Antrag auf Projekt-Initiierung beim Lenkungsausschuss

Das Projekttagebuch wird in der PRINCE2-Terminologie als ein sehr informelles Managementprodukt beschrieben. Es dient dem Projektmanager als – salopp gesagt – Notizblock; als Notizblock für sämtliche Anliegen, die innerhalb eines Projekts anfallen. In der Praxis spricht man hierbei auch oft von einer Todo-Liste des Projektmanagers. Zu beachten ist hierbei, dass ausschließlich der Projektmanager selbst die Kompetenz besitzen sollte, dieses Managementprodukt zu pflegen und zu lesen.

Im dritten Prozessschritt des Schaubilds geht es darum, eine erste Indikation der Projektmanagementteams zu entwerfen und zu ernennen. Erste Indikation deswegen, da natürlich innerhalb der Projektinitiierung und den darauffolgenden Projektphasen eine Änderung des Projektteams möglich, sogar üblich ist. Kaum ein Projekt, vor allem umfangreiche, komplexe und langlaufende, kommen ohne Änderungen innerhalb Ihrer Projektorganisation aus.

Die hier beschriebenen Aktivitäten von PRINCE2, spiegeln vor allem das Grundprinzip der **„definierten Rollen und Verantwortlichkeiten“** wider. Als Thema wird hier das Thema **„Organisation“** behandelt, welches sich vor allem mit den Rollen und Projektorganisationsstrukturen auseinandersetzt.

2. ... dass so viele Erfahrungen wie möglich in Form eines Erfahrungsprotokolls niedergeschrieben sind²⁾

Im zweiten Prozessschritt **„Vorhandene Erfahrungen erfassen“** sollen das erste Mal, schon bereits vor Beginn des Projektvorhabens, Erfahrungen positiver und negativer Natur besprochen und niedergeschrieben werden. Ziel es ist, anhand des Managementprodukts „Erfahrungsprotokoll“, eventuelle Do's und Dont's aus Vorgängerprojekten zu erfassen, um so die aktuell anstehende Projektinitiierung, aber auch die kommende Projektdurchführung so effizient wie möglich zu gestalten.

Das Erfahrungsprotokoll ist eine sich im Laufe des Projekts dauerhaft anpassende Liste aus gemachten Erfahrungen, zum Beispiel aus Vorgänger-Projekten. Dauerhaft

bedeutet hierbei, dass dem Grundprinzip „Lernen aus Erfahrung“ dahingehend nachgekommen werden muss, als dass nicht nur einmal zu Beginn und einmal zum Ende eines Projekts über Erfahrungen gesprochen werden soll, sondern im Grunde genommen am Ende jeder Phase die Erfahrungen der letzten Phase notiert werden sollen. Oft wird dies auch als „Lessons Learned“ bezeichnet.

3. ... dass die Initiierung wirtschaftlich in Form des Business-Case-Entwurfs gerechtfertigt ist³⁾

Wenn wir uns an das Grundprinzip der fortlaufenden geschäftlichen Rechtfertigung zurückerinnern, wird klar, dass es im Rahmen eines Projekts bzw. hier im Rahmen der Projektvorbereitung einen Zeitpunkt geben muss, an dem man das erste Mal die geschäftliche Rechtfertigung aufzeigt. Dies geschieht im Prozessschritt 4 des Schaubildes. Hier erstellt man den so genannten „Business-Case-Entwurf“.

Der Business-Case-Entwurf enthält, wie der Name schon vermuten lässt, nur erste Bestandteile des umfangreichen „Business Case“. Grund hierfür ist, dass man innerhalb der Projektvorbereitung ja mit einem sehr kosten- und zeitgünstigen Ansatz herausgefunden werden soll, ob sich das Projekt lohnt. Die Zeit mit einer umfangreichen Business-Case-Erstellung zu verbringen wäre daher nicht zielführend. Die Bestandteile der abgespeckten Variante – dem Entwurf – sind in erster Linie Gründe und Optionen. Bei der Vorbereitung auf ein Projekt konzentriert man sich oft darauf, **WAS** getan wird. Das **WARUM** wird hierbei oft außen vor gelassen. Hierbei soll die PRINCE2-Terminologie, mit Hilfe der Gründe, innerhalb des Business-Case-Entwurfes Abhilfe schaffen. Ferner sollen die Gründe eine Erläuterung bieten, wie das Projekt die Strategien und Ziele des Unternehmens unterstützt. Ein Grund, die Olympiade innerhalb von London stattfinden zu lassen, könnte aktuell die stagnierende wirtschaftliche Situation Londons gewesen sein. Wichtig bei der Definition von Gründen ist, dass diese vergangenheits- bzw. gegenwartsbezogen sind.

Die Optionen innerhalb des Business-Case-Entwurfs beinhalten eine Analyse und begründete Empfehlung für eine der vom Projekt gewählten Optionen. Die Optionen, der wirtschaftlichen Situation von London entgegenzuwirken könnten a) die Olympiade und b) die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft sein. Bei den Optionen sollte auch immer die Null-Option mit dargestellt werden: also was würde passieren, wenn nichts getan wird.

Die hierfür benötigten Informationen erlangt der Projektmanager, welcher im Übrigen gemeinsam mit dem Auftraggeber den Business-Case-Entwurf erstellt, aus dem Projektmandat und dem bereits angefertigten Erfahrungsprotokoll.

4. ... dass ein erster Entwurf der Produktbeschreibung des Projektendprodukts (PEP) vorhanden ist⁴⁾

Bereits vor Beginn eines jeden Projekts muss man sich über das fertige Endprodukt Gedanken machen. Umso konkreter, desto besser kann man planen, desto mehr wird man im Laufe des Projekts aufgrund sich verändernder Anforderungen der Kundenseite abändern müssen. Eine Musterlösung, wie granular man planen sollte, gibt es nicht, auch nicht in der PRINCE2-Terminologie.

In PRINCE2 wird die Beschreibung des am Ende vom Projekt zu liefernden Produkts als Produktbeschreibung des Projektendprodukts bezeichnet. Abgekürzt als PEP, beschreibt diese sämtliche Anforderungen des Kunden an das zu liefernde Produkt. Klar ist hierbei, dass dies ein lebendiges Managementprodukt ist. Das bedeutet, dass im Laufe des Projekts sich ergebende Änderung der Anforderungen an das Endprodukt ebenfalls in der PEP niedergeschrieben werden soll.

Die im Vorbereiten eines Projekts erstellte PEP stellt somit zwar eine vollkommene PEP, jedoch noch lange keine finale bzw. fertige PEP dar. Vielmehr ist es deren erste Indikation.

5. ... dass die Alternative, wie das Projekt durchgeführt werden könnte, bewertet und ausgewählt wurde⁵⁾

Wie wird das Projekt durchgeführt? Schaffen wir es, die Olympiade selbst auf die Beine zu stellen oder benötigen wir dafür einen Dienstleister, an den wir die Organisation outsourcen? Die Antwort auf diese Art von Fragen findet sich im Projektlösungsansatz.

Der Projektlösungsansatz beschäftigt sich klassischerweise mit der Make-or-Buy-Entscheidung. Wird das Projektendprodukt von einem selbst im Rahmen des Projekts erstellt oder kümmert sich ein externer Dienstleister um die Erstellung?

Hat man diese und weitere Informationen bzw. weitere Managementprodukte zusammengetragen, erstellt man aus dieser Sammlung an wichtigen Managementprodukten aus dem Prozess „Vorbereiten eines Projekts (SU)“ ein Art Managementprodukt Management Summary, genannt Projektbeschreibung. Mehr hierzu in [Abschnitt 2.2](#).

6. ... dass die für die Initiierungsphase notwendigen Arbeiten in Form eines Initiierungsphasenplans dokumentiert worden sind⁶⁾

Wie in den vorhergegangenen Zeilen bereits ersichtlich wurde, ist innerhalb der PRINCE2-Terminologie, eine Einteilung in Phasen außerordentlich wichtig. Um jeder Phase die Chance zu geben, von Anfang bis Ende hoch professionell und annähernd fehlerfrei gemanagt zu werden, ist eine gute vorgegangene Planung von Nöten. Das erste Mal kommt diese Planung im Prozess „Vorbereiten eines Projekts“ zum Tragen. Nämlich dann, wenn die Initiierungsphase des anstehenden Projekts geplant werden muss.

Am Ende der Projektvorbereitung muss ein fertiger Initiierungsphasenplan erstellt worden sein. Dieser Plan dient dazu, erste Zeit- und Kostenbeschränkungen für die

Initiierungsphase festzulegen und im Rahmen dessen eventuell erste Produktbeschreibungen für die Erstellung innerhalb der Initiierungsphase zu entwickeln.

Der Prozess „Vorbereiten eines Projekts (SU)“ schließt mit dem so genannten Antrag auf Projektinitiierung⁷⁾ ab. Dieser Antrag ist innerhalb von PRINCE2 nicht sehr ausführlich beschrieben.

In der Praxis ist dieser Antrag oft als Projektantrag benannt, der mit einer großen Anzahl an bereits klaren Projektrahmenbedingungen befüllt ist. Diese sind neben Zeit, Kosten und Qualität auch oft eine erste Indikation benötigter Ressourcen.

2.2 Die Projektbeschreibung


Wie in Abschnitt 2.1 erwähnt, stellt die Projektbeschreibung eine erste grobe Management Summary dar. Sie beinhaltet die wichtigsten von dem Prozess „Vorbereiten eines Projekts (SU)“ zu liefernden Managementprodukte. Diese sind:

- das Organigramm ¹
- die Produktbeschreibung des Projektendprodukts ²
- der Projektlösungsansatz ³
- der Business-Case-Entwurf ⁴
- sowie etwaige Verweise auf andere Managementprodukte ⁵

Die Projektbeschreibung wird benötigt, damit der Lenkungsausschuss, also das Komitee, welches letztendlich über die Projektparameter entscheidet, alle notwendigen Informationen zur Genehmigung der Projektinitiierung erhält.

Innerhalb des Prozesses „Initiieren eines Projekts (IP)“ werden die Inhalte der Projektbeschreibung in ergänzter und optimierter Form in die Projektleitdokumentation übernommen. Die Projektbeschreibung wird daraufhin nicht weiter fortgeführt. Mehr hierzu in [Abschnitt 3.3](#).

Die Projektbeschreibung

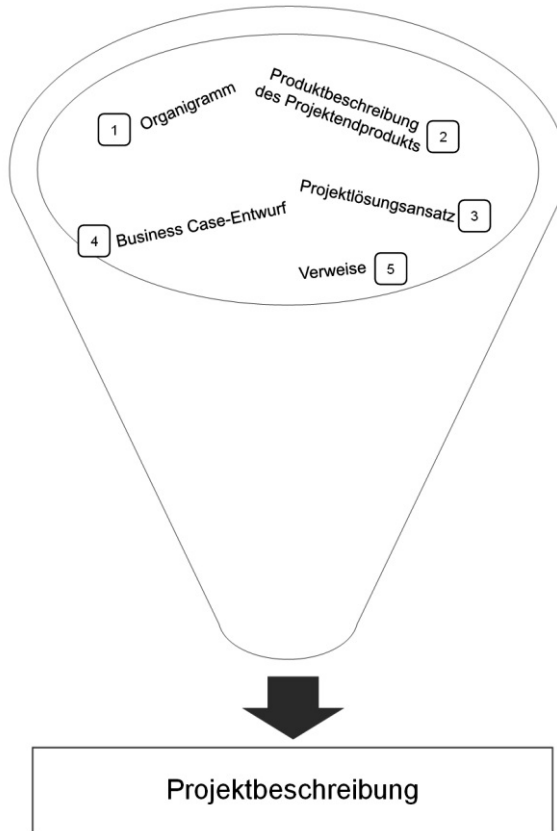

2.3 Thema Organisation

Das erste Thema innerhalb der PRINCE2-Terminologie, mit dem wir uns näher beschäftigen, ist das Thema „Organisation“. Das Wort „Organisation“ stellt für viele Leute erstmal ein Stolperstein dar. Geht es hierbei um die grundlegende Organisation innerhalb eines Unternehmens oder innerhalb der Linienorganisation? Bei „Organisation“ geht es vielmehr um das Thema „Projektorganisation“.

Zweck des Themas „Organisation“ ist die Evaluierung und Festlegung der Organisationsstruktur, die Zuordnung der Rollen und Verantwortlichkeiten und deren Kompetenzen. Wie man hier schon sehr schön herauslesen kann, ist der Unterpunkt ‚Rollen und Verantwortlichkeiten‘ eine wichtige Kernfragestellung von PRINCE2, weshalb auch ein eigenes Grundprinzip dieser Fragestellung gewidmet wurde. Und genau diesem Grundprinzip „Definierte Rollen und Verantwortlichkeiten“ kommen wir in dem Thema „Organisation“ nach.

Innerhalb von PRINCE2 gibt es eine Vielzahl an Rollen, welche wir im folgenden Abschnitt näher beschreiben werden. Hierbei ist das Wort „Rolle“ keinesfalls personenbezogen. So sollte die Rolle des Projektmanagers zum Beispiel nur von einer Person besetzt sein, wohingegen die Rolle des Teammanagers an eine Vielzahl an Personen übergeben werden kann.

2.3.1 Die drei Projektinteressen

Die PRINCE2-Terminologie geht davon aus, dass es auf einem Projekt immer drei grundsätzliche Interessensgruppen gibt. Diese gelten als die wichtigsten Stakeholder eines Projekts. Sowohl die Bedürfnisse als auch die Anforderungen aller drei Interessensgruppen müssen erfüllt werden, damit ein Projekt erfolgreich ist.

Diese drei Projektinteressen splitten sich in das Unternehmen-, die Benutzer- und die Lieferantenseite auf. Gleichzeitig stellen diese drei Interessengruppen auch den Lenkungsausschuss dar.

Nicht selten kommt die Konstellation zustande, dass die Unternehmensseite, in der Logik von PRINCE2, jene Personen abbilden, die als Geldgeber fungieren, mit der Benutzerseite, also jene Personen, welche das vom Projekt gelieferte Endprodukt in ihrer täglichen Arbeit benutzen, eine Person abbilden.

PRINCE2 spricht in dieser Logik daher immer von einer Kunden-Lieferantenbeziehung. Im Übrigen auch dann, wenn das Unternehmen für sich selbst ein Projekt auf die Beine stellt. Hier nimmt dann die Fachabteilung, welche für die Lieferung des Projekt die Verantwortung hat, die Lieferantenseite ein.

Am verständlichsten wird es anhand eines **Beispiels**:

Hartmut, Abteilungsleiter der Finanz-Abteilung einer Bank, möchte für seine Abteilung ein neues Tool zur Vereinfachung der Überweisungen einführen.

Hartmut stellt, da er mit dem Tool arbeiten wird, die Benutzerseite dar.

Um für das Projekt zu werben und um für das Projekt das notwendige Budget zu bekommen, trifft er sich mit seinem Bereichsleiter Michael. Michael verfügt über sehr viel Budget und ist bekannt dafür, es ohne lange zu überlegen auszugeben. Hartmut überredet Michael schließlich, ihm für sein Vorhaben 1,5 Mio. Euro zur Verfügung zu stellen.

Michael stellt somit die Rolle des Unternehmensvertreters, also des Auftraggebers dar, da er die Budgetverantwortung trägt.


Nun treffen sich Michael (Auftraggeber) und Hartmut (Benutzer) mit den potenziellen externen Toolherstellern, um sich für ein Tool und damit für einen Partner zur Umsetzung des Projekts zu entscheiden.

Markus vertritt seinerseits die marktführende und unabhängige Finance-Unternehmensberatung Litestern (*Fantasiename*). Er bekommt den Zuschlag für das Projekt und nimmt somit die Rolle des Lieferantenvertreters ein.

Wie im folgenden Schaubild zu sehen, ergibt sich durch die Konstellation von Hartmut (Benutzer), Michael (Auftraggeber) und Markus (Lieferant) die in PRINCE2 benannte Kunden-Lieferantenbeziehung.

Nimmt man nun in dem Beispiel an, dass Hartmut als Abteilungsleiter eigene Budgetverantwortung trägt, könnte sich die Rolle von Michael als Auftraggeber als obsolet erweisen. Hartmut übernimmt damit die Rolle des Benutzers als auch das Auftraggeber (Unternehmensvertreters).

Die drei Projektinteressen

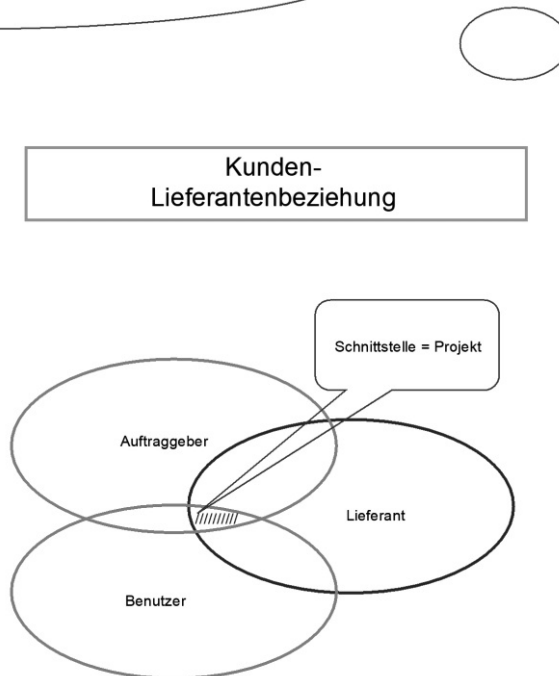

2.3.2 Das Projektmanagementteam

Das Projektmanagementteam bildet sozusagen die Projektorganisation. Hier sind alle Rollen enthalten, die laut der PRINCE2-Terminologie in einem vollumfänglichen Projekt dazugehören. Hierbei ist natürlich das Grundprinzip der „Anpassung an die Projektumgebung“ nicht zu vergessen, da die Projektstruktur der Olympiade sicherlich der PRINCE2-Musterorganisation von der Auslastung der vorgegebenen Rollen näherkommt, als es ein kleines Baumhausprojekt der Tochter tut.

Im Folgenden wird jede Rolle der PRINCE2-Terminologie auf ihre Verantwortung, ihrer Notwendigkeit und ihrer Voraussetzung an die Person dahinter, beschrieben.

Der Lenkungsausschuss¹⁾

Der Lenkungsausschuss stellt das Entscheidungskomitee innerhalb der Projektorganisation dar. Er übernimmt das Lenken eines Projekts im Sinne des „accountable“. Er hat im Rahmen der Vorgaben des Unternehmens- oder Programmmanagements die Gesamtverantwortung und Gesamtvollmacht für das Projekt. Darüber hinaus ist er für die Kommunikation zwischen dem Projektmanagementteam und den Stakeholdern, insbesondere dem Projekt- und Programmmanagement, zuständig. Je nach Scope des Projekts können die Mitglieder des Lenkungsausschusses zusätzlich einige Projektsicherungsaufgaben an andere Einzelpersonen delegieren. Ferner ist der Lenkungsausschuss befugt, die Kompetenz über Änderungen an den Änderungsausschuss zu delegieren.

Mitglieder des Lenkungsausschusses sind die bereits in Abschnitt 2.3.1. beschriebenen Rollen: „Benutzer“- , „Lieferant“- und „Unternehmensvertreter“ bzw. Auftraggeber. Mehr hierzu in den folgenden Beschreibungen.

Auftraggeber²⁾

Der Auftraggeber stellt den Vorsitz innerhalb des Lenkungsausschusses dar. Er trägt die Gesamtverantwortung für das Projekt und hat dafür Sorge zu tragen, dass die vorgegebenen Ziele erreicht und der geplante Nutzen erzielt werden. Er hat sicherzustellen, dass das Projekt möglichst direkt auf die angestrebten Ziele zusteuert, dass die Vollmachten eindeutig festgelegt sind und dass sowohl die anstehenden Arbeiten als auch die Risiken aktiv gemanagt werden. Umgangssprachlich ist der Auftraggeber auch als Unternehmensvertreter, Executive oder Projektsponsor bekannt.

Hier findet das Highlander-Prinzip Anwendung: *Es kann nur einen geben!* Ein zweiter Auftraggeber würde innerhalb eines Projekts durch die gleiche dahinter sich verstehende Kompetenz für Unruhe und gegebenenfalls sogar für Stillstand sorgen.

Benutzervertreter³⁾

Der Benutzervertreter lässt – im Rahmen seiner Rolle im Lenkungsausschuss – seine Anforderungen verlauten. Er vertritt den Teil der Stakeholder, der mit den vom Projekt zu liefernden Produkten arbeitet; sie namensgemäß benutzt. Darüber hinaus stellt er die Person dar, welche ihre Anforderungen an das Projektendprodukt definiert und diese, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Auftraggebers, abstimmt. Da ein Projektendprodukt oftmals von mehreren Personen oder Personengruppen benutzt werden kann, sind mehrere Benutzervertreter durchaus möglich, meistens sogar üblich.

Lieferantenvertreter⁴⁾

Der Lieferantenvertreter bildet den letzten Teil des Lenkungsausschusses. Er vertritt die Interessen der Parteien des Projekts, die für den Entwurf, die Entwicklung und die Realisierung des Produkts des Projekts verantwortlich sind. Er ist für die Qualität der zuliefernden Produkte verantwortlich. Je nach Art des Projekts kann der Liefere-

rantenvertreter entweder als Externer des Unternehmens oder als interner Lieferverantwortlicher innerhalb des Lenkungsausschusses agieren. Auch der Lieferantenvertreter, insbesondere bei Großprojekten wie der Olympiade, wird auf der Lieferseite durch eine Vielzahl von Vertretern der internen und externen Zuliefererseite vertreten sein.

Projektsicherung⁵⁾

Die Projektsicherung stellt den verlängerten Arm des Lenkungsausschusses dar. Sie ist für die Wahrnehmung der Interessen des Lenkungsausschusses innerhalb der Projektorganisation da. Die Aufgabe kann innerhalb kleinerer Projekte vom Lenkungsausschuss selbst übernommen werden, wird in der Regel aber als Rolle weiter an unabhängige Personen delegiert. Die Unabhängigkeit bezieht sich in diesem Zusammenhang auf das Projektteam, da dieses von der Projektsicherung auditert wird. Eine sich ausschließende Rollenkombination ist zum Beispiel Projektsicherung und Projektmanager. In der Praxis trifft diese Rolle sehr passend auf Projektcontroller zu. Aber auch eine Projektrevision kann durchaus die Rolle der Projektsicherung einnehmen.

Änderungsausschuss⁶⁾

Innerhalb jedes Projekts kommen während der Projektlaufzeit eine Vielzahl an Änderungen auf das Projektteam und das vom Projektteam zu liefernde Projekterzeugnis zu: Änderungen, die sich durch Risiken ergeben, Änderungen, die sich durch neue Wünsche der Benutzerseite ergeben. Innerhalb von PRINCE2 gibt es für eine richtige Steuerung dieser Änderungen das namensgleiche Thema „Änderungen“. Innerhalb des Themas „Organisation“ gibt es darüber hinaus jedoch noch eine Rolle, die sich innerhalb der Projektorganisation um das Thema und die anfallenden Änderungen bemüht: den Änderungsausschuss. Dieser besitzt die Kompetenz, über Änderungen zu entscheiden. Der Änderungsausschuss ist nicht zwingend – wie der Name vermuten lässt – ein Komitee, sondern besteht vielmehr aus einzelnen Perso-

nen innerhalb des Projektteams, die in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Arten von Änderungskompetenz seitens des Lenkungsausschusses delegiert bekommen haben. Der englische Begriff aus der Originalliteratur unterstreicht diese Definition des Änderungsausschusses sehr gut: Im Englischen als „Change Authority“ bezeichnet, beschreibt dieser Begriff übersetzt eine Autorität, eine Kompetenz, welche über Änderungen entscheidet, kein Komitee, wie es der deutsche Begriff auf Anhieb vermuten lässt.

Der Änderungsausschuss muss innerhalb eines Projekts über die Änderungsanforderungen entscheiden. Daher sind eine hohe Verantwortung und eine hohe Identifizierung der Ziele des Benutzervertreters notwendig. In kleinen Projekten übernimmt der Lenkungsausschuss selbst die Rolle des Änderungsausschusses. Auch ist es nicht unüblich, dass diese Rolle vom Projektmanager übernommen wird.

Projektmanager⁷⁾

Das Abwickeln der täglichen koordinativen Tätigkeiten gehört zu den Hauptaufgaben des Projektmanagers. Er ist innerhalb der einzelnen Managementphasen dafür zuständig, dass das Projekt die für die Phase vereinbarten Produkte innerhalb der vereinbarten Zeit, der Kosten und der Qualität liefert und dabei den Umfang, den Nutzen und die Risiken im tolerierten Bereich hält. Kurz gesagt: Er muss innerhalb der Managementphasen die vereinbarten Toleranzen einhalten. Auch hier kommt wieder das Highlander-Prinzip zur Anwendung: *Es kann nur einen geben!*: **ein** Projektmanager.

Oft wird in der Praxis ein sehr spezialisierter Projektmanager eingesetzt. Ein Projektmanager, der über umfangreiche Fachkenntnisse verfügt. Das hat zur Folge, dass jene Projektmanager mit ihren Teilprojektleitern in tiefe fachliche Diskussionen tauchen; Diskussionen, die meistens während großen Teilprojektleiter-Meetings oder Jour Fixen stattfinden. Also genau dann, wenn hochbezahlte Projektmitarbeiter zusammensitzen und Zeit kostbar ist. Das sollte nicht passieren. Aber dass Pro-

jektmanager in so genanntes Mikromanagement, also Management von extrem kleinen und eigentlich außerhalb ihrer Kompetenz liegenden Themen, abtauchen, ist leider gang und gäbe. Dass ein Projektmanager ein intensives fachliches Know-how besitzen muss, ist sowohl nach der Aussage der PRINCE2-Terminologie als auch nach unserer praktischen Erfahrung nicht notwendig; sogar radikal falsch! Hierbei liegt die Betonung auf der Intensität des fachlichen Know-hows. Im Laufe eines Projekts findet auch ein fachlich komplett unerfahrenerer Projektmanager Zugang zu den fachlichen Themen, wird sie aber in aller Regel nicht allzu tiefgehend bestimmen.

Nun stellt sich sicher die Frage, welche Kompetenz ein Projektmanager mitbringen muss und wie ein Projektmanager sein minimal fachliches Know-how ausgleichen soll. Oder muss er das überhaupt?

Die Kompetenzen eines Projektmanagers sollten unter anderem sein:

- **Planung:** Eine wichtige Kernkompetenz eines Projektmanagers sind die Planung und die Fähigkeit, „um die Ecke zu denken“. Es geht darum, aufeinander aufbauende Fragestellungen im Anfangszustand zu identifizieren und auf Basis von Annahmen eine höchst zutreffende Planung zu bezwecken.
- **Zeitmanagement:** Die meisten Projekte erhalten wegen zwei Faktoren ein negatives Image: Geld- und Zeitüberschreitung. Das Zeitmanagement an sich ist in der Geschichte der Menschheit eines der anspruchsvollsten Themen. Das liegt daran, dass Zeit nicht beeinflussbar ist. Was hingegen beeinflussbar ist, ist jene Arbeit, die man innerhalb eines Tages bzw. Arbeitstages verrichten kann. Das ist der Gedanke von Zeitmanagement: das effiziente Management von Workload innerhalb einer vorgegebenen Zeit. Die Zeit an sich bleibt dabei vollkommen unberührt.
- **Mitarbeitermanagement:** Ein Projektmanager hat in seiner Rolle als Führungskraft eines Projekts in der Regel eine Vielzahl an Mitarbeitern zu managen und

zu führen: Managen im Sinne der Ressourcenplanung. Zugegeben ist das ein Teilbereich der oben beschriebenen Planung, jedoch geht das operative Management der Mitarbeiter über die Planung, welche ja nur punktuell zukunftsorientiert durchgeführt wird, hinaus. Beim Management der Mitarbeiter geht es um Themen wie Projekt-Onboarding, also die Neuaufnahme und Einarbeitung von neuen Mitarbeitern, um Themen wie Staffing, also die Vergabe von Personentagen von der Linie hinaus an Teilprojektleiter bzw. Teammanager etc.

- **Problemlösung:** Eine der wohl wichtigsten Kompetenzen von Projektmanagern ist die Lösungsorientierung. Oft laufen einem Projektmanager oder Mitarbeiter über den Weg, die den ganzen Tag nur über Probleme sprechen: „das funktioniert nicht“, „das läuft schief“, „die Person möchte nicht richtig mitarbeiten“ etc.

Ein Projekt ist mit Problemen überhäuft. Jeder innerhalb des Projekts steht vor neuen Herausforderungen. Unternehmen führen ein Projekt in der Regel immer nur einmal durch, daher ist alles neu. Diese Faktoren stellen den Projektmanager schon vor genug Hürden. Sich hierbei intensiv über Probleme zu unterhalten ist schlichtweg falsch. Hierfür besteht nicht die Zeit. Wenn etwas schlecht gelaufen ist, kann man es nicht mit einer Vergangenheitsbewältigung beheben. Vielmehr geht es darum, sich mit seinen fachlichen Ansprechpartnern Gedanken über eine Lösung der Probleme zu machen.

- **Kommunikation:** Einer der Schlüsselkompetenzen ist die Kommunikation. Es ist essentiell, dass ein Projektmanager innerhalb des Projekts in ständiger Kommunikation mit seinen Projektmitarbeitern und den Stakeholdern steht. Hierbei ist zu beachten, dass diese umgekehrt auch in kontinuierlicher Kommunikation mit ihm stehen müssen. In der sich schnell ändernden Projektwelt ist Kommunikation essentiell, um das Projekt „nicht aus der Hand zu geben“, also das Projekt erfolglos abzuschließen.
- **Verhandlungsführung:** Der Projektmanager bildet die Schnittstelle zwischen den Stakeholdern und der Projektorganisation. Das Interessante ist hierbei, dass

beide Hierarchiestufen mit ihm in ständiger Verhandlung stehen. Die Projektmitarbeiter wollen mehr Geld und mehr Zeit und die Stakeholder wollen bessere Qualität, schneller und mit weniger Geld. Der Projektmanager muss hier mit einem großen Verhandlungsgeschick glänzen, um am Ende alle Parteien und ihre Interessen im Sinne des Projekts in Einklang gebracht zu haben.

- **Konfliktlösung:** Sowohl in Verhandlungen als auch während der normalen Mitarbeiterführung sind Konflikte im Grunde genommen vorprogrammiert. Ein Projektmanager muss hier durch seine empathische Art, Konflikte auf verschiedenen Ebenen im Sinne des Projekts beheben können.

Projektunterstützung⁸⁾

Die Projektunterstützung übernimmt den Großteil der für das Projekt anfallenden administrativen Aufgaben. Ferner liegt die Verantwortung für das Konfigurationsmanagement ebenfalls im Bereich der Projektunterstützung. Auf das Konfigurationsmanagement kommen wir in Abschnitt 4.3. Wenn diese Aufgaben nicht an eine Person oder Gruppe delegiert werden, übernimmt sie der Projektmanager. Umgangssprachlich setzt man die Projektunterstützung dem PMO, dem Project Management Office gleich.

In der Praxis stellt die Projektunterstützung die rechte Hand des Projektmanagers dar. Ähnlich eines Vorstandsassistenten übernimmt die Projektunterstützung alle administrativen und organisatorischen Aufgaben eines Projektmanagers. Diese sind Organisation von Meetings, Raumbuchungen, Einforderung von Statusberichten, Budgettracking und vieles mehr.

In großen Unternehmen werden diese Tätigkeit nicht selten von einer eigenen Abteilung, ebenfalls PMO genannt, übernommen. Diese Abteilungen schließen sich an sämtliche in einem Unternehmen auftretende Projekte und übernehmen für diese den so genannten Administrativen Overhead. Das hat den Vorteil, dass Mitarbeiter keine Einarbeitung in die Tätigkeitsfelder eines PMO's bzw. der Projektunterstüt-


zung benötigen, sondern immer echte Profis am Werk sind. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass das Projekt hierdurch sehr wenig individualisiert wird, da eine starke Orientierung an den Projektprozessvorgaben des Unternehmens vorherrscht.

Teammanager⁹⁾

Die fachlich anspruchsvollste Rolle innerhalb des Projektmanagementteams besitzen die Teammanager. Sie dienen als Vertreter der einzelnen Spezialistenteams und stellen ferner deren Schnittstelle zum Projektmanager dar. Die Teammanager berichten in einem vorgegebenen Zeitraum an den Projektmanager, stellen ihm aber auch im Rahmen des Projekts die Planungsunterstützung. In vielen Projekten sind Teammanager, auf Grund der Größe des Projekts und der damit einhergehenden Größe der Teilprojekte, oft als eigenständige Projektmanager zu sehen, nur auf einer tieferen Ebene.

Sollte das Projekt mit agilen Methoden wie SCRUM, Kanban oder Extreme Programming arbeiten, finden die jeweiligen Methoden meist im Rahmen der Arbeit der Teammanager mit ihren Teammitgliedern Anwendung. PRINCE2 bietet an dieser Stelle auch die Möglichkeit, PRINCE2 erfolgreich mit anderen (agilen) Methoden zu kombinieren. Auf die Arbeit des Teammanagers wird innerhalb der PRINCE2-Terminologie aufgrund hoch fachlicher Ausprägungen vergleichsweise wenig eingegangen. Hinsichtlich der Management-Eigenschaften wird sich innerhalb der Methodik eng an den Anforderungen des Projektmanagers orientiert, mit dem Hintergedanken, dass der Teammanager einen fachlichen Hintergrund mitbringen muss.

Das Projektmanagementteam

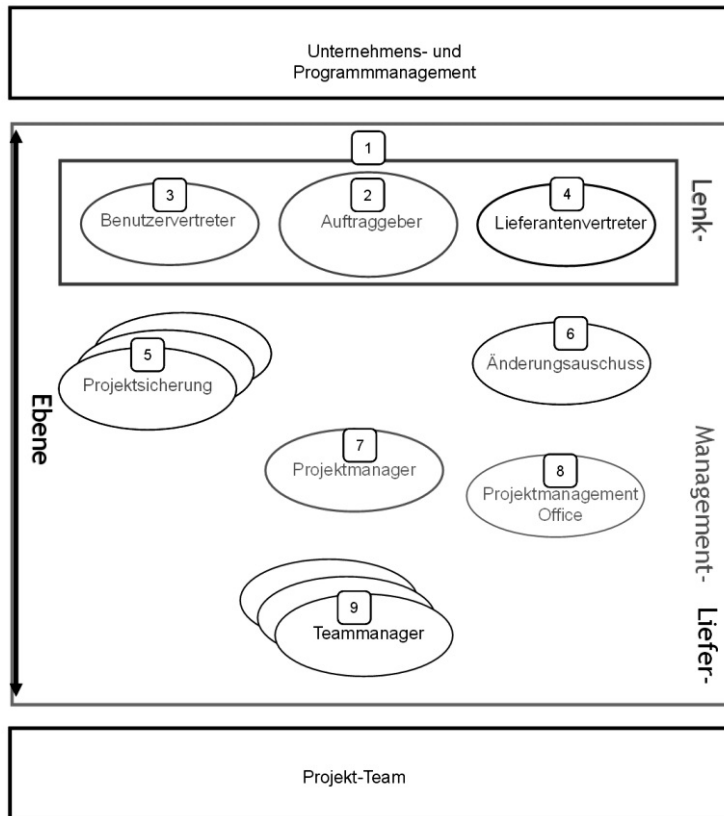

2.4 Thema Business Case

Zweck des Themas „Business Case“ ist die Einrichtung von geeigneten Mechanismen, um zu beurteilen, ob ein Projekt wünschenswert, lohnend und realisierbar ist und weiter fortgeführt wird. Auf dieser Grundlage soll über die (weitere) Projektinvestition entschieden werden können.

Das Thema gibt dem gleichnamigen Managementprodukt einen Rahmen, innerhalb dessen das Managementprodukt entwickelt und gepflegt wird. Durch die Anwendung wird darüber hinaus das Grundprinzip der fortlaufenden geschäftlichen Rechtfertigung bezweckt bzw. sichergestellt.

Innerhalb vieler Projekte stellt genau diese geschäftliche Rechtfertigung ein großes Problem dar. Zu allererst muss erst einmal der Nutzen aufgezeigt werden. Das ist zu Beginn gar nicht so einfach. Das liegt vor allem daran, dass der Nutzen meist viel komplexer zu ermitteln ist, als es sich in den meisten Fällen anfühlt. Hat man sich jedoch erstmal auf einen Nutzen für das Unternehmen geeinigt, ist eine fortlaufende geschäftliche Rechtfertigung durchaus machbar.

In der Praxis fällt auf, dass Projekte oft den so genannten „Point of no Return“ sehr schnell erreichen. Zumindest stellen Projektmanager und weitere Projektmitarbeiter in der Praxis oft diese Behauptung auf. Der *Point of no Return* ist allerdings nur sehr selten erreicht: die Projektmanager wollen das Projekt hierbei einfach künstlich am Leben erhalten. Grund sind hierbei persönliche Faktoren, wie zum Beispiel die Angst, einen schlechten Ruf innerhalb der Organisation zu erlangen.

In solchen Fällen sollte der Projektmanager klar aufzeigen, dass sich eine weitere Projektdurchführung nicht mehr lohnt. Abbruch ist schmerzhaft und das Budget kommt einem im Nachhinein fehlinvestiert vor; jedoch ist es besser als das Geld weiterhin in ein Projekt zu stecken, das in der Zukunft ohnehin keinen Erfolg erzielen wird.

2.4.1 Inhalt eines Business Case

Das Managementprodukt „Business Case“ dient als Werkzeug des Themas „Business Case“. Es wird die geschäftliche Rechtfertigung darstellbar gemacht. Der Business Case enthält typischerweise Kosten, Nutzen, Hauptrisiken, Zeitrahmen, negative Nebeneffekte, Gründe, Optionen sowie eine Investitionsrechnung. Anhand des Business Case wird in regelmäßigen Abständen geprüft, ob sich ein Projekt weiterhin lohnt.

Der Business Case wird als Entwurf im Prozess „Vorbereiten eines Projekts (SU)“ erstellt und im Prozess „Initiieren eines Projekts (IP)“ auf den auf dem Schaubild abgebildeten Umfang erweitert.


- Gründe (bereits aus SU vorhanden) ¹
- Optionen (bereits aus SU vorhanden) ²
- Zeitrahmen ³
- Hauptrisiken ⁴
- ROI ⁵
- negative Nebeneffekte ⁶
- erwarteter Nutzen ⁷
- Budget ⁸

Die Inhalte in ihrer Definition:

- **Gründe:** Die Gründe stellen den vergangenheitsbezogenen Auslöser für das Projekt dar. Die Olympiade wird beispielsweise durchgeführt, weil die Konjunktur in England aktuell stagniert. Diese Definition und dieses Beispiel gilt es nach der PRINCE2-Terminologie gerade in Bezug auf die Prüfung zu verinnerlichen.

In der Praxis gibt es jedoch auch Gründe für ein Projekt, die in der Zukunft liegen, zum Beispiel eine Gesetzesverabschiedung, auf die sich eine Bank vorbereiten muss.

Inhalt eines Business Case

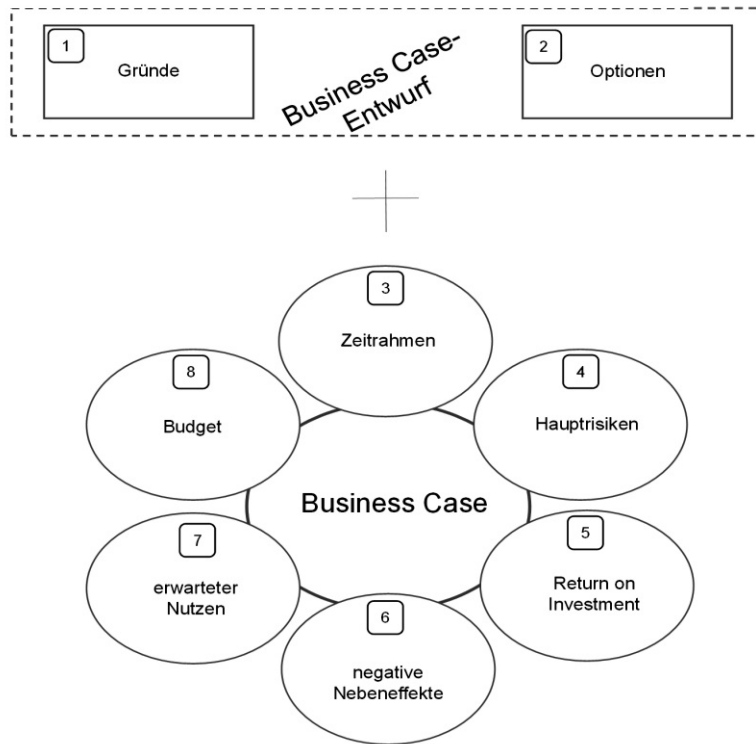

- **Optionen:** Die in einem Business Case niedergeschriebenen Optionen beschreiben die Handlungsalternativen, die zur Umsetzung der oben beschriebenen Gründe, in Form eines Projekts, in Frage kommen. Der PRINCE2-Terminologie

zufolge sollte neben der Projekt-Option auch die Null-Option konkret beschrieben werden. Diese beschreibt, wie sich die Organisation verhält, sollte das Projekt nicht wie geplant durchgeführt werden.

Nicht selten fällt in der Praxis auf, dass neben der ersten Projekt-Option auch weitere Projekt-Optionen sogar mit einem eigenen Business Case beschrieben werden. Das kommt dann vor, wenn das Projektvorhaben an sich einen so großen Umfang hat, dass eine Business Case-Betrachtung einfach zu wenig wäre, um alle Möglichkeiten bedarfsgerecht zu beurteilen.

- **Zeitraumen:** In jeden Business Case gehört natürlich auch der zeitliche Aspekt. Hier ist die Frage nach dem Anfangs- und dem Endzeitpunkt des Projektvorhabens. Darüber hinaus sollte hier auch erwähnt werden, wann der Nutzen des Projektvorhabens einsetzt. Auf den Inhalt der Nutzendefinition werden wir noch im Weiteren zu sprechen kommen.

Nur weil die Olympiade zum Ende 2011 errichtet wurde, tritt der Nutzen nicht in der Minute der Abschlussfeier ein. Vielmehr vergehen Tage, Wochen, in manchen Projekten sogar Jahre, bis der erwartete Nutzen eintritt und seine Wirkung entfaltet.

- **Hauptrisiken:** Unter diesem Punkt sollten Unsicherheiten aufgeführt werden, die einen so hohen Grad an Kritikalität aufweisen, dass sie bereits alleine den Gesamtprojekterfolg gefährden können. Neben der Auswirkung ist bei jedem Risiko auch die Eintrittswahrscheinlichkeit zu beachten. Mehr hierzu in [Abschnitt 3.7](#) zum Thema „Risiko“.

Klar ist, dass hier nicht kleine, händelbare Risiken wie die Krankheit eines Bauarbeiters einer olympischen Ausrichtungsstätte eingetragen werden. Hierbei geht es um große, existenzielle Risiken wie dem Eintritt einer Umweltkatastrophe.

- **ROI:** Genau diese monetäre Nutzenbetrachtung ist der wichtigste Bestandteil des Business Case. Hierbei werden alle vom Projekt bewirkten Kosten mit der

monetären Nutzenerbringung summiert, um am Ende ein möglichst positives Ergebnis zu erlangen.

- **Negative Nebeneffekte:** Die negativen Nebeneffekte stellen das Gegenteil der Nutzenbetrachtung innerhalb eines Business Case dar. Ist der Nutzen ein positiv getriebener Indikator, sind es die negativen Nebeneffekte (oder im engl. „Dis-benefit“) negativ getriebene Indikatoren, die das Projekt in der Durchführung mit sich bringt. Im Vergleich zu einem Risiko, das eine Eintrittswahrscheinlichkeit von X aufweist, hat der negative Nebeneffekt immer eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 100 Prozent: mit dem Eintritt wird gerechnet, und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent. Auch wenn die Auswirkung Y in den meisten Fällen nicht zu 100 Prozent beziffert werden kann, sind die negativen Nebeneffekte ein wichtiger Bestandteil der Betrachtung eines Business Case.

Ein negativer Nebeneffekt der Olympiade wäre, dass nur wegen der Durchführung der olympischen Spiele die Themse weiter erschlossen werden muss, woraufhin Naturschutzgebiete weichen müssen. Diese Effekte wirken sich nicht direkt auf die monetär getriebene *Return on Investment*-Rechnung aus. Jedoch muss auch jenen negativen Nebeneffekten das richtige Gehör verschafft werden. Gerade Naturliebhaber stellen bei solchen Großprojekten zurecht wichtige Stakeholder dar, welche auf besondere Art und Weise in die Projektdurchführung miteinbezogen werden sollten.

- **Nutzen:** Wie bereits bekannt, stellt der Nutzen den Mehrwert des Projekts dar. Hierbei ist zu beachten, dass der Nutzen immer messbar sein muss. Ist der Nutzen nicht messbar, handelt es sich strenggenommen nach PRINCE2 um keinen zu erwähnenden Nutzen innerhalb des Business Case.

Den Nutzen für die Olympiade lässt sich sehr gut ermitteln. Hier werden zuerst Milliarden investiert, woraufhin aber auch sehr schnell wieder Milliarden vom IOC, also dem Internationalen Olympischen Komitee, den Fernsehgeldern und den Touristen zurück in den Fiskus Großbritanniens gespült werden.

- **Budget:** Innerhalb des Budgets werden alle für das Projekt benötigten und geplanten Budgets niedergeschrieben. Das sind neben dem eigentlichen Projektbudget das Risikobudget, welches für die Behandlung von Risiken eingesetzt werden soll, sowie das Änderungsbudget, welches für die Steuerung und Implementierung von Änderungen verwendet werden soll.

Der Business Case ist, wie bereits schon erwähnt, ein lebendes Managementdokument. Innerhalb eines Projekts wird der Business Case im Grunde genommen dauerhaft am Ende jeder Managementphase überprüft und seitens des Lenkungsausschusses genehmigt. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass keiner der acht Inhalte eines erweiterten Business Case tatsächlich fix ist. Alle können und werden innerhalb eines Projekts angepasst.


2.4.2 Entwicklungspfad eines Business Case

Da sich die Frage nach der geschäftlichen Rechtfertigung aufgrund der sich verändernden Projektumgebung quasi fortlaufend stellt, kann auch der Business Case nicht statisch gehalten werden, sondern muss sich an die veränderte Umgebung anpassen. Diese Anpassung geschieht regelmäßig gegen Ende einer Phase im Prozess-Managen eines Phasenübergangs (SB). Hierbei verfolgt man stringent das Grundprinzip der fortlaufenden geschäftlichen Rechtfertigung.

Wie in dem unten aufgeführten Schaubild zu sehen ist, gliedert man diesen Lebenszyklus zwischen der Business-Case-Entwicklung¹⁾ und dem Pflegen des Business Case²⁾.

Der erste Schritt einer Business-Case-Entwicklung ist die Entwicklung des Business-Case-Entwurfs innerhalb des Prozesses „Vorbereitung eines Projekts (SU)“³⁾. Dieser wird zu Projektbeginn seitens des Lenkungsausschusses freigegeben⁴⁾, bevor er in der ersten Projektphase weiter spezifiziert wird⁵⁾. Am Ende der Initiierungsphase (IP) wird dann der detaillierte Business Case seitens des Lenkungsausschusses verifiziert⁶⁾. Damit ist die Entwicklung des Business Case abgeschlossen.

Entwicklungspfad des Business Case

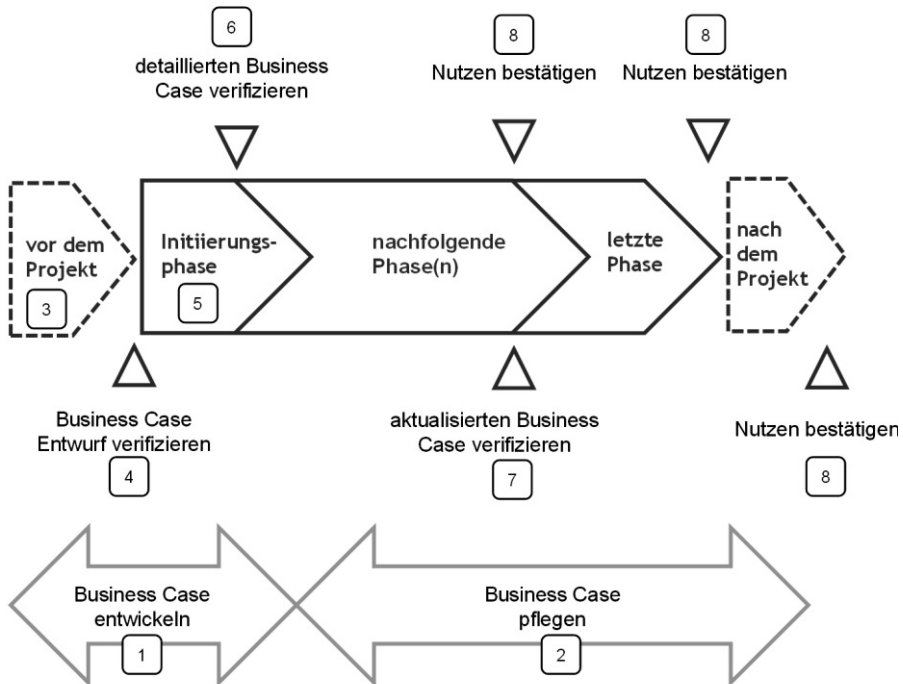

In den folgenden Phasen folgt die dauerhafte Pflege des Business Case. Innerhalb der einzelnen Managementphasen entstehen Gründe, weshalb der Business Case in sämtlichen Dimensionen angepasst werden könnte. Diese Anpassungen werden innerhalb des Prozesses eines Phasenübergangs (SB) durchgeführt, um dann am Ende der jeweiligen Managementphase seitens des Lenkungsausschusses verifiziert werden zu können⁷⁾.

Wie im Schaubild auf den beiden letzten oberen Pfeilen und auf dem letzten unteren Pfeil zu erkennen ist, wird an diesen Stellen von einer **Nutzen-Bestätigung** gesprochen.⁸⁾

Innerhalb des Themas „Business Case“ gibt es neben dem Dokument „Business Case“ auch noch ein weiteres, ausgesprochen wichtiges Managementprodukt: den Nutzenrevisionsplan.

Nutzenrevisionsplan

Ist im Managementprodukt Business Case der erwartete Nutzen niedergeschrieben, umfasst der Nutzenrevisionsplan die Techniken, wie und wann der Nutzen gemessen werden soll. Das kann durchaus bereits während des Projekts im Prozess-Managen eines Phasenübergangs (SB) sein, wobei zu beachten ist, dass der Gesamtnutzen in aller Regel erst nach dem Projekt realisiert wird.

Der revidierte, also der tatsächlich erwirtschaftete Nutzen wird dann im Nutzenrevisionsplan festgehalten.

Der Nutzenrevisionsplan weist eine weitere Besonderheit auf. Sind grundsätzlich alle anderen Managementprodukte nach Projektabschluss nicht mehr weiter zu pflegen, wird der Nutzenrevisionsplan nach Projektabschluss erst richtig mit Inhalt versorgt. Somit stellt er das einzige Managementprodukt dar, welches auch nach Projektabschluss weiterhin mit Input versorgt wird, sogar mit Input versorgt werden muss. Die Verantwortung hierfür geht nach Projektende an das Unternehmens- bzw. Programmmanagement über. In der Praxis findet diese Art von Nutzenrevision lei-

der wenig Anwendung. Viele Projekte werden beendet und dann über Jahre kein Nutzen gemessen bzw. bestätigt; aber genau das gerade ist der wichtigste Indikator dafür, ob ein Projekt Erfolg hatte oder nicht.
