

4 Projektablauf

4.1 Prozess Steuern einer Phase (CS) und Managen der Produktlieferung (MP)


Der Zweck des Prozesses „Steuern einer Phase (CS)“ besteht darin, die anfallenden Arbeiten den richtigen Leuten zuzuweisen, zum richtigen Zeitpunkt das Reporting herzustellen und bei Bedarf Korrekturmaßnahmen einzuleiten, um die Phase innerhalb der vereinbarten Toleranzen zu halten.

- **Arbeiten im Rahmen der Phase mit dem Teammanager in Form von Arbeitspaketen beschreiben und freigeben¹⁾**: Der erste Schritt ist, innerhalb einer neuen Projektphase mit dem Teammanager zusammen Arbeitspakete zu entwerfen. Hierbei ist es sehr wichtig, dass Teammanager vorhanden sind, da ein Projektmanager von seinem Skillset in der Regel nicht genügend Wissen vorweisen kann, um die Arbeitspakete adäquat zu beschreiben. Im nächsten Schritt wird dann das Arbeitspaket direkt an den Teammanager bzw. sein Team zur Erarbeitung weiterdelegiert.

Hier kommt darauffolgend direkt das Prozess-Managen der Produktlieferung (MP) zur Anwendung:

Beim Prozess-Managen der Produktlieferung (MP) wird der Teammanager in die Lage versetzt, den Arbeitsumfang seiner Teammitglieder zu koordinieren und den vereinbarten Reporting-Maßnahmen nachzukommen. Teammanager können sowohl organisationsinterne als auch externe Mitarbeiter sein.

Prozess Steuern einer Phase (CS) Prozess Managen der Produktlieferung (MP)

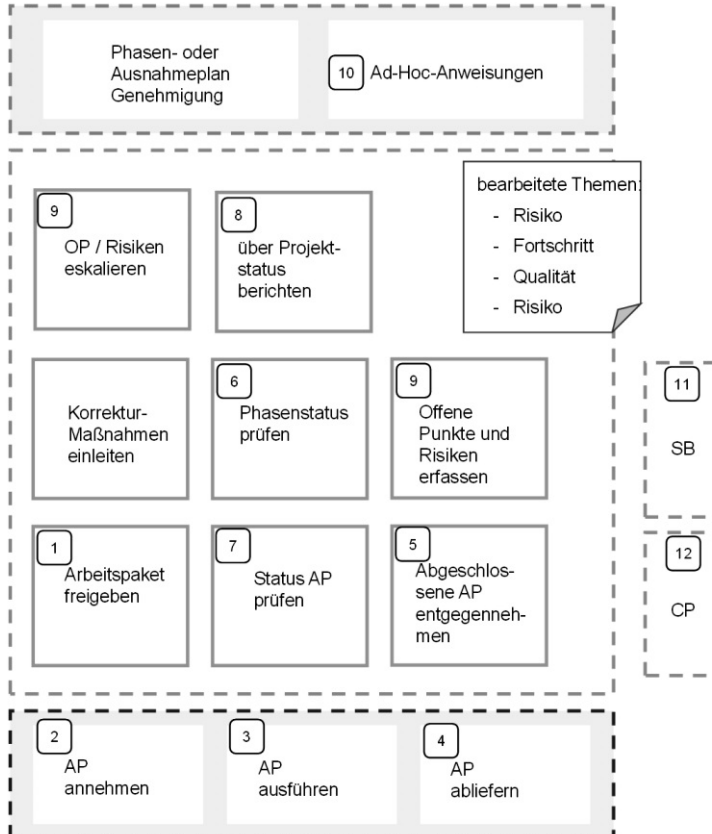

- **Arbeiten, die im Rahmen der Arbeitspakete erstellt wurden, an richtige Teammitglieder weiterleiten und Teamplan erstellen²⁾:** Der erste Schritt innerhalb des Prozesses MP ist, die Arbeitspakete anzunehmen und an die richtigen Teammitglieder weiterzugeben. Ferner erstellt in diesem Prozessschritt der Teammanager den optionalen Teamplan, der eine Art Miniprojektplan für sein Team bzw. Teilprojekt darstellt.
- **Dem Projektmanager zum vereinbarten Zeitpunkt ausreichend Information im Rahmen des Teamstatusberichts mitteilen und Arbeitspakete zu entwickeln³⁾:** Natürlich gehört es auch zu den Aufgaben des Teams, die Arbeitspakete auszuführen und während der Entwicklung der Produkte den Projektmanager über den aktuellen Stand der Arbeitspakete zu informieren. Dies geschieht über das Reporting des Teammanagers, der in Form des Teamstatusberichts in einem vordefinierten Zeitturnus reportet.
- **Erstellte Produkte zu übergeben und das Ergebnis im Qualitätsregister eintragen⁴⁾:** Wenn Produkte erstellt worden sind, gehört es natürlich auch zur Aufgabe der Teammanager, die fertigen Produkte einer Qualitätsprüfung unterziehen zu lassen (mehr hierzu in Abschnitt 4.2 Qualität), das Ergebnis dann im Qualitätsregister eintragen zu lassen und das abgenommene Produkt zu übergeben.

Im nächsten Schritt ist wieder der Prozess „Steuern einer Phase“ an der Reihe:

- **Abgeschlossene Arbeitspakete entgegennehmen⁵⁾:** Wie im vorherigen Prozessschritt beschrieben wurde, wird hier das vom Teammanager erstellte Produkt an den Projektmanager übergeben und der Teammanager entlastet.
- **Einen Soll-Ist-Abgleich innerhalb der Phase durchführen⁶⁾:** Hierbei geht es darum, den Phasenplan zur Hand zunehmen und den Phasenstatus im Rahmen dessen zu überprüfen. Hierbei kann es entweder zu der Erkenntnis kommen, dass die Phase sich dem Ende zuneigt, womit die nächste Phasenplanung einge-

leitet werden sollte → Weiterführung im Prozess SB, oder das Ende des Projekts bevorsteht, woraufhin der Prozess „Abschließen eines Projekts (CP)“ zum Tragen käme. Auch könnte der Fall eintreten, dass der Projektmanager merkt, dass er Korrekturmaßnahmen innerhalb seiner Toleranzbefugnis einleiten sollte. Hierdurch führt es dem PM zum links danebenstehenden Prozessschritt „Korrekturmaßnahmen einleiten“. Die Korrekturmaßnahmen werden geplant und letztlich in Arbeitspaketen an den Teammanager weitergegeben. Daraufhin beginnt der eben beschriebene Zyklus von vorne.

- **Übergebene Arbeitspakete im Rahmen der Reporting-Standards überwachen⁷⁾:** Der nächste Prozessschritt findet immer dann statt, wenn dem Projektmanager aus dem beschriebenen Arbeitszyklus ein Teamstatusbericht des Teammanagers ausgehändigt wird. Er hilft dem Projektmanager, einen Überblick über den Bearbeitungsstand der verschiedenen Arbeitspakete zu erlangen.
- **Den Projektstatus an den Lenkungsausschuss reporten⁸⁾:** Im nächsten Prozessschritt muss der Projektmanager über den aktuellen Stand der Phase berichten. Das macht er mit dem bereits bekannten Projektstatusbericht. Dieser wird vom Projektmanager erstellt, mit allen notwendigen Informationen über die aktuelle Phase vervollständigt und dem Lenkungsausschuss reportet. Dieser prüft den Projektstatusbericht dann in seinem Prozess „Lenken eines Projekts“ (DP). Falls alles passt, passiert nichts, außer dass der Projektmanager und sein Team weiter am Erfolg der Phase arbeiten. Sollte dem Lenkungsausschuss etwas in dem Projektstatusbericht auffallen, was ihm nicht gutdünkt, wird er über die Ad-hoc-Anweisungen seinen Willen verlauten, woraufhin der Projektmanager wieder zum Prozessschritt „Korrekturmaßnahmen einleiten“ gelangt, um dem Willen des Lenkungsausschusses zu entsprechen.
- **Risiken und Offene Punkte erfassen, managen und ggf. eskalieren⁹⁾:** Ein wichtiger Bestandteil, neben dem Abarbeiten des Projekt- bzw. Phasenplans, ist das

4.1 Prozess Steuern einer Phase (CS) und Managen der Produktlieferung (MP) 149

richtige Management der Offenen Punkte (OP) und Risiken. Von Natur aus kann hier keine großartige Planung berücksichtigt werden, da diese in der Regel sehr ad-hoc auftreten und behandelt werden müssen.

Im ersten Schritt „Offene Punkte oder Risiken erfassen“ werden die von wem auch immer gemeldeten Themen erfasst, bewertet und geplant. Die Erfassung wird im Register der offenen Punkte oder im Risikoregister ausgeführt. Auch die Bewertung und die geplanten Maßnahmen werden im Register der offenen Punkte oder im Risikoregister niedergeschrieben. Im nächsten Schritt wird die Auswirkung der erfassten OP's oder Risiken auf die Phase kontrolliert. Dies geschieht wiederum im bereits beschriebenen Prozessschritt „Phasenstatus prüfen“. Sollten die identifizierten OP's bzw. Risiken im Folgenden als schwerwiegend eingestuft werden, müssen diese im nächsten Prozessschritt „OP / Risiken eskalieren“ an den LA eskaliert werden. Offene Punkte werden mit einem Offene-Punkte-Bericht an den LA eskaliert, ebenso Risiken mit einem Ausnahmebericht. Schwerwiegend bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die OP's oder Risiken einen Toleranzbereich des Projektmanagers verletzen oder künftig verletzt werden.

Der LA hat dann nach Eskalation mehrere Optionen, weiter zu verfahren. Er könnte a) dem Projektmanager über eine Ad-hoc-Entscheidung mitteilen¹⁰⁾, dass er entweder einen Ausnahmeplan, also eine genaue Definition der Problematik benötigt, oder einfach mitteilen, dass er keine Bedenken hat und dem Projektmanager damit neue Toleranzen für die Phase übergibt. Sollte der Ausnahmeplan gefordert werden, werden die aktuelle Phase beendet und ein Übergang in das Prozess-Managen eines Phasenübergangs (SB) vorbereitet¹¹⁾. Im Prozess SB plant der PM dann die Phase neu und lässt sie seitens des LA wiederum korrigieren. b) Der LA hat die Möglichkeit, auf Grundlage der schwerwiegenden Toleranzüberschreitung das Projekt zu beenden. Mit dieser Entscheidung geht der Projektmanager zum Prozess „Abschließen eines Projekts (CP)“ über und beendet das Projekt vorzeitig¹²⁾.

Abschließend kann man zur Prozesskombination CS/MP sagen, dass es sich hierbei um die maximale Darstellung des täglichen Projektgeschäfts handelt. Aus Effizienzgründen konnte nur eine Vielzahl an Kombinationen der verschiedenen Aktivitäten dieses umfangreichen Prozesses dargestellt werden. Im Projekt selbst können 100 von Prozessaktivitätsmöglichkeiten vorkommen. Einmal verstanden, fällt einem es jedoch sehr leicht, auffallende Themen innerhalb der von PRINCE2 vorgegebenen Prozessstruktur zu bearbeiten und zu einem erfolgreichen Ergebnis zu führen.

4.2 Thema Qualität


Im Thema „Qualität“ geht es darum, anfänglich meist sehr subjektive Kundenqualitätsersparungen in messbare Projektabnahmekriterien umzuwandeln und hierdurch das Projektendprodukt – analog der Anforderungen – zu erstellen. Durch die Bearbeitung dieses Themas geht die Terminologie dem Grundprinzip der Produktorientierung nach.

Entgegen dem umgangssprachlichen Gebrauch ist das Wort Qualität bei PRINCE2 als Eigenschaft zu sehen. Dabei steht die Beurteilung, ob gut oder schlecht, nicht in der Kompetenz des Projektmanagers. Vielmehr sollte der Kunde seine Vorstellung von den Eigenschaften mitteilen und deren Umsetzung in die Verantwortung des Projektmanagers geben.

4.2.1 Qualitätskontrollpfad

Der Qualitätskontrollpfad stellt innerhalb des Themas „Qualität“ das beste von PRINCE2 vorgegebene Schaubild dar, das vom Beginn bis zum Ende des Projekts das Thema „Qualität“ als sich mitentwickelndes Thema beschreibt.

Qualitätskontroll- pfad

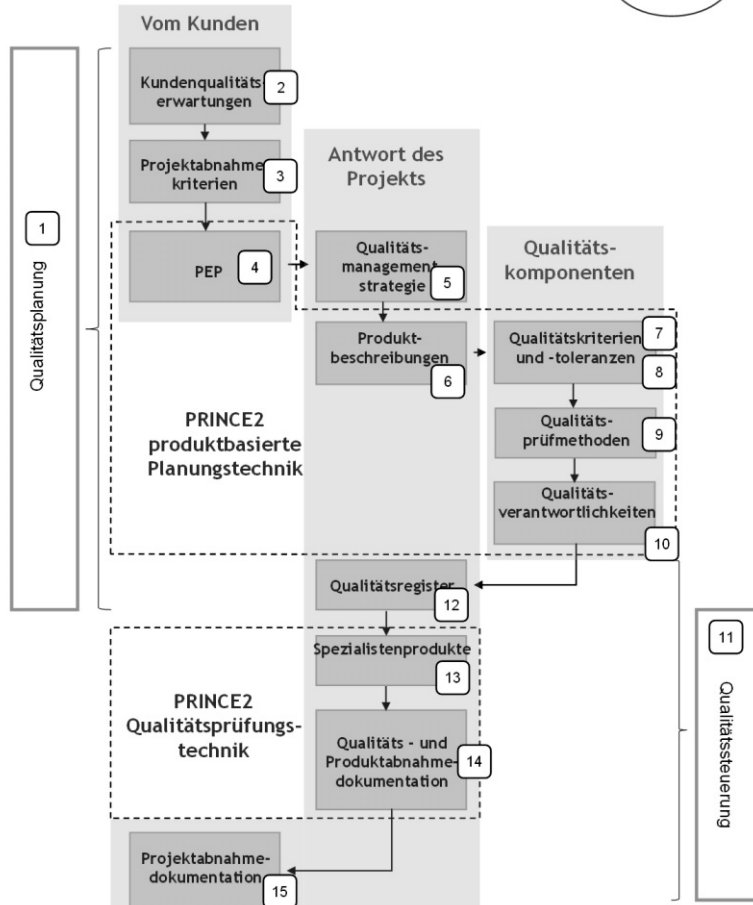

Qualitätskontrollpfad

Der Qualitätskontrollpfad spiegelt eine Art Lebenszyklus wieder, welcher hilft, den Überblick über die Anforderung zu erlangen. Einen Lebenszyklus deshalb, weil von der ersten Kundenanforderung bis zur Erstellung des Endprodukts, jeder Zwischenschritt aufgezeigt wird.

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte des Qualitätskontrollpfades genauer erläutert. Hierbei wird zum einen auf die Begrifflichkeit an sich als auch auf den Zeitpunkt im Projekt, an dem dieser Schritt durchgeführt werden sollte, eingegangen. Auf der linken bzw. rechten Seite sind die Überbegriffe, innerhalb deren man sich bem jeweiligen Schritt befindet, niedergeschrieben.

Qualitätsplanung¹⁾: Im Qualitätskontrollpfad stellt die Qualitätsplanung eines der beiden Kernelemente dar. Innerhalb der Qualitätsplanung werden wiederum verschiedene Granularitätsebenen zur Ermittlung des Verständnisses der vom Kunden gewünschten Qualität durchlaufen.

- **Kundenqualitätserwartungen²⁾:** Im ersten Schritt des Qualitätskontrollpfades werden die ersten Wünsche des Kunden herangezogen und in den Kundenqualitätserwartungen der Projektbeschreibung des Projektendprodukts niedergeschrieben. Die Kundenqualitätserwartungen stellen die erste vom Kunden gewünschte Indikation dar. Wie es in der Praxis üblich ist, sind die ersten Gespräche meist sehr „weich“, also nicht messbar formuliert. Dies geschieht in den meisten Fällen vor dem Projekt im Prozess „Vorbereiten eines Projekts (SU)“.
- Als das IOC die Gespräche mit London zur Durchführung der Olympiade aufgenommen hatte, werden die Olympia-Rechteinhaber mit Sicherheit Vorstellungen wie „Die Olympiade soll umwerfend, großartig oder spektakulär ausfallen“ geäußert haben. Was genau aber versteht man darunter? Wenn man einen Veganer und einen Fleischesser jeweils darum bittet, eine großartige Mahlzeit zu kochen, könnten die Ergebnisse vermutlich unterschiedlicher nicht sein. Was

somit fehlt, ist die Messbarkeit, die Definition von „großartig“. Dies wird im nächsten Schritt erreicht.

- **Projektabnahmekriterien³⁾**: Hierbei geht es darum, die bereits bekannten Kundenqualitätserwartungen so messbar wie nur irgend möglich zu formulieren. Je messbarer und klarer formuliert wird, desto weniger kann am Ende der Kunde sich über eventuelle Qualitätsmängel beschweren, vorausgesetzt, die Erwartungen sind wie von dem Kunden beschrieben umgesetzt worden.
- „Großartig“ wird dann übersetzt in: Eine Olympiade, die bereits bei ihrer Eröffnungsfeier mit einem 6000-Raketen-Feuerwerk von 150 Meter Höhe aufwartet, überzeugt, dass sie gut wird (auch das kann man noch viel konkreter beschreiben, der Sinn dürfte jedoch klar sein).
- **PEP⁴⁾**: Hat man nun die Kundenqualitätserwartungen und Projektabnahmekriterien genau definiert, schreibt man diese in der bereits bekannten und ebenfalls im Prozess „Vorbereiten eines Projekts (SU)“ beschriebenen Produktbeschreibung des Projektendprodukts (PEP) inklusiver weiterer Inhalte nieder.

Hat man nun eine erste Ausprägung der Qualitätswünsche des Kunden, kann das Projekt im nächsten Schritt darangehen, sich eine „Antwort des Projekts“ zu überlegen. Der erste Schritt wäre hierbei die Erstellung einer Qualitätsmanagementstrategie.

- **Qualitätsmanagementstrategie⁵⁾**: Eine Strategie, welche die zu verwendeten Qualitätsstandards, Qualitätstechniken und Qualitätsverantwortlichkeiten festlegt, um das geforderte Qualitätsniveau zu erreichen. Auf Basis der Qualitätsstrategie werden im nächsten Schritt die Produktbeschreibungen für die erste Phase des Projekts geplant. Diese Planung wird vom Projektmanager durchgeführt.
- **Produktbeschreibungen⁶⁾**: Produktbeschreibungen sind in ihrer strukturellen Ausprägung im Grunde genommen analog der Produktbeschreibung des Pro-

jektendprodukts. Sie beschreiben für sich ein Produkt. Einziger Unterschied ist hierbei die „Flughöhe“ der Beschreibung. Die Produktbeschreibungen fallen hierbei deutlich detaillierter aus, als es die PEP macht. Alle Produktbeschreibungen zusammengenommen würden die PEP nur auf einer sehr granularen Ebene ergeben. Innerhalb der Produktbeschreibungen sind die für das Produkt benötigten **Qualitätskriterien**⁷⁾, also zum Beispiel die Lautstärke des Eröffnungsfeuerwerkes, sowie die dafür vorgesehenen **Qualitätstoleranzen**⁸⁾ enthalten. Die Qualitätstoleranz könnte hier 10-15 dB bedeuten. Ebenfalls sind die **Qualitätsprüfungsmethode**⁹⁾, also die Art und Weise, wie die Qualität am Ende geprüft wird, und die **Qualitätsverantwortlichkeiten**¹⁰⁾, also wer für die Qualitätsentwicklung und Überprüfung am Ende zuständig ist, enthalten. Die Qualitätsprüfungsmethode könnte zum Beispiel ein Testfeuerwerk 48 Stunden vor Beginn der Eröffnungsfeier sein. Die Qualitätsverantwortlichkeiten könnten Herr Firefighter Smith vom Firefighter Headquarter London und der Projektmanager sein.

Bis hier ging es um die Planung und Definition der vom Projekt zu entwickelnden Produkte. Im Folgenden wird nun die **Qualitätssteuerung** genauer beschrieben.

- **Qualitätssteuerung**¹¹⁾: Die Qualitätssteuerung bildet innerhalb des Qualitätskontrollpfades den zweiten großen Baustein ab. Hierbei handelt es sich um die praktische Umsetzung, die Kontrolle und die Abnahme der geforderten Produkte und deren Qualität.

Diese in der Qualitätsplanung ermittelte Fülle an Informationen werden im bereits bekannten und schon oft beschriebenen **Qualitätsregister**¹²⁾ niedergeschrieben. Das Qualitätsregister wird ständig aktualisiert, da sich ständig auch alle Produkte des Projekts anpassen und verändern. Aus dem Qualitätsregister heraus wird dann das **Spezialistenprodukt**¹³⁾ auf Basis der im Qualitätsregister beschriebenen Produkteigenschaften entwickelt.

Sollte die Qualität ausreichend sein, wird auch hier wieder ein Vermerk im Qualitätsregister gemacht, wodurch die **Qualitäts- und Produktabnahmedokumentation**¹⁴⁾ als erfolgreich erklärt wird. Hierbei geht es tatsächlich um die Prüfung der vorvergangenen Eigenschaften auf Basis der in der Produktbeschreibung genannten Qualitätsanforderungen und Prüfungsmethoden.

Die Abfolge von „Produktbeschreibungen“ bis hin zur „Qualitäts- und Produktabnahmedokumentation“ wiederholt sich im Grunde genommen so oft, bis das letzte Produkt final abgenommen wurde und eine finale **Projektabnahmedokumentation**¹⁵⁾ mit der Übergabe des Projektendprodukts durchgeführt wurde.



4.2.2 Qualitätsprüfungstechnik

Nachdem wir uns in Abschnitt 4.2.1 mit der Fragestellung „Wie wird Qualität geplant und gesteuert?“ beschäftigt haben, wenden wir uns hier der Frage zu, wie die Qualität abgenommen wird. Die Qualitätsprüfung ist nach einer langen Projektzeit bzw. Produktentwicklungszeit der Moment der Wahrheit, da hier das entwickelte Produkt erstmals den Stakeholdern vorgelegt wird. PRINCE2 gibt hier eine so genannte „Qualitätsprüfungstechnik“ vor, auf deren Basis dann innerhalb der Projekte die Abnahme der entwickelten und erstellten Produkte vonstattengeht.

Die an der Prüfung teilnehmenden Personen bekommen Rollen mit klar definierten Verantwortlichkeiten zugeteilt. Das Ziel ist, festzustellen, ob das Spezialistenprodukt für den gewünschten Zweck geeignet ist, es die nötigen Standards einhält und den in der Produktbeschreibung niedergeschriebenen Anforderungen genügt.

Im oberen Teil des nachstehenden Schaubildes wird die Qualitätsprüfungstechnik als Prozess aufgeführt. Diese Prozessschritte werden zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der dafür stattfindenden Qualitätsprüfungssitzung durchlaufen:

Qualitätsprüfungstechnik

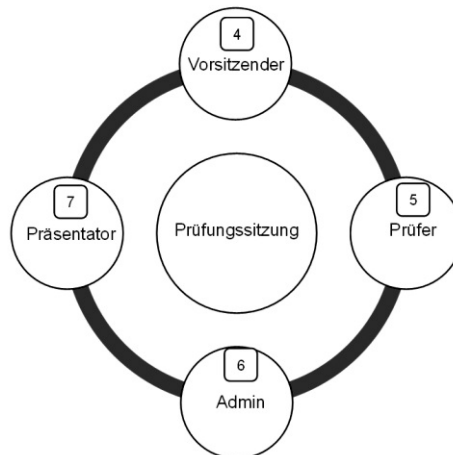

- **Prüfungsvorbereitung¹⁾**
- **Prüfungssitzung²⁾**
- **Prüfungsnachbereitung³⁾**

Die Prüfungsvorbereitung dient dem Verantwortlichen, alle notwendigen Vorbereitungen zu treffen, damit die eigentliche Qualitätsprüfungssitzung durchgeführt werden kann. Gemäß der PRINCE2-Terminologie werden hier Produktproben, Kopien, Bilder oder Präsentationen (je nachdem, um welche Art von Produkt es sich hierbei handelt) verschickt, damit sich der Prüferkreis auf die Sitzung vorbereiten kann.

Die Prüfungssitzung ist der tatsächliche Moment, wo alle Qualitätsverantwortlichkeiten zusammentreffen und über das erstellte Spezialistenprodukt sprechen. Ziel dieser Sitzung ist, das Produkt entgegen zu nehmen und damit die Ersteller zu entlasten. Sollten während der Prüfungssitzung noch Verbesserungsvorschläge aufkommen, die die Abnahme des Produkts behindern, wird die finale Abnahme verschoben. Die Entwickler haben daraufhin nochmal die Möglichkeit, Anpassungen durchzuführen. In diesem Fall tritt der im Schaubild gezeigte Pfeil in Kraft, der eine erneute Vorbereitung für die Zweitprüfung anzeigt.

Die Prüfungsnachbereitung findet nach erfolgreicher oder nicht erfolgreicher Prüfungssitzung statt. Beide Szenarien bringen Nachbearbeitungsbedarf mit sich. Das Ergebnis der Qualitätsprüfung muss dem dafür vorgesehenen Kreis kommuniziert werden, die Dokumente müssen gepflegt werden, ein Protokoll muss verschickt werden. Die Prüfungsnachbereitung bezieht sich hierbei vor allem auf die administrativen Themen.

Im unteren Teil des Schaubildes sind die dafür notwendigen Rollen aufgeführt.

- **Vorsitzender⁴⁾**
- **Prüfer⁵⁾**

■ Admin⁶⁾

■ Präsentator⁷⁾

Prüfungsvorsitzender

Die Rolle, die für den Ablauf der Qualitätsprüfung verantwortlich ist.

Prüfer

Der Prüfer übernimmt die tatsächliche Produktüberprüfung, reicht im Vorhinein Fragen ein, die bei der Prüfungsvorbereitung bei der Untersuchung des eingereichten Produkts entstanden, und bestätigt, dass die geforderte Qualität erreicht wurde.

Prüfungsadministrator

Er unterstützt den Prüfer in administrativen Belangen und protokolliert die Prüfung, die Ergebnisse und eventuelle Nachbesserungsmaßnahmen.


Produktpräsentator

Der Präsentator stellt das Produkt für die Prüfung vor und vertritt bei Bedarf den Ersteller des Produkts. Ferner übernimmt der Präsentator die im Anschluss an die Prüfung anfallende Koordination der Arbeiten, falls Änderungen anstehen oder Fehler ausgebessert werden sollen.

4.3 Thema Änderungen

Zweck des Themas „Änderungen“ ist die Identifikation, Bewertung und Steuerung potenzieller und genehmigter Änderungen; in PRINCE2 auch als „Offener Punkt“ benannt. Innerhalb dessen unterscheidet man zwischen "baseline"- und "nicht-baseline"-offenen Punkten.

Thema Änderungen

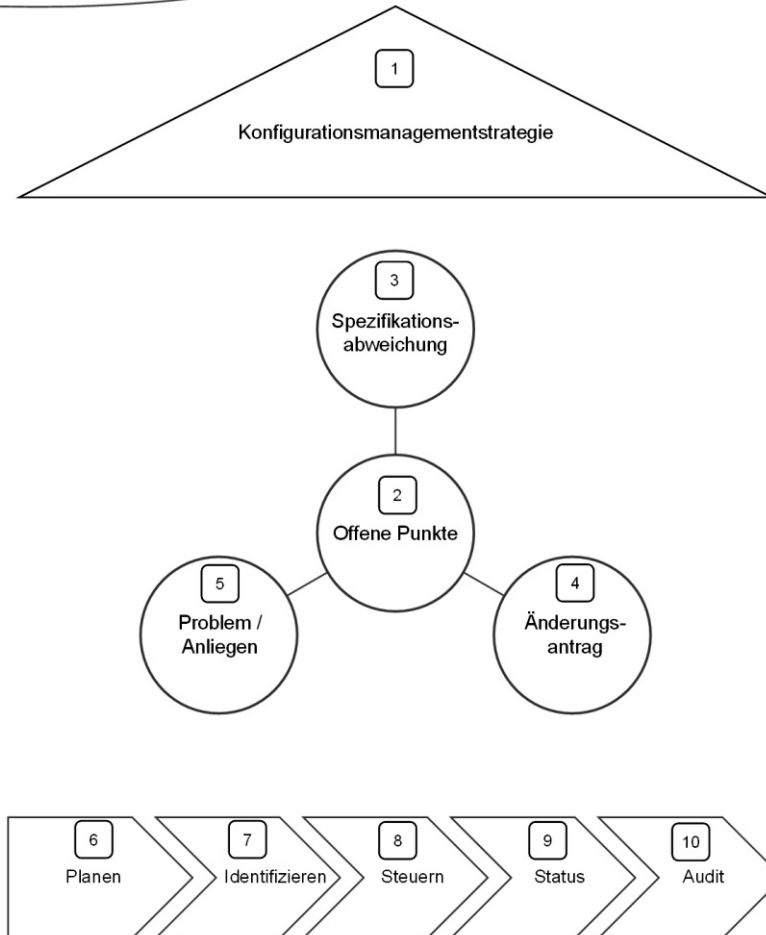

Baseline: Die Baseline bildet die festgeschriebene Ausgangskonfiguration eines Produkts. Ist etwas „gebaselined“, bringt das zum Ausdruck, dass zur Änderung dieses Produkts der Änderungssteuerungsprozess angewendet werden muss.

Änderungssteuerungsprozess: Veränderungen sind während eines Projekts unvermeidlich. Daher benötigt jedes Projekt einen prozessualen Ansatz für die Identifikation, Bewertung und Steuerung Offener Punkte.

Das Ziel ist dabei nicht die Verhinderung Offener Punkte, sondern vielmehr, dass jeder Offene Punkt der zuständigen Instanz vorgelegt wird, um diese in die Lage zu versetzen, über die Offenen Punkte zu entscheiden.

Damit die Steuerung der Offenen Punkte richtig vonstattengeht, bedarf es über der Änderungssteuerung eines schützenden Dachs, das im unten aufgeführten Schaubild metaphorisch dargestellt wird. In PRINCE2 ist dieses „Dach“ als **Konfigurationsmanagementstrategie**¹⁾ beschrieben. Konfigurationsmanagement klingt im ersten Moment komplizierter, als es tatsächlich ist. In einem anderen, besser beschreibenden Wort könnte man auch „Änderungsstrategie“ dazu sagen, um es verständlicher zu machen.

Die Konfigurationsmanagementstrategie

Die Konfigurationsmanagementstrategie bildet das schützende Dach, unter dem die Steuerung der Offenen Punkte steht. Sie beschreibt, wie und von wem die Produkte eines Projekts gesteuert und geschützt werden. Wird ein Offener Punkt gemeldet, wird im ersten Schritt überprüft, ob dieser tatsächlich den in der Konfigurationsmanagementstrategie beschriebenen Rahmenbedingungen entspricht. Nur durch ein professionelles Konfigurationsmanagement kann somit sichergestellt werden, dass Produkte nicht unkontrolliert verändert werden.

Innerhalb der von PRINCE2 beschriebenen „**Offenen Punkte**“²⁾ unterscheidet man zwischen „**Spezifikationsabweichung**“³⁾, „**Änderungsantrag**“⁴⁾ und „**Problem/Anliegen**“⁵⁾.

Spezifikationsabweichung: Eine im Rahmen des Projekts zu erfüllende Produktanforderung, die derzeit nicht bzw. voraussichtlich nicht erfüllt wird. Hierbei kann es sich um ein fehlendes Produkt oder ein Produkt, das die Spezifikation nicht einhalten kann, handeln. Es ist zu beachten, dass es sich hierbei um einen offenen Punkt handelt, dem nachgekommen werden muss, da ansonsten der Projekterfolg gefährdet ist.

Änderungsantrag: Ein Vorschlag zur Änderung einer „gebaselineten Produkteigenschaft“. Der Änderungsantrag kann von jedem Mitarbeiter der Projektorganisation gestellt werden. In PRINCE2 wird als Verantwortlichkeit, die für die Genehmigung oder Ablehnung der gestellten Änderungsanträge zuständig ist, der Lenkungsausschuss genannt. Zu beachten ist hierbei, dass bei einem erhöhten Aufkommen an Änderungsanträgen der Lenkungsausschuss auch eine weitere Instanz zur Entscheidung über die Änderungsanträge bestellen kann: den Änderungsausschuss. Der Projektmanager selber hat keine Befugnis, Änderungsanträge zu genehmigen oder abzulehnen.

Änderungsausschuss: Dieser besitzt die Kompetenz, über Änderungen zu entscheiden. Der Änderungsausschuss ist nicht zwingend – wie der Name vermuten lässt – ein Komitee, sondern besteht vielmehr aus einzelnen Personen innerhalb des Projektteams, die in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Arten von Änderungskompetenz seitens des Lenkungsausschusses delegiert bekommen haben. Es ist nicht die Aufgabe des Änderungsausschusses, die Auswirkungen der Änderungsanträge zu analysieren oder deren Umsetzung zu betreuen. Dies liegt jeweils im Kompetenzbereich der fachlichen Teammanager bzw. des Projektmanagers.

Problem/Anliegen: Hierbei handelt es sich um einen sonstigen offenen Punkt, dessen Lösung oder Eskalation Aufgabe des Projektmanagers ist. Hierzu zählen zum Beispiel Krankmeldungen oder Verbesserungsvorschläge. Ein Problem/Anliegen hat keine Auswirkung auf die Baseline der Produktanforderungen.

Offene Punkte, die formell behandelt werden müssen, werden in das Register der Offenen Punkte eingetragen. Informelle Offene Punkte, die formlos behandelt werden, können im Projekttagebuch geführt werden. Eine detaillierte Beschreibung des Offenen Punktes, die Auswirkungsanalyse und die Behandlungsempfehlung kann formell in einem Offener-Punkt-Bericht dokumentiert werden, der als Entscheidungsgrundlage für den Änderungs- bzw. Lenkungsausschuss dient.

Wie bereits im 3. Absatz „Konfigurationsmanagementstrategie“ dieses Kapitels beschrieben wurde, bildet die Konfigurationsmanagementstrategie das „schützende Dach“, damit jedem Projektteilnehmer bewusst wird, wie innerhalb eines Projekts das Thema „Änderungen“ gelebt wird.

Damit ein Produkt jedoch unter das Konfigurationsmanagement fällt, muss das Produkt bzw. das Teilprodukt „gebaselined werden“. Um genauer zu sein wird die Konfiguration des Produkts bzw. des Teilprodukts „gebaselined“. Dies geschieht, indem man Bestandteile des Produkts, welche von der Konfiguration nur kontrolliert geändert werden dürfen, als so genannte „Konfigurationselemente“ identifiziert.

Konfigurationselement: Ein Teil einer Konfiguration, die die physischen und funktionellen Merkmale eines Produkts beinhaltet.

Damit die Konfigurationselemente auch richtig gemanagt werden, ist seitens der PRINCE2-Terminologie der im Schaubild auf Seite 159 befindliche Prozess dargestellt.

- **Planen⁶⁾:** Der erste Schritt innerhalb des Prozesses ist die Planung der Granularität der Konfiguration. Bis auf welche Ebene wird innerhalb eines Projekts das Produkt bzw. dessen Anforderungen konfiguriert bzw. „gebaselined“? Beim Bau des Olympischen Dorfes stellt sich somit die Frage, ob man die Konfiguration des Daches mit einplant oder ob die unterste Planungsebene jeder Nagel für das Dach ist. Je nachdem, für welche Ebene sich der Projektmanager entscheidet, wird die Planung gröber oder feiner ausfallen. Die Entscheidung, auf wel-

cher Ebene „gebaselined“ wird, wird in der Konfigurationsmanagementstrategie festgehalten.

- **Identifizieren⁷⁾**: Im nächsten Schritt werden dann die einzelnen Konfigurationselemente identifiziert. Hat man sich für die unterste Ebene, die der Nägel, festgelegt, wird im Folgenden jeder einzelne Nagel genauestens erfasst.
- **Steuern⁸⁾**: Sind alle Konfigurationselemente erfasst, liegt es nun am Lenkungsausschuss bzw. dem bestehenden Änderungsausschuss, diese so zu steuern, dass keine unbefugten Änderungen an den Konfigurationselementen vorgenommen werden können. Dies macht der Änderungsausschuss durch die Überprüfung und Entscheidung von Änderungsanträgen.
- **Status⁹⁾**: Der Status ist eine Möglichkeit, sich über den aktuellen Stand der Konfigurationselemente zu erkundigen. Dieser Stand kann über die „Produktstatusauskunft“ abgefragt werden. Die „Produktstatusauskunft“, stellt innerhalb von PRINCE2 ein Managementprodukt dar, durch das interessierte Stakeholder einen Zwischenstand der Erarbeitung abrufen können.
- **Audit/Überprüfung¹⁰⁾**: Der letzte Schritt innerhalb des Prozesses des Konfigurationsmanagements ist eine Auditierung bzw. Überprüfung der vier vorhergegangenen Schritte.
