

Schritt 6: Umsetzung – Die IT-Roadmap, Ermittlung des IT-Budgets und das IT-Projektportfolio

Zusammenfassung

In diesem sechsten Schritt beginnt die Umsetzung der IT-Strategie. Nachdem die Applikationsstrategie festgelegt und entschieden wurde, welche IT-Leistungen intern oder extern durch Provider erbracht werden, wurde die IT-Organisation überprüft, auf neue Beine gestellt und es wurden die dazu passenden Governancestrukturen aufgesetzt. Jetzt erfolgt die Umsetzung der IT-Strategie in drei Stufen:

1. Erstellung einer Roadmap, die auf Basis des Zeithorizontes von ca. 2–3 Jahren darstellt, welche Projekte in der IT langfristig durchgeführt werden müssen, damit die IT-Strategie umgesetzt werden kann.
2. Ermittlung des notwendigen Budgets und Genehmigung.
3. Hinzu kommt die Erstellung oder Anpassung eines IT-Projektportfolios, damit jederzeit im Rahmen der Umsetzung geprüft werden kann, ob alle Projekte wirtschaftlich sinnvoll sind und den Zielen der IT-Strategie entsprechen.

Erstellung einer IT-Roadmap

Die IT-Roadmap soll im Rahmen der Umsetzung der IT-Strategie als Hilfsinstrument für die Navigation durch das zum Teil noch unbekannte Gelände dienen. Dabei bildet die IT-Roadmap die Projekte und Maßnahmen auf dem Weg zur vollendeten IT-Strategie auf einem Zeitstrahl von ca. 3–5 Jahren ab. Die Roadmap dient der richtigen Schwerpunktsetzung und hilft damit den Fokus zu behalten, um die IT-Strategie verwirklichen zu können.

Roadmaps können in vielen verschiedenen Formen visualisiert werden, so zum Beispiel als Netzplan (ähnlich einem U-Bahn-Netzplan in großen Städten), als Koordinatensystem oder ganz einfach auf einem Zeitstrahl. Wir wählen hier der Übersichtlichkeit und Einfachheit halber den Zeitstrahl, wie er beispielhaft in Abb. 1 dargestellt ist.

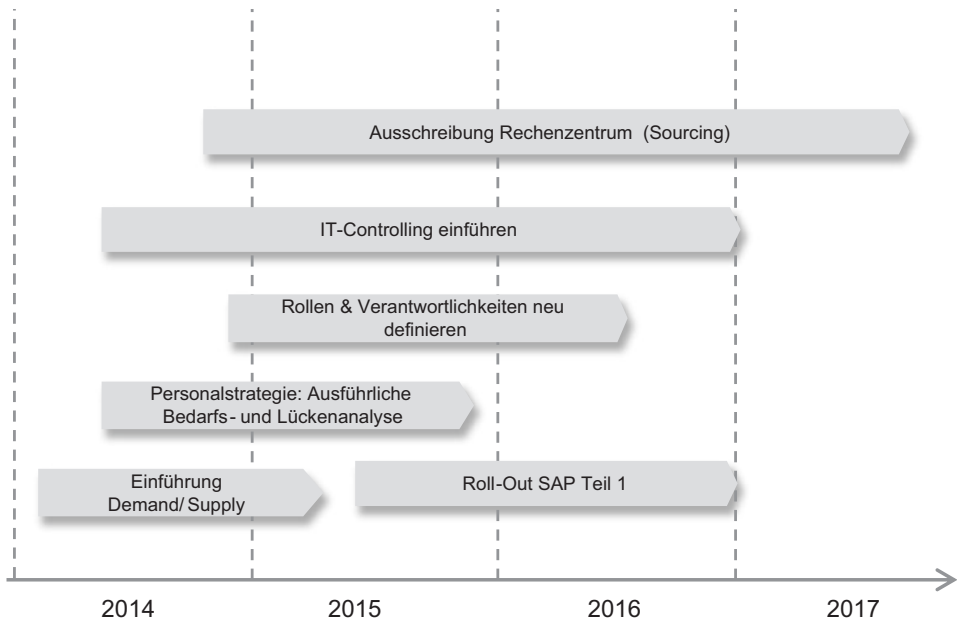


Abb. 1 Roadmap als Zeitstrahl (Beispiel)

Die Erstellung der IT-Roadmap vereint zwei Vorteile in sich:

- Zum einen wird auf Basis der Ergebnisse aus den vorherigen 5 Schritten noch einmal das gesammelte Wissen reflektiert und übersichtlich in Form von Maßnahmenpaketen auf einem Zeitstrahl abgebildet.
- Zum anderen stellt die IT-Roadmap nach Fertigstellung eine sehr gute Kontrollinstanz dar, denn man kann immer wieder drauf schauen und prüfen, was wann anliegt und ob es schon erledigt ist oder nicht.

Bei der Erstellung der IT-Roadmap werden jetzt zwei Abschnitte durchlaufen, die im Folgenden ausführlich vorgestellt werden.

Zusammenfassen der Ergebnisse in Maßnahmenpakete

Maßnahmen für Schritt 1: Ist-Analyse

Der Startpunkt ist Schritt 1 mit der Ist-Analyse, in dem der Ist-Zustand der IT als Reifegrad-Modell erarbeitet wurde (siehe dazu den schon bearbeiteten Schritt 1). Auf dieser Basis wird jetzt im Rahmen der Roadmap-Erstellung der Soll-Zustand als Reifegrad-Modell erarbeitet, sprich: Es wird ermittelt, in welchen Feldern Verbesserungen im Rahmen der Implementierung der IT-Strategie stattfinden.

Tab. 1 SOLL-Reifegrad der IT-Felder

Untersuchungsgegenstand	Punkte IST-Analyse	Punkte SOLL-Analyse
<i>IT-Prozesse</i>		
Projektmanagement	2	4
Demand Management	1	4
Supply Management	3	3
Service Management	2	3
Qualitätsmanagement	4	4
<i>IT-Governance, IT-Organisation und Mitarbeiter</i>		
IT-Governance Strukturen	2	3
Sourcing-Strategie	1	4
Rollen und Verantwortlichkeiten	2	4
Business-IT-Alignment	3	3
Mitarbeiterentwicklung	3	3
<i>Technologie</i>		
Architekturmanagement	4	4
IT-Sicherheit und Business Continuity Management	3	3
IT-Infrastruktur und Betrieb	3	3
Stammdatenmanagement	3	3
Softwareentwicklung	4	4
<i>Finanzen</i>		
Optimale Kostenstrukturen	3	3
IT-Controlling	2	3
Compliance	2	3

Wieder am Beispiel der Produktio weltweit GmbH wird in folgenden Feldern eine Anhebung des Ist-Zustandes gefordert (siehe Tab. 1). Diese Felder sind vor allem im Bereich der IT-Prozesse (Projektmanagement, Demand und Service Management), der IT-Governance (Governance-Strukturen, Sourcing-Strategie sowie Rollen und Verantwortlichkeiten) und im Bereich Finanzen bzgl. der Compliance und besserer IT-Controlling-Strukturen erforderlich.

Die Abb. 2 zeigt diesen Soll-Zustand beispielhaft (dunkel gekennzeichnet ist der Soll-Zustand und hell der aktuelle Ist-Zustand des Reifegrades der IT):

Warum in einigen Feldern eine 3 als Reifegrad als ausreichend betrachtet wird, wohingegen andere Felder eine 4 haben sollen, liegt an der Bemessung der Wichtigkeit im Unternehmen. Beim Beispielunternehmen ist es ja so, dass gerade im Bereich der IT-Organisation und der Prozesse noch viel zu tun ist. Da viele Applikationen veraltet sind und modernisiert bzw. neu eingeführt werden müssen und es viele Probleme mit den Providern im Outsourcing gibt, muss gerade in diesen Bereichen ein sehr guter Reifegrad erreicht werden. Daher sind die Themen Projektmanagement, Demand Management, Sourcing-Strategie sowie Rollen und Verantwortlichkeiten die Felder, an denen am meisten gearbeitet werden muss (teilweise von Reifegrad 1 auf 4).

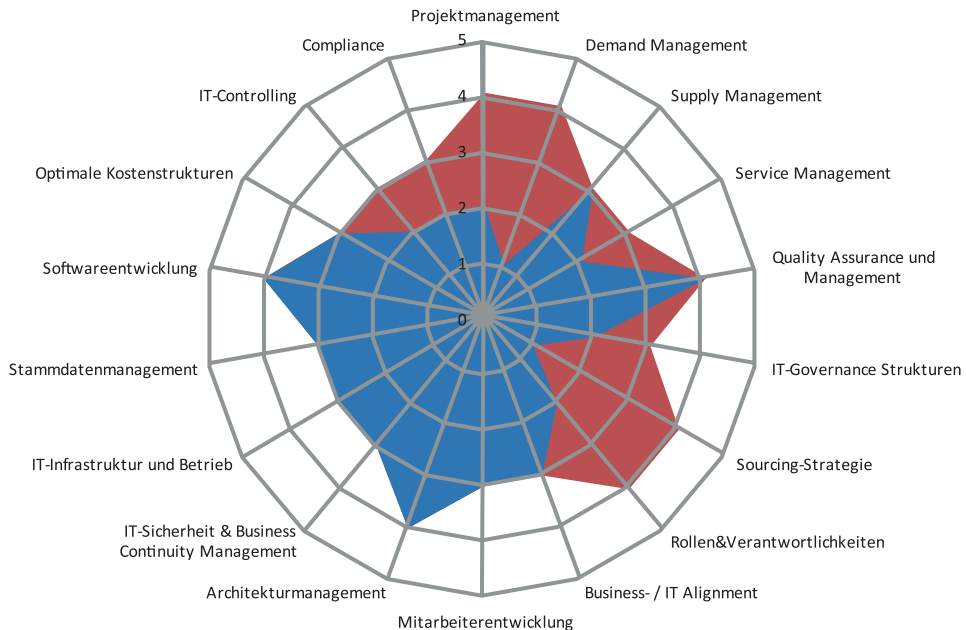


Abb. 2 Soll-Zustand des Reifegrad-Modells

Was sind nun die richtigen Maßnahmen, um den Reifegrad im SOLL zu erreichen? Dies ist je nach Untersuchungsgegenstand natürlich eine individuelle Maßnahme, die zum Unternehmen, zur Organisation und zur Ausgangssituation passen muss. Daher wird hier nur auf das Beispielunternehmen eingegangen. Für die Produktio weltweit GmbH werden die Maßnahmen, wie in Tab. 2 dargestellt, aus den genannten Problemfeldern abgeleitet. Wichtig ist hierbei zu erkennen, dass es oftmals Maßnahmen sind, die in den Schritten 3–5 sowieso schon ans Tageslicht kamen. Nun muss bei der Erstellung der IT-Roadmap darauf geachtet werden, dass Maßnahmen nicht doppelt oder mehrfach vorkommen, sondern sofort in eine Maßnahme subsummiert werden.

Maßnahmen für Schritt 2: Ableitung von Herausforderungen für die IT/IT-Vision

Schritt 2 dient der Analyse der Ausgangssituation auf Unternehmensebene. Auf den ersten Blick können wahrscheinlich nur wenige Maßnahmen direkt für die IT-Roadmap abgeleitet werden, da die hier herausgearbeiteten Herausforderungen für die IT im Idealfall direkt in die Ergebnisse der Applikations-, Sourcing- und Organisationsstrategie (Schritt 3–5) eingegangen sein sollten.

Man schaue sich aber noch einmal die herausgearbeiteten Herausforderungen aus Schritt 2 in der Tab. 3 genauer an und überlegen, welche Maßnahmen aus den erkannten Herausforderungen abzuleiten sind.

Tab. 2 Maßnahmen für Schritt bei der Produktio weltweit GmbH

Untersuchungsgegenstand	IST → SOLL Reifegrad	Maßnahme(n)
Projektmanagement	2 → 4	– Schulungen und Zertifizierungen für alle IT-Projektleiter nach z. B. GPM/IPMA oder PRINCE2 – Definition von Standardprozessen im Projektmanagement, die für alle IT-Projekte gültig sind und von einer neuen Instanz (Abtlg. Projektmanagement im Demand-Zweig) überwacht werden
Demand Management	1 → 4	– Einführung der Demand/Supply-Organisation wie in Schritt 5 schon als Maßnahme vorgesehen (Vorsicht: keine doppelten Maßnahmen ableiten, da im Folgenden noch Schritt 5 ausführlich bearbeitet wird)
Service Management	2 → 3	– Einführung von ITIL best-practice Prozessen für bestimmte Bereiche (im Rahmen der Ausgangssituation wurde erkannt, dass es insb. Probleme im Bereich der Hotline gibt, so dass mindestens die Prozesse Service Desk, Incident und Problem Management professionell eingeführt werden müssen) – Schulungen für die betroffenen IT-Mitarbeiter in ITIL (ITIL Practioner o. ä.)
IT-Governance Strukturen	2 → 3	– Hier wird wieder auf Schritt 5 verwiesen und die Ähnlichkeit zu dem Punkt „RollenundVerantwortlichkeiten“ (keine doppelten Maßnahmen ableiten)
Sourcing-Strategie	1 → 4	– Zwei Maßnahmen sind in Schritt 4 vereinbart worden, die dort ausführlich geklärt werden
Rollen und Verantwortlichkeiten	2 → 4	– siehe IT-Governance Strukturen
IT-Controlling	2 → 3	– Einführung von IT-Controlling-Strukturen (die auf Basis eines Balanced Scorecard in Schritt 7 noch ausführlich vorgestellt werden) – Aufbau einer IT-Controlling-Organisation im Demand-Zweig wie in Schritt 5 dargestellt
Compliance	2 → 3	– Eine Compliance-gerechte IT-Organisation ist aus Haftungs-Sicht insbesondere auch für die Unternehmensleitung von großer Bedeutung. Für die Produktio weltweit GmbH wird aufgrund des fehlenden internen Know-hows eine spezialisierte Beratungsfirma beauftragt, die entsprechende Compliance-konforme Standards implementieren soll

Tab. 3 Maßnahmen aus Schritt 2

Herausforderungen, die in Schritt 2 erarbeitet wurden	Maßnahmen, die daraus abgeleitet werden
Auslandsstandorte: Bessere Einbindung, Harmonisierung Prozesse und Systeme, besserer Service	Die „bessere Einbindung der Auslandsstandorte“ hört sich zunächst eher nach einem organisatorischen Thema an, welches durch die Einführung der Demand/Supply-Struktur in Schritt 5 behoben wird; konkret geht es darum, dass die Auslandsstandorte einen Demand-Manager haben, der die Anforderungen des Auslandsstandortes explizit entgegennimmt und dafür sorgt, dass auf der einen Seite verstanden wird, was die Auslandsstandorte an IT-Leistungen benötigen, dies im Demand/CIO-Office einbringt und damit auch in die Standards im Supply einfließen lässt mit dem Ziel, dass die Auslandsstandorte Standard-IT-Leistungen erhalten, die an ihre entsprechende Spezifika angepasst werden
	Die „Harmonisierung der Prozesse und Systeme“ in den Auslandsstandorten schließt sich diesem Thema Standards an, die durch den Demand Manager geschaffen werden müssen unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen des Auslandsstandortes
	Das Thema „besserer Service in den Auslandsstandorten“ geht in die gleiche Richtung; dahinter steckt der implizite Vorwurf, dass aktuell nur Standards ohne konkretes Eingehen auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Auslandsstandorte geliefert werden. Deshalb gibt es aktuell einen großen Anteil von „Schatten-IT“ in den Auslandsstandorten, da deren Anforderungen nicht „abgeholt“ wurden
Mehr und besser qualifiziertes Personal inhouse nötig, evtl. auch In-Sourcing von bestimmten IT-Leistungen	Dieser Punkt kann also durch die Einführung eines Demand-Managers pro Auslandsstandort gelöst werden
	Hier geht es um die bessere Qualifikation des IT-Personals im Hinblick auf die IT-Unterstützung der sehr modernen Produkte der Produktio weltweit GmbH; hier geht es um die Entwicklung von Apps oder die inhouse-Entwicklung von Portaltechnologien, die neue Programmiersprachen erfordern, welche heute nicht vom aktuellen Personal abgedeckt werden
Individuellere IT-Lösungen für innovative Produkte nötig	Hier spielen die Themen „Innovationsstrategie“ und „Personalstrategie“ eine große Rolle. Das heißt, dass im Rahmen der Bedarfs- oder Lückenanalyse (siehe Abschn. 6.3.2) die benötigten Stellen definiert werden müssen, um diese durch externen Einkauf oder die Einstellung von qualifiziertem Personal zu besetzen
	Dies muss in Rahmen des Applikationsportfolios detailliert in Schritt 3 geklärt werden

Tab. 3 (Fortsetzung)

Herausforderungen, die in Schritt 2 erarbeitet wurden	Maßnahmen, die daraus abgeleitet werden
Standardisierung/Automatisierung bei Finanzen, Personal, Controlling (SEPA, elektr. Archivierung, Management Cockpit)	Dies sind alles Hinweise auf notwendige Software-Einführungen, welche in Abschn. 4.3 detailliert beschrieben werden müssen. Daher hier nur der Hinweis, dass im folgenden Maßnahmenpaket 3 darauf geachtet wird, dass diese Standardisierungs- und Automatisierungsvorhaben nicht vergessen werden
IT-Kosten prüfen und transparenter machen, um Einsparungen zu verhindern	Es ist großer Druck entstanden durch den neuen Vorgesetzten, der die IT-Kosten senken möchte; es ist daher notwendig, dass in einem ersten Schritt die IT-Kosten transparent gemacht werden, um überhaupt zu verstehen, für was das Geld ausgegeben wird und um mögliche Kostentreiber zu erkennen. Hilfreich wäre die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung für die IT sowie ein IT-Controlling. Darüber hinaus wird im Rahmen der Einführung von Demand/ Supply im Demand-Zweig das IT-Controlling etabliert mit Business Cases und Wirtschaftlichkeitsrechnungen pro Projekt. Dies sollte als Maßnahme auf jeden Fall in die Roadmap aufgenommen werden

Es bleiben folgende Maßnahmen aus Schritt 2 festzuhalten, die in die Roadmap übernommen werden müssen:

- Für jeden Auslandsstandort ist ein Demand Manager einzuplanen
- Durch die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie die Etablierung eines professionellen IT-Controllings im Demand-Zweig, werden die IT-Kosten transparenter gemacht (evtl. Einstellung von 1 oder 2 IT-Controllern oder Umbesetzungen nötig im Rahmen der Bedarfsanalyse).

Maßnahmen für Schritt 3: IT-Applikationsstrategie/Applikations-Roadmap

Aus Schritt 3 können direkt aus der Applikations-Roadmap (siehe Abb. 4.6) die Maßnahmen und Projekte in die IT-Roadmap übernommen werden (Hinweis: Der Unterschied zwischen Applikations-Roadmap und IT-Roadmap besteht darin, dass in der IT-Roadmap nicht nur die Projekte zu den Applikationsanpassungen oder Neueinführungen berücksichtigt werden, sondern alle IT-Maßnahmen und Vorhaben so zum Beispiel auch Organisationsumgestaltungen, Ausschreibungen für das Outsourcing, neue Governancemethoden oder die Einführung von ITIL, etc.).

Maßnahmen für Schritt 4: IT-Sourcing

Als Grundlage für die Ableitung von Maßnahmen aus Schritt 4 dient die Abb. 5.8, Dort werden alle aktuellen Outsourcingprojekte der Produktio weltweit GmbH aufgeführt und mit Schulnoten bewertet. Im Anschluss daran wurden zwei aktuelle Outsourcingprojekte

mit Hilfe einer SWOT-Analyse genauer unter die Lupe genommen, nämlich das Outsourcing des Rechenzentrums sowie die SAP-Unterstützung.

Maßnahmen aus dem aktuellen SAP-Outsourcing (entnommen der Beschreibung in Schritt 4):

- Ein guter Kompromiss könnte darin bestehen, die für Produktio weltweit wichtigen und wertschöpfenden Prozesse zu erkennen, die durch SAP unterstützt werden. Für diese Prozesse muss das Know-how unbedingt vom Provider zur internen IT übergehen. Das wäre in diesem Falle SAP WM und evtl. MM, zumal hier die Integration der Access-Funktionalität ansteht. Dann sollte überlegt werden, welche Prozesse oder Weiterentwicklungen für das Unternehmen sehr wichtig sind. Dies ist auf jeden Fall die Integration der Auslandsstandorte, welche hauptsächlich intern geschehen sollte, im Sinne einer Führung und Projektleitung durch internes Personal.
 - Das Know-how für wertschöpfende Kernprozesse im SAP muss vom Provider auf die interne IT-Organisation von Produktio weltweit übergehen
 - Die Betreuung der Auslandsstandorte geschieht nicht mehr durch den Provider, sondern durch interne IT-Projektleiter bzw. Demand Manager
- Ein letzter Punkt, der nicht direkt mit dem Provider zusammenhängt, aber durch das Outsourcing sehr deutlich wurde, ist die Verantwortlichkeit des Fachbereichs für die Prozesse. Es gibt heute noch keine klare Prozessverantwortlichkeit im Unternehmen. Diese muss durch neue Rollen klar definiert werden.
 - Die Klärung der Verantwortlichkeit für das Prozessmanagement im Unternehmen

Maßnahmen aus dem Rechenzentrum-Outsourcing:

- Eine Lösung kann so aussehen, dass eine neue Ausschreibung gemacht wird, welche die in der SWOT-Analyse herausgefundenen Schwächen und Risiken fokussiert. In diesem Rahmen könnte der aktuelle Provider eine neue Chance auf Basis anderer Voraussetzungen bekommen. Es kann aber auch tatsächlich ein neuer Provider zum Zuge kommen, der alle oben genannten Schwächen und Risiken nicht mitbringt.
 - neue Ausschreibung mit Fokus auf die in der SWOT-Analyse erkannten Probleme

Maßnahmen für Schritt 5: IT-Organisation/IT-Governance

Viele der bereits erkannten Maßnahmen sind organisatorischer Natur und entsprechen daher diesem Schritt 5. Durch die Einführung der in diesem Schritt vorgenommenen Demand/Supply-Struktur für die Produktio weltweit GmbH werden viele der genannten Probleme gelöst.

Daher an dieser Stelle noch einmal zusammengefasst die Details im Rahmen der Demand/Supply-Einführung, die die Maßnahmen aus den vorherigen Schritten beinhalten:

- Pro Auslandsstandort gibt es einen Demand Manager (Schritt 2 sowie auch Schritt 4), der sich explizit um die Belange und Anforderungen der Auslandsstandorte kümmert

und diese im Headquarter einbringt. So sorgt er dafür, dass die Auslandsstandorte mit Standard-IT versorgt werden, die im Einzelfall an spezifische Bedürfnisse angepasst wird.

- Die Verantwortlichkeit für das Prozessmanagement bedarf der Klärung (ob dieses in der Demand-IT oder im Fachbereich eingegliedert werden soll).
- Eine ausführliche Bedarfsanalyse, wie in Schritt 5 dargestellt, ist für die Produktion weltweit GmbH nötig, um genau bestimmen zu können, wie die IT-Stellen im Demand- und Supply-Zweig dargestellt werden, wo noch Bedarf ist, der durch Neueinstellungen oder Berater/Provider gedeckt werden muss und wo Stellen und Personen getauscht oder ersetzt werden müssen (aus Schritt 1 und Schritt 2).
- Rollen und Verantwortlichkeiten müssen im Rahmen der Demand/Supply-Einführung genau geklärt, definiert und untereinander abgegrenzt werden.

Ableitung der Maßnahmen in eine IT-Roadmap

Jetzt müssen alle gerade genannten Maßnahmen geclustert, zusammengefasst, Verdopplungen erkannt und gestrichen und dann in eine Roadmap gebracht werden. Wichtig ist, dass im Anschluss daran für jede Maßnahme genau ein Verantwortlicher benannt und ein konkreter Zeitpunkt für die Fertigstellung der Maßnahme festgelegt wird.

Die Maßnahmen sind grafisch in Abb. 3 dargestellt und zeigen in diesem Rahmen auch den zeitlichen Ablauf. Zur besseren Übersicht sind die Maßnahmen zu Paketen oder Clustern zusammengefasst worden und farblich gekennzeichnet; so sind alle applikatorischen Maßnahmen hellgrau, alle organisatorischen Maßnahmen dunkelgrau eingefärbt. Es werden so auch die Abhängigkeiten innerhalb der applikatorischen oder organisatorischen Maßnahmen als auch untereinander deutlich. So sieht man sehr deutlich die Maßnahmen bzgl. SAP, die auch organisatorisch die Ausschreibung der SAP-Betreuung benötigen, die voran gestellt wird. Auch die Einführung des Dokumentenmanagementsystems hat eine Abhängigkeit zu den IT-Compliance-Themen, was die Ablage von Dokumenten angeht (hier nicht nur reine IT-Compliance, sondern generell das Thema Compliance im Unternehmen, die eng miteinander verbunden sind). Auch innerhalb der organisatorischen Maßnahmen bzgl. der Demand/Supply-Einführung wird deutlich, dass es einige zeitliche Abhängigkeiten gibt. So muss als erstes die Personalstrategie durchgeführt werden, bevor über Rollen und Verantwortlichkeiten nachgedacht werden kann. Auch die Personalentwicklung macht erst Sinn, wenn die Strategie und die Rollen und Verantwortlichkeiten klar definiert sind. Die Einführung der Demand/Supply-Struktur ist ein parallel laufender Prozess, der aus all den genannten Maßnahmen befruchtet wird.

Ohne auf die zeitliche Komponente zu achten, sind die Maßnahmen der Übersichtlichkeit halber hier noch einmal zusammengefasst:

- Einführung Demand/Supply-Struktur (wie oben beschrieben)
- Ausführliche Bedarfs- und Lückenanalyse

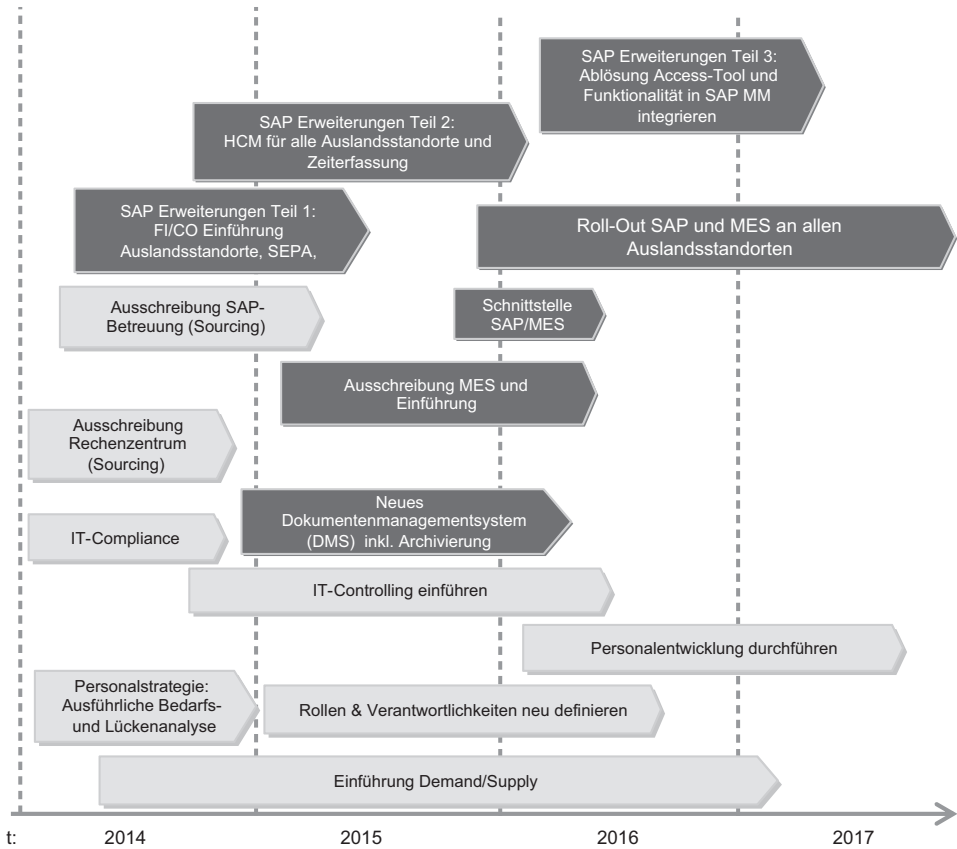


Abb. 3 Roadmap (Zusammenfassung der Maßnahmen für die Produktion weltweit GmbH)

- Rollen- und Verantwortlichkeiten definieren, abgrenzen und kommunizieren
- IT-Controlling einführen inkl. Kosten- und Leistungsrechnung für die IT und Transparenz für die IT-Kosten schaffen
- IT-Compliance herstellen unter Zuhilfenahme von externen Experten
- Personalentwicklungen
 - Schulungen für IT-Projektmanager
 - Projektmanagementstandards definieren, einführen und kommunizieren
 - ITIL-best practice Standards einführen
- Neue Ausschreibung für das Rechenzentrum mit Fokus auf die in der SWOT-Analyse erkannten Probleme
- Im Rahmen des SAP-Outsourcing das Know-how für die wertschöpfenden Prozesse wieder insourcen, das heißt: an die interne IT-Organisation zurückgeben. Des Weiteren einen Demand Manager pro Auslandsstandort etablieren
- Applikations-Roadmap in die Gesamt-Roadmap übernehmen

- SAP Erweiterungen Teil 1
- SAP Erweiterungen Teil 2
- SAP Erweiterungen Teil 3
- Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) inkl. Archivierung
- Ausschreibung neues MES (Manufacturing Execution System) und Einführung, um die in Schritt 2 erkannten Probleme bei der Innovationsgeschwindigkeit und Unterstützung von neuen Produkten der Produktion zu lösen
- Schnittstelle SAP/MES etablieren
- Roll-Out SAP und MES an allen Auslandsstandorten

Ermittlung des notwendigen IT-Budgets

Das wichtigste Kernelement zur Umsetzung der IT-Strategie liegt in der Ermittlung und vor allem in der Bewilligung der dafür notwendigen Investitionen durch die Geschäftsleitung.

Um die für die Umsetzung der IT-Strategie notwendigen Investitionen bewilligt zu bekommen, werden folgende Aufstellungen benötigt:

1. IT-Investitionsübersicht (Ermittlung der Kosten für die notwendigen IT-Projekte aus der IT-Roadmap)
2. IT-Kostenentwicklung für die kommenden fünf Jahre (evtl. auf Basis von Szenarien)
3. Potenziale für Einsparungen durch die Projekte aus der IT-Strategie

IT-Investitionsübersicht

Zu jeder gerade festgelegten Maßnahme aus der IT-Roadmap muss jetzt eine Kostenkalkulation erfolgen mit anschließender Kostenschätzung pro Maßnahme bzw. IT-Projekt, wie es in Tab. 4 für das Beispielunternehmen Produktio weltweit GmbH dargestellt ist. Es ist zu beachten, dass alle hier genannten Kosten fiktive Zahlen sind, die nicht der Realität entsprechen müssen.

Es ergeben sich als Gesamtsumme insgesamt ca. 3,18 Mio. € für die Umsetzung der IT-Strategie der Produktio weltweit GmbH (wie gesagt: Es handelt sich um fiktive, beispielhafte Zahlen). Nicht alle Projekte finden in einem Jahr statt, sondern erstrecken sich über mehrere Jahre, wie die gerade erstellte Roadmap gezeigt hat. Dieses Budget muss jetzt von der Unternehmensleitung freigegeben werden und dabei ergeben sich natürlich viele Fragen.

Tab. 4 Maßnahmen aus der Roadmap mit Kostenschätzung

Maßnahmen aus der Roadmap	Kostenkalkulation	Kosten-schätzung
Einführung Demand/Supply-Struktur (wie oben beschrieben)	Projektdauer = 1,5 Jahre = 18 Monate (inklusive aller Auslandsstandorte, Schulungen, neuen Gremien, Rollen und Suche sowie Einphasung neuer Mitarbeiter)	835 T€
Besonderheiten: – Pro Auslandsstandort einen Demand Manager (Schritt 2 sowie auch Schritt 4), der sich explizit um die Belange und Anforderungen der Auslandsstandorte kümmert und diese im Headquarter einbringt und so dafür sorgt, dass auf der einen Seite die Auslandsstandorte mit Standard-IT versorgt werden, die aber im Einzelfall an spezifische Bedürfnisse angepasst wird – Klärung der Verantwortlichkeit für das Prozessmanagement (in der Demand-IT oder im Fachbereich?) – Rollen- und Verantwortlichkeiten definieren, abgrenzen und kommunizieren	3 Berater, wobei 1 Berater Vollzeit (auf Basis von 13 Monaten Mischkalkulation) und 2 Berater Teilzeit agieren auf Tagessatzbasis von 1300 €	15.000 € + 160.000 € = 175.000 €
	13 × 20 × 1 × 1300 = 338.000 €	
	13 × 10 × 2 × 1300 = 338.000 €	
	Insgesamt ca. 675T €	
	Suche und Einstellung neuer Mitarbeiter	
	Annahme: 4 neue Mitarbeiter = 40.000 € pro Mitarbeiter für die Suche und Einstellung (Mischkalkulation)	
Ausführliche Bedarfs- und Lückenanalyse	4 × 40.000 = 160.000 €	15.000 € + 160.000 € = 175.000 €
	Gesamtkosten = 835 T€	
	Die eigentliche Bedarfs- und Lückenanalyse kann intern durchgeführt werden unter Zuhilfenahme eines externen Beraters mit ca. 15 Personentagen à 1000 €	
	Fraglich ist in diesem Stadium, wie viele Neueinstellungen oder Abfindungen als Ergebnis dieser Analyse herauskommen. (Schätzung auf Basis der aktuell 40 IT-Mitarbeiter ca. 10 % = 4 Mitarbeiter neu einstellen (ca. 20.000 € Personalwerbungskosten pro MA = 80.000 € und 4 Mitarbeiter abfinden (ca. 20.000 € pro Mitarbeiter = 80.000 €))	

Maßnahmen aus der Roadmap	Kostenkalkulation	Kosten-schätzung
		50 T€ + 64 T€ = 114 T€
IT-Controlling einführen inkl. Kosten- und Leistungsrechnung für die IT und Transparenz für die IT-Kosten schaffen	Einstellung von 2 neuen Mitarbeitern (Leitung IT-Controlling mit Erfahrung und ein Mitarbeiter für Kosten- und Leistungsrechnung) Anwerben und Einstellung von 2 neuen Mitarbeitern ca. 50.000 €	
	Schaffung der Strukturen für ein IT-Controlling und Schaffung von Transparenz bei den IT-Kosten (2 Berater mit insgesamt 80 Personentagen á 900 € = 64.000 €)	
IT-Compliance herstellen unter Zuhilfenahme von externen Experten	2 Berater mit insg. 60 Personentagen á 1200 € = 72.000 €	72 T€
	– 5 IT-Projektleiter + 5 Demand Manager für Projektleiterschulungen (ca. 12.000 € pro Teilnehmer) = 120.000 €	120T € + 216T € + 142,5T € = 478,5T €
	Zur Definition, Standardisierung und Einführung von Projektmanagementstandards werden 2 Berater mit insg. 180 Personentagen eingekauft á 1200 € = 216.000 €	
	Einführung von ITIL best practice Standards: Dies wird gemeinsam mit dem neuen Provider des Rechenzentrums gestartet, der dafür 150 Personentage á 950 € berechnet = 142.500 €	
Neue Ausschreibung für das Rechenzentrum mit Fokus auf den in der SWOT-Analyse erkannten Problemen	Für die 5 Phasen der Ausschreibung (siehe Abschn. 5.5) werden 2 Berater mit insg. 100 Personentagen engagiert á 1200 € = 120T€	120 T€ + 300 T€ = 420 T€
	Die Transformations- und Transitionskosten werden mit ca. 300 T€ kalkuliert	
		(Fortsetzung)

Tab. 4 (Fortsetzung)

Maßnahmen aus der Roadmap	Kostenkalkulation	Kosten-schätzung
Im Rahmen des SAP-Outsourcings das Know-how für die wertschöpfenden Prozesse wieder insourcen, sprich an die interne IT-Organisation zurückgeben. Des Weiteren ein Demand Manager pro Auslandsstandort etablieren	Aktuell arbeiten im Schnitt 3 Berater des SAP-Providers pro Monat jeweils 12 Personentage á 1.100 € = 3×12×1100 = 39.600 € pro Monat. Das heißt, diese Summe von knapp 40 T€ könnte eingespart werden, allerdings muss das Know-how intern erst aufgebaut werden. Dazu sind Schulungen nötig, die für 5 Mitarbeiter ca. 3000 € × 5 = 15.000 € kosten werden. Die Übergangsleistungen des ehemaligen Providers belaufen sich anstatt auf ca. 40 T€ auf ca. 20 T€ für 6 Monate und gehen dann in den kommenden 6 Monaten auf 0 €	Einspar-potenzial s. linke Spalte
	Einsparungen im ersten Jahr = 20 T€×6 + 30 T€×6q = 300 T€ abzgl. Schulungen = 285 T€	
	Im zweiten Jahr = 40 T€ × 12 = 480 T€	
	Die Projektlaufzeit beträgt 8 Monate (inkl. Schulung und Einweisung der internen MA) Es werden 3 Berater benötigt á 1000 € pro Tag; 8 × 20 × 3 × 1000 = 480.000 €	
SAP Erweiterungen Teil 1: Einführung FI/CO	Die Projektlaufzeit beträgt 9 Monate für 2 Auslandsstandorte (inkl. Schulung und Einweisung der betroffenen MA) Es werden 2 Berater benötigt (Rest erfolgt intern) á 1200 € pro Tag 9 × 20 × 2 × 1200 = 432.000 €	480.000 €
		432.000 €
SAP Erweiterungen Teil 2: Einführung SAP in Auslandsstandorten		

Maßnahmen aus der Roadmap	Kostenkalkulation	Kosten-schätzung
SAP Erweiterungen Teil 3: Einführung SEPA	Die SEPA-Einführung wird intern durchgeführt und von einem Berater auf Teilzeit-Basis begleitet: Projektlaufzeit: 4 Monate; 10 Tage pro Monat auf Basis 800 € pro Tag (die Schulungen und Einweisungen sind inkludiert) $4 \times 10 \times 1 \times 800 = 32.000 \text{ €}$	32.000 €
Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) inkl. Archivierung	Hier muss zunächst eine Ausschreibung zur Auswahl der richtigen Software erfolgen und die betroffenen Prozesse der Automatisierung durch das DMS müssen definiert werden (inhouse und evtl. mit Unterstützung von Beratern). Daher aktuell keine konkrete Budgetplanung möglich	Aktuell nicht möglich
Ausschreibung neues MES (Manufacturing Execution System) und Einführung, um die in Schritt 2 erkannten Probleme bei der Innovationsgeschwindigkeit und Unterstützung von neuen Produkten der Produktion zu lösen	Hier können aktuell nur die Ausschreibungskosten kalkuliert werden; die Hauptaufgaben werden intern durchgeführt mit Unterstützung eines Experten, der für 3 Monate á ca. 10 Manntage pro Monat für 1200 € pro Tag unterstützt: $3 \times 10 \times 1 \times 1200 = 36.000 \text{ €}$	36.000 €
Schnittstelle SAP/MES etablieren	Projektkosten und -dauer nicht abschätzbar, da das MES zunächst ausgeschrieben und ausgewählt werden muss (s. o.)	
Roll-Out SAP und MES an allen Auslandsstandorten	Projektkosten und -dauer nicht abschätzbar, da das MES zunächst ausgeschrieben und ausgewählt werden muss (s. o.)	
Kosten für die Erstellung der IT-Strategie (externer Moderator und Berater)	Projektdauer: 4 Monate 15 Tage pro Monat á 1800 € pro Tag $4 \times 15 \times 1 \times 1800 = 108.000 \text{ €}$	108.000 €

Potenziale und Synergien der Maßnahmen ermitteln

Die entscheidende Frage ist, warum die Maßnahme oder das Projekt durchgeführt werden sollte, sprich:

- Was erhofft man sich davon?
- Was ist danach besser oder effizienter?
- Dient die jeweilige Maßnahme den Rendite-Zielen des Unternehmens?
- Kann diese Verbesserung quantifiziert werden in Form von Einsparungen?

Das einzige Projekt der oben genannten, welches auf den ersten Blick Einsparungen einführt, ist das Insourcing der SAP-Unterstützung. Im ersten Jahr können hier ca. 300.000 € und ca. 400.000 € ab dem zweiten Jahr gegenüber dem aktuellen Stand eingespart werden. Jetzt ist die spannende Frage, wo weitere Einsparungen aufgrund der IT-Strategie hinsichtlich des größeren Standardisierungsgrades, effizienterer Prozesse, besserer Zusammenarbeit mit dem Fachbereich zu finden sind.

Die Tab. 5 zeigt die Überlegungen zu Einsparpotenzialen pro Projekt/Maßnahme auf und versucht – falls möglich – diese Einsparpotenziale zu quantifizieren. Es fällt allerdings auf, dass einige Projekte keine direkten Einsparungen verursachen, dafür aber Effizienzgewinne oder Synergien schaffen, die schwer quantifizierbar sind. In solchen Fällen muss vom Top-Management entschieden werden, inwieweit solche Effizienzgewinne oder Synergien ihren Einsatz, sprich das dafür notwendige Budget, wert sind. Wichtig ist dabei, dass in Spalte 3 die tatsächlichen Vorteile, Synergien oder Effizienzgewinne, die durch diese Maßnahme erreicht werden, konkret dargestellt werden. Denn das ist die Entscheidungsgrundlage für das Top-Management zur Freigabe der Maßnahme oder des Projektes.

Maßgeblich ist schlussendlich für das Top-Management die Frage: „Welches sind die richtigen Investitionen in IT, um zu einer höheren Rendite des Gesamtunternehmens zu gelangen und welche Investitionen in IT sind eher zu vernachlässigen?“. Dazu ist bewusst die Spalte 5 eingefügt worden, um ein klares „JA“ oder „NEIN“ zu jeder Maßnahme zu bekommen (Titel der Spalte: „[Die Maßnahme] Erzeugt genügend Mehrwert und entspricht dem Renditeziel des Unternehmens“).

Die Spalte für die Einsparpotenziale in der Tab. 5 zeigt sehr deutlich, dass man sich mit quantifizierten Zahlen sehr schwer tun kann. Es gibt zwei Möglichkeiten diesem Problem entgegenzutreten:

- Entweder man lässt Einsparungsberechnungen komplett weg und entscheidet auf Basis der Potenziale pro Maßnahme oder
- Es werden Soll-Einsparwerte vor Projektbeginn festgelegt. Dann kann pro Projekt das Ziel in Form von Soll-Werten angenommen werden und es gibt eine klare Ziellinie für die Umsetzung der IT-Strategie.

Tab. 5 Einsparpotenziale pro Projekt/Maßnahme

Projekt/Maßnahme	Kosten (in T€)	Potenziale für Einsparungen bzw. Vorteile/ Synergien/Effizienzeffekte	Einsparungen quantifiziert	Erzeugt genügend Mehrwert und entspricht dem Renditeziel des Unternehmens
Einführung Demand/ Supply-Struktur	835	Potenziale für Einsparungen bzw. Vorteile/ Synergien/Effizienzeffekte – Business-IT-Alignment: IT-Leistungen können klar und nachvollziehbar aus den geschäftlichen Anforderungen hergeleitet werden. Für IT-Leistungen kann ein Business Case gerechnet werden – Trennung von IT-Nachfrage und IT-Angebot: Durch Trennung von Nachfrage und Angebot ist der Interessenkonflikt zwischen bestmöglicher individueller IT-Lösung und kostensenkender Standardisierung lösbar – Skills der Mitarbeiter: Die übergreifende, ganzheitliche Kenntnis über das Geschäft und die Prozesse des Unternehmens liegt nicht mehr nur im Fachbereich, sondern auch im Demand- und Supply-Zweig. Sie können die Nachfrage formulieren und konsolidieren sowie interne Ressourcen und externe Dienstleister inhaltlich steuern – Transparenz bzgl. Kosten, Leistungen und Aufgaben – Effizienzverbesserung durch kürzere Entscheidungswege und klare Verantwortlichkeiten – Mitarbeitermotivation durch klarere Aufgaben- und Rollendefinitionen sowie bessere Abgrenzung zu den Aufgaben der Fachbereiche	Schwer möglich zum aktuellen Zeitpunkt	JA

(Fortsetzung)

Tab. 5 (Fortsetzung)

	Kosten (in T€)	Potenziale für Einsparungen bzw. Vorteile/ Synergien/Effizienzeffekte	Einsparungen quantifiziert	Erzeugt genügend Mehrwert und entspricht dem Renditeziel des Unternehmens
Projekt/Maßnahme Ausführliche Bedarfs- und Lückenanalyse	175	– Effizienzgewinne durch Versetzungen derjenigen Mitarbeiter auf die für sie und das Unternehmen am besten passende Stelle – Alle Stellen sind optimal besetzt, was dazu führen kann, dass einige Stellen wegfallen oder sich Synergien zwischen Stellen ergeben, die bisher nicht erkannt wurden	Potentielle Mitarbeiter einsparungen sind möglich (aktuell noch nicht schätzbar)	JA
IT-Controlling einführen inkl. Kosten- und Leistungsrechnung für die IT und Transparenz für die IT-Kosten schaffen	114	– Schaffung von Transparenz bzgl. der IT-Kosten und insb. Projekt- und Service Management Kosten – Dadurch werden Potenziale ersichtlich, die heute nicht erkannt werden können – Dadurch sind Kostenreduzierungen möglich oder Synergien werden erkannt	Kostenreduzierungen heute schwer vorherzusagen	JA
IT-Compliance herstellen unter Zuhilfenahme von externen Experten	72	– Sicherstellen, dass mögliche Folgekosten ausgeschlossen werden können – Wie viel ist einem Unternehmen Informationssicherheit, Datenschutz und ständige Verfügbarkeit von Daten wert?	Sicherstellung, dass Folgekosten ausgeschlossen werden können	JA
Personalentwicklungen – Schulungen für IT-Projektmanager – Projektmanagementstandards definieren, einführen und kommunizieren – ITIL-best practice Standards einführen	478,5	– Effizienzverbesserungen in der internen IT und in der Zusammenarbeit mit den Fachbereichen – Schnelleres Time-to-Market bei vielen IT-Leistungen möglich – IT-Leistungen können inhouse erbracht werden und müssen nicht von externen Beratern eingekauft werden	Effizienzthema	JA

Projekt/Maßnahme	Kosten (in T€)	Potenziale für Einsparungen bzw. Vorteile/ Synergien/Effizienzeffekte	Einsparungen quantifiziert	Erzeugt genügend Mehrwert und entspricht dem Renditeziel des Unternehmens
Neue Ausschreibung für das Rechenzentrum mit Fokus auf den in der SWOT-Analyse erkannten Problemen	420	– Tatsächliches Einsparpotenzial durch neue Ausschreibung gegeben; die Höhe ist schwer kalkulierbar und hängt von der Neudefinition der Service Level und des Leistungskatalogs ab; bei gleichem Leistungskatalog und gleichen Service Levels, aber besserer Performance des Providers können Change Request-Kosten gespart werden; Annahme hier: 20 % Einsparung =	250 T€	JA
Im Rahmen des SAP-Outsourcings das Know-how für die wertschöpfenden Prozesse wieder insourcen, sprich andie interne IT-Organisation zurückgeben. Des Weiteren ein Demand Manager pro Auslandsstandort etablieren	Einsparpotenzial s. linke Spalte	Kalkulation siehe Tab. 11: Einsparungen im ersten Jahr = $20\text{ T€} \times 6 + 30\text{ T€} \times 6 = 300\text{ T€}$ abzgl. Schulungen = 285 T€	285 T€ im ersten Jahr	JA
		Im zweiten Jahr = $40\text{ T€} \times 12 = 480\text{ T€}$	480 T€ ab dem zweiten Jahr	
SAP Erweiterungen Teil 1: Einführung FI/CO	480	– Die heutige Buchführung ist an einen Steuerberater ausgelagert; die Kosten belaufen sich pro Jahr auf ca. 250.000 €. Diese Kosten können eingespart werden	250 T€ pro Jahr	JA

(Fortsetzung)

Tab. 5 (Fortsetzung)

Projekt/Maßnahme	Kosten (in T€)	Potenziale für Einsparungen bzw. Vorteile/ Synergien/Effizienzeffekte	Einsparungen quantifiziert	Erzeugt genügend Mehrwert und entspricht dem Renditeziel des Unternehmens
SAP Erweiterungen Teil 2: Einführung SAP in Auslandsstandorten	433	– Die Buchhaltung wird von lokalen Mitarbeitern per Excel selbst gemacht – Die Produktions- und Logistikprozesse sind zum großen Teil noch nicht IT-gesteuert; hier sind Personaleinsparungen möglich (ca. 5 FTE bei 2 Auslandsstandorten = 10 FTE); d. h. 10 FTE × 2000 € im Monat = ca. 240.000 € Einsparungen im Jahr	240 T€ Einsparung im Jahr	JA
SAP Erweiterungen Teil 3: Einführung SEPA	32	– Die europaweit normierte BLZ und Kontonummer (SEPA) sind eine gesetzliche Anforderung und müssen eingeführt werden	Effizienzthema	JA
Einführung eines Dokumentenmanagement- systems (DMS) inkl. Archivierung	Aktuell nicht möglich	– Durch ein DMS können viele Vorteile geschaffen werden, die im Folgenden aufgeführt werden: – Schnellerer Zugriff auf Informationen – Beschleunigung der Geschäftsprozesse – Mehr Transparenz in allen Aktenvorgängen – Verbesserte Qualität der Vorgangsbearbeitung – Keine Verteilerkopien mehr notwendig – Verbesserte Dokumentensicherheit, weniger Dokumentenverlust – Kostenreduktion bei wachsendem Geschäftsvolumen (Skalierbarkeit) – Geringerer Platzbedarf – Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und vereinbarter Compliance-Anforderungen	Effizienzthema	JA

Projekt/Maßnahme	Kosten (in T€)	Potenziale für Einsparungen bzw. Vorteile/ Synergien/Effizienzeffekte	Einsparungen quantifiziert	Erzeugt genügend Mehrwert und entspricht dem Renditeziel des Unternehmens
Ausschreibung neues MES (Manufacturing Execution System) und Einführung (Schritt 2)	36	Potenziale für Einsparungen bzw. Vorteile/ Synergien/Effizienzeffekte – Das neue MES wird vor allem die Innovationsgeschwindigkeit (Steigerung der Produktivität) in der Produktion erhöhen und kann die neuen Produkte der Produktio weltweit besser unterstützen. Weitere Vorteile sind: – Verkürzung der Durchlaufzeiten, – Bessere Rückverfolgbarkeit von Produkten und Bauteile, – Erzielung einer höheren Termintreue, – Leichteres Vorgehen im Fall von Rückrufaktionen fehlerhafter Produkte oder Bauteile, – Bessere Auslastung der Produktionskapazitäten, – Erfassung und Übermittlung von Daten in Echtzeit, die auch für andere Fachbereiche wichtige Informationen liefern	Effizienzthema	JA
Schnittstelle SAP/MES etablieren	Aktuell nicht möglich	– Direkte Daten- und Informationsweitergabe zwischen den Systemen ohne manuelle Datenübertragung. Dadurch keine Fehler bei der Übertragung der Daten mehr; schnellere und zuverlässigere Datentransfers	Effizienzthema	JA
(Fortsetzung)				

Tab. 5 (Fortsetzung)

Projekt/Maßnahme	Kosten (in T€)	Potenziale für Einsparungen bzw. Vorteile/ Synergien/Effizienzeffekte	Einsparungen quantifiziert	Erzeugt genügend Mehrwert und entspricht dem Renditeziel des Unternehmens
Roll-Out SAP und MES an allen Auslandsstandorten	Aktuell nicht möglich	Potenziale für Einsparungen bzw. Vorteile/ Synergien/Effizienzeffekte – Gleiche Standardprozesse in allen Werken; dadurch wesentlich mehr Transparenz, weniger Fehleranfälligkeit, höhere Qualität, bessere Produktivität, einmalige Änderung von neuen Anforderungen, Change Requests und Fehlerbehebungen anstatt in mehreren Systemen	Effizienzthema	JA
Kosten für die Erstellung der IT-Strategie (externer Moderator und Berater)	108	– Experten-Know-how für die Entwicklung der Strategie – Prozesswissen bei der Durchführung von Workshops – Neutralität bei Analysen, Entscheidungsvorlagen	Effizienzthema	JA

Generell können nach der Top-Management-Entscheidung in der letzten Spalte der Tab. 5 jetzt Projekte aufgesetzt werden. Wie jetzt mit diesen Projekten im Laufe ihrer Abwicklung und Umsetzung verfahren wird, kann am besten auf Basis des im Folgenden dargestellten IT-Projektportfolios entschieden werden.

Das IT-Projektportfolio

Das IT-Projektportfolio beinhaltet alle aktuell laufenden und geplanten IT-Projekte eines Unternehmens oder einer Division bzw. Geschäftseinheit. Es dient der Analyse, Steuerung und Führung auf Basis von monetären und/oder strategischen Gesichtspunkten.

Projektportfolios haben sich zu einem der wesentlichen Steuerungsinstrumente des IT-Managements entwickelt. Das beweisen folgende Zahlen sehr anschaulich (nach [36]):

- 15–20 % der IT-Projekte des Portfolios können aufgegeben werden, weil sie nicht messbar zum Unternehmenserfolg beitragen.
- Weitere 25 % der IT-Projekte müssen nicht in vollem Umfang fortgeführt werden, sondern erfüllen auch in reduzierter Form ihre Aufgaben.
- Etwa 30 % der IT-Projekte dienen nicht der Unterstützung der Fachbereiche und stellen reine IT-Projekte dar, deren Effizienz für das Unternehmen oftmals nur unzureichend quantifizierbar ist.
- Zwischen 40–50 % aller e-business-Initiativen unterstützen nicht die Geschäftsziele und führen zu keinem messbaren Mehrwert.

Definitionen und Abgrenzungen

Bevor mit der Erstellung oder Anpassung des Projektportfolios gestartet wird, soll eine Abgrenzung zu artverwandten Themen erfolgen, die oft einer Verwechslung unterliegen. Das sind die im Folgenden beschriebenen Projekt- und Programm-Managementthemen:

- *Projektmanagement* ist die kleinste Einheit und beschreibt die Führung und das Management eines Projektes. Verantwortlich ist ein Projektleiter.
- Als Untereinheit entstehen bei größeren Projekten vereinzelt *Teilprojekte*, die sich mit spezifischen Themen oder Inhalten beschäftigen. Diese werden von Teilprojektleitern geführt, die an den Projektleiter berichten.
- *Programmmanagement* ist definiert als das Management von mehr als einem Projekt; Projekte werden in diesem Fall aus thematischer oder inhaltlicher Perspektive zu einem Programm als oberste Einheit gebündelt und hoheitlich von einem Programmmanager geführt.
- *Projektportfoliomanagement* ist definiert als ein Managementinstrument, welches alle Projekte und Programme gleichzeitig betrachtet unter dem Gesichtspunkt der strategi-

schen Priorisierung. Es ist eine dauerhafte Aufgabe in Abgrenzung zum Projekt bzw. Programm, welche immer zeitlich eingegrenzt ist. Das Projektportfoliomanagement bietet eine projektübergreifende Übersicht zur Analyse, Steuerung und Führung aller Projekte und Programme. Man befindet sich hier in der Vogelperspektive und kann schnell und übersichtlich alle Projekte und Programme strategisch bewerten, priorisieren und Entscheidungen treffen. Damit sind auch schnell Synergien zwischen den Projekten erkennbar. Es geht um die Frage: „Welches sind die < richtigen > Projekte für unser Unternehmen zu diesem Zeitpunkt?“. Im Rahmen des Projektportfoliomanagements sind strategische und finanzielle Bewertungsaspekte wie der ROI oder Ausrichtung auf die UN-Strategie die wesentlichen Bezugsgrößen. Daher ist das Projektportfoliomanagement ein ideales Werkzeug für CIOs und IT Leiter zur strategischen Führung der IT-Organisation.

Die Abb. 4 zeigt die beschriebene Abgrenzung zwischen Programm- und Projektportfoliomanagement schematisch und übersichtlich:

Eine weitere Abgrenzung zum *Multiprojektmanagement* erscheint nötig. Denn dieses weist große Ähnlichkeiten zum Projektportfoliomanagement auf und wird oft verwechselt. Der Unterschied liegt in der Betrachtungsweise: Das Projektportfoliomanagement hat eine Sicht auf die Projekte aus der Vogelperspektive und prüft Synergien sowie die strategisch richtige Ausrichtung der Projekte, wohingegen das Multiprojektmanagement durch einen starken operativen Charakter geprägt ist, also eher auf inhaltlicher Ebene der einzelnen Projekte agiert. Multiprojektmanagement beschreibt mehr das operative Handeln der Führung und des Managements einer Vielzahl von Projekten, wohingegen das Projektportfoliomanagement eher strategischen Charakter im Sinne der Prüfung, Beurteilung und des Monitorings von Projekten besitzt.

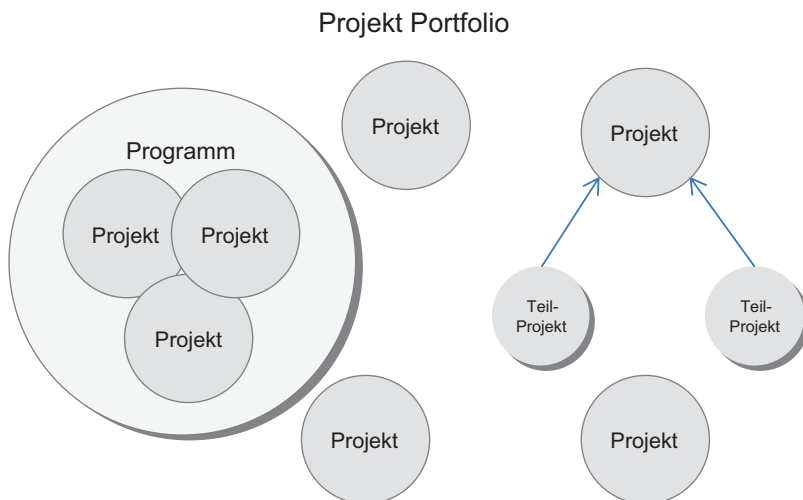


Abb. 4 Abgrenzung Projekt – Programm – Portfolio

Einsatzgebiete von IT-Projektportfolios

Einsatzgebiete von IT-Projektportfolios sind (In-Scope):

- Priorisierung, Kategorisierung und Evaluation von neuen und laufenden Projekten und Programmen
- Kontrolle und Monitoring des Mehrwerts von Projekten und Programmen
- Redundanzen zwischen Projekten können schneller erkannt werden
- Die Projektziele können besser aufeinander abgestimmt werden
- Ideale Diskussionsgrundlage für die Abstimmung der Ziele mit den Fachbereichen
- Basiswerkzeug für die Entwicklung einer IT-Strategie
- Basis für Make or Buy-Entscheidungen (Beantwortung der Frage: „Soll das Projekt oder die dahinter stehende Software oder IT-Infrastrukturkomponente selbst erstellt oder von einem Lieferanten erbracht werden?“)

Was ein IT-Projektportfolio nicht leisten kann (Out-of-Scope):

- Kein Ersatz für das Demand- und Anforderungsmanagement
- Es kann nicht eine IT-Strategie ersetzen,
- Es ersetzt nicht das detaillierte Tracking und Monitoring innerhalb eines Projektes (Projektcontrolling), sondern ist ein strategisches Instrument zur Auswahl und Überwachung aller Projekte im Unternehmen.

Es zeigt sich damit die übergeordnete Zielsetzung des Projektportfoliomanagements: Die Optimierung der Ziele der einzelnen Projekte aus ganzheitlichem Betrachtungswinkel, um möglichst große qualitative und quantitative Synergieeffekte zu erzielen.

Mit Hilfe eines professionellen Projektportfoliomanagements lässt sich sehr schnell erkennen, wo IT-Budget optimal für den Unternehmenszweck eingesetzt wurde und wo nicht. Es entstehen daraus Handlungs- und Entscheidungsstränge, die sonst oftmals nicht transparent sind. Darüber hinaus ist schnell zu erkennen, wann IT-Projekte strategisch nicht mehr sinnvoll sind. In solchen Fällen sollte ein IT-Verantwortlicher „schlechtem“ Geld nicht weiterhin gutes hinterherwerfen, sondern das jeweilige IT-Projekt sofort beenden und die entstandene „Ruine“ einfach abreißen lassen.

Ziele und Aufgabengebiete des Projektportfoliomanagements

Es werden in diesem Zusammenhang drei wesentliche Aufgabengebiete des Projektportfoliomanagements unterschieden (in Anlehnung an [18]):

Bewertungsphase

- Bewertung von Projektanträgen und Projekten nach Chancen, Risiken, Wirtschaftlichkeit und strategischer Bedeutung für das Unternehmen
- Analyse von Abhängigkeiten zwischen geplanten und laufenden Projekten
- Priorisierung von Projektanträgen auf Basis dieser Bewertungen und Analysen
- Genehmigung bzw. Ablehnung von Projektanträgen

Fortschrittskontrolle

- Überwachung der laufenden Projekte (Multi-Projektcontrolling)
- Koordination zwischen den laufenden Projekten hinsichtlich Ressourcen, Synergien und Konflikten
- Laufende Überprüfung des Projektportfolios hinsichtlich seiner Ausrichtung auf die Unternehmensziele

Bewertung und „lessons learned“

- Abschließende Bewertung von beendeten Projekten
- Sicherung der Erfahrungswerte aus laufenden und abgeschlossenen Projekten (Wissensdatenbank)
- Definition von Vorgaben für neue Projekte
- Initiierung von neuen Projekten

Ziel der IT-Organisation durch Projektportfoliomanagement ist das Schaffen von Kapazitäten für Innovationsthemen, die es der IT erlauben, gestalterisch tätig zu werden und so den Mehrwert des Unternehmens zu steigern. Dies kann nur geschehen, wenn durch Analyse und richtige Priorisierung auf Basis eines Projektportfolios die großen Wartungs- und Betriebsprojekte detailliert durchleuchtet und auf den Prüfstand gestellt werden. Gibt es andere Möglichkeiten der Wartung? Wo kann Geld gespart werden? Welche Projekte stiften keinerlei Wert bzw. Nutzen in Relation zu den Kosten?

Das Vorgehensmodell zur Erstellung und zum Monitoring eines Projektportfolios

Die Bandbreite an Aufgaben für das Projektportfoliomanagement ist sehr groß. So beginnt in vielen IT-Organisationen die Portfolioarbeit schon beim Sammeln und Einbringen von Projektideen, geht über die Portfolio-Erstellung und den Monitoring-Prozess und endet mit der Nachkalkulation von beendeten Projekten. Diese Aufgabenvielfalt würde den Portfolio-Prozess ganzheitlich abbilden. Oft werden viele der genannten Aufgaben nicht zum Portfolio-Prozess gezählt und gehören eher zum Projektmanagement. Hier allerdings werden wir uns dem ganzheitlichen Portfolioprozess zuwenden, wie er in Abb. 5 dargestellt ist.



Abb. 5 Übersicht Portfolio-Prozess

Der ganzheitliche Portfolio-Prozess besteht aus vier Hauptprozessen, denen jeweils vier Unterprozesse zugeordnet sind. Bevor eine ausführliche Beschreibung des Portfolio-Prozesses erfolgt, macht es Sinn sich über den Lebenszyklus von Projekten als eine Art Exkurs Gedanken zu machen.

Exkurs: Lebenszyklus von Projekten

Jedes Projekt unterliegt einem Lebenszyklus, ähnlich den Produkten im Produktlebenszyklus der BCG-Analyse in Schritt 2. Bevor mit dem Portfolio-Prozess gestartet wird, sollte geklärt werden, in welcher Zyklusphase sich ein Projekt gerade befindet oder generell befinden kann.

Zusammengefasst gibt es, wie in Abb. 6 zu sehen, folgende Projektzustände:

- a. Projekte vor der Aufnahme in das Portfolio
 - Projektidee (on the horizon)
 - Beantragtes Projekt
 - Zurückgestelltes Projekt

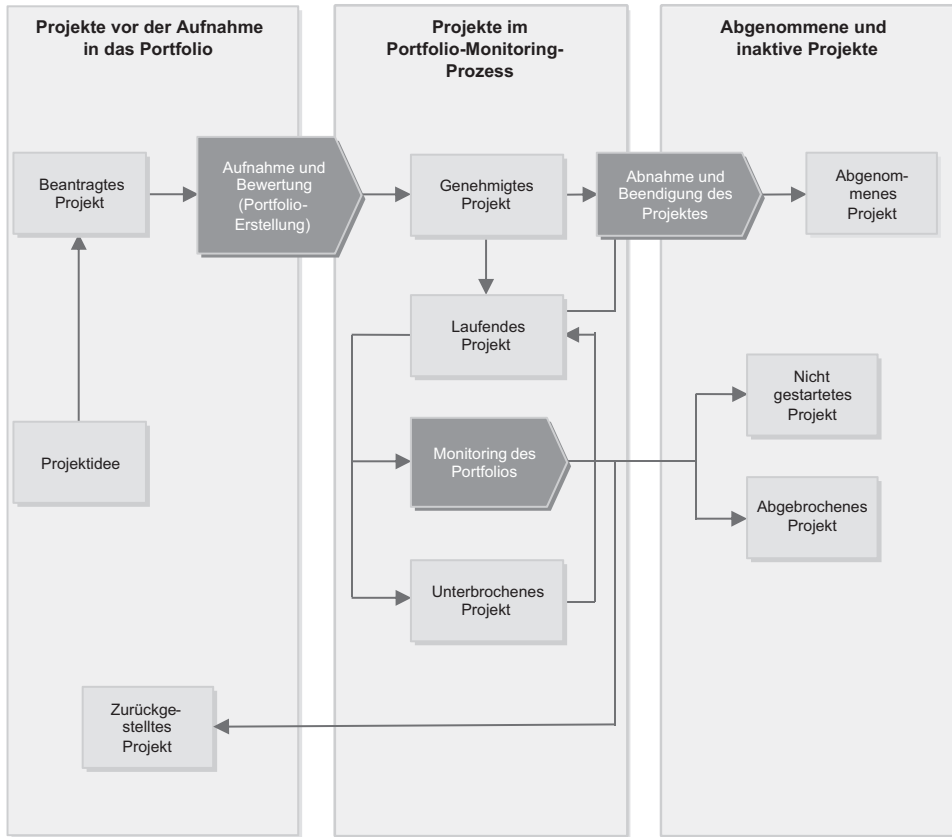


Abb. 6 Übersicht Projektzustände

b. Projekte im Portfolio-Monitoring-Prozess

- Genehmigtes Projekt
- Laufendes Projekt
- Unterbrochenes Projekt

c. Abgenommene und inaktive Projekte

- Abgenommene Projekte
- Nicht gestartete Projekte
- Abgebrochene Projekte

Phase 1: Der Aufnahme- und Bewertungsprozess

Der erste Hauptprozess beginnt mit der Aufnahme von Projekten in Form von Projektideen, die dann zu einem Projektantrag führen, sofern dem Vorhaben eine gewisse Realisierungs-Wahrscheinlichkeit zugetraut wird. Im Projektantrag werden zum ersten Mal einige Informationen zum Projekt strukturiert zusammengefasst, so zum Beispiel:

- Projekt-Name
- Projekt-Nummer (falls vorhanden)
- Verantwortliche Abteilung oder Fachbereich für das Projekt
- Kostenstelle (interne Übernahme der Projektkosten)
- Projekt-Ziel
- Projekt-Fokus: In-Scope und Out-of-Scope
- Möglicher Projekt-Start
- Ungefähre Projekt-Dauer
- Projekt-Risiken

Alle Projekte, die offiziell beantragt werden, müssen dann von einem Gremium, welches für den Portfolioprozess verantwortlich ist, bewertet und priorisiert und somit in gewisser Form nach bestimmten Kriterien gefiltert werden.

Es ist wichtig zwischen der Projektbewertung und der Projektpriorisierung zu differenzieren. Die Bewertung der Projekte dient der Maßgabe, ob ein Projekt durchgeführt wird oder nicht. Die Priorisierung eines Projektes dient der Erarbeitung einer Durchführungsreihenfolge und gilt damit nur für die Projekte, die bei der Bewertung als Mussprojekt nicht durch den Filter gefallen sind.

Die Kriterien zur Bewertung von Projekten sind individuell festzulegen und beziehen sich auf monetäre Faktoren, Risikofaktoren, Wirtschaftlichkeits- oder Kosten-/Nutzen-Faktoren. Bei der Priorisierung sind die Kriterien oftmals schwerer zu erfassen und in vielen Unternehmen unterliegt diese Bewertung subjektiven Entscheidungen der Gremienleiter. In der kommenden Phase 2 wird das Projektportfolio zum ersten Mal erstellt oder auf den neuesten Stand gebracht und drei mögliche Sichtweisen zur Beurteilung der Priorisierung der Projekte vorgestellt.

Beispielhaft für die Produktio weltweit GmbH werden hier einige IT-Projekte aus der gerade erstellten Roadmap überprüft und in ein Projektportfolio aufgenommen (siehe im folgenden Kapitel die Abb. 7 ff.). Es werden die folgenden Projekte der Produktio weltweit GmbH näher betrachtet:

- SAP Erweiterungen Teil 1
- SAP und MES Roll-Out an den Auslandsstandorten
- Schnittstelle SAP/MES
- Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)
- Einführung IT-Compliance

Phase 2: Der Portfolio-Erstellungsprozess

Nachdem die Projekte in der ersten Phase grob vorgefiltert wurden, werden diese Projekte jetzt in das Portfolio eingebracht. In dieser Phase wird entweder ein bestehendes Projektportfolio auf den neuesten Stand gebracht oder zum ersten Mal ein Projektportfolio erstellt.

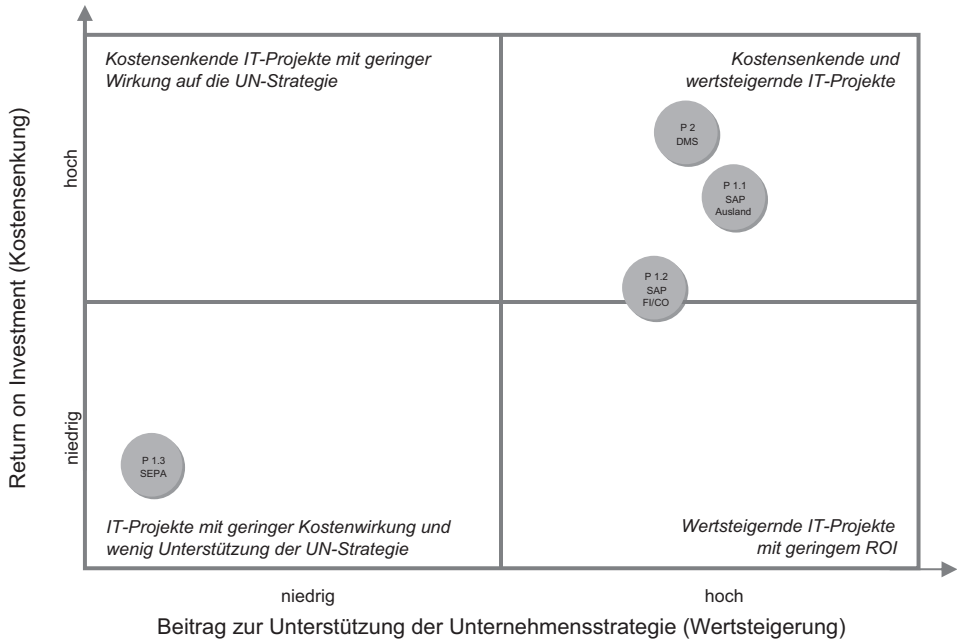


Abb. 7 IT-Projekt-Portfolio: Beitrag zur Unterstützung der UN-Strategie

Als erstes müssen neben den in der Phase 1 erfassten Projektdaten insbesondere folgende Informationen ermittelt werden:

- Wirtschaftlichkeit des Projektes in Form eines ROI (Return on Investment)
- Das Risiko des Projektes (meistens eine eher subjektiv zu bewertende anstatt einer mathematisch herzuleitenden Kenngröße)

Um die Projekte nach den drei gerade beschriebenen Kriterien zu priorisieren, gibt es verschiedene Sichten auf das Portfolio:

Die für das IT-Portfolio verwendeten Achsenwerte sind auf der Ordinate der „Return on Investment (ROI)“ als quantitativer Wert des jeweiligen Projektes oder qualitativ ausgedrückt, wenn der ROI schwer zu ermitteln ist: Der Nutzen des Projektes für das Unternehmen. Auf der Abszisse können die benutzten Werte variieren, um verschiedene Aussagen über die Projekte zu erhalten. Mögliche Aussagen können sein:

- Beitrag zur Unterstützung der Unternehmensstrategie (sogenanntes „nutzen- und strategieorientiertes IT-Portfolio“)
- Realisierungsrisiko oder „nutzen- und risikoorientiertes Portfolio“

Das nutzen- und strategieorientierte IT-Portfolio

Im *nutzen- und strategieorientierten IT-Portfolio* wird bewertet, wie sehr das Projekt der Unternehmensstrategie dient (siehe Abb. 7). Anmerkung: Die im Folgenden aufgeführten Beispiele basieren alle auf Projekten der Produktio weltweit GmbH, wie sie im vorherigen Abschnitt als Maßnahmen in die Roadmap eingegangen sind. Es sind vier Projekte ausgewählt worden, die in den jeweiligen Portfolios näher untersucht werden:

- P1: Es handelt sich bei P1 um das Projekt „SAP Erweiterungen Teil 1: FI/CO, Auslandsstandorte, SEPA“, welches in drei Teilprojekte gegliedert wurde (P1.1–P1.3), um deren Beitrag zu Strategie oder deren Risiko bewerten zu können.
 - P1.1: In dem Teilprojekt P1.1 ist die SAP Einführung für die Auslandsstandorte abgebildet
 - P1.2: Das Teilprojekt P1.2 beinhaltet die SAP Einführung FI/CO
 - P1.3: Teilprojekt P1.3 steht für die Einführung von SEPA
- P2: Ein Projekt zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)

Es ist in Abb. 7 deutlich zu sehen, dass alle 4 Projekte im Portfolio einen anderen Platz eingenommen haben. So ist das Teilprojekt P1.1 zur Einführung von SAP in den Auslandsstandorten in dem rechten, oberen Quadranten als „kostensenkendes und wertsteigerndes Projekt“ klassifiziert worden. Im Gegensatz zu P2 (DMS-Einführung), welches ebenfalls in diesem Quadranten dargestellt wurde, ist bei P1.1 der Nutzen für das Unternehmen bzw. der RoI nicht so hoch wie bei der DMS-Einführung. Diese Einteilung kann auf klaren Berechnungen basieren, bei der Einführung des Portfoliomanagements allerdings kann dies auch auf subjektiven Meinungen der Gremien basieren, die natürlich argumentativ festgehalten werden müssen. In diesem Fall ist es so, dass das Portfolio-Gremium entschieden hat, dass die DMS-Einführung einen größeren Nutzen hat als die SAP-Einführung in den Auslandsstandorten. Dies liegt daran, dass aktuell alle Dokumente manuell in Ordnern abgelegt werden und die Buchungen zwar im SAP vorhanden sind, aber trotzdem noch physisch aufbewahrt werden müssen. Dies kann automatisiert werden und dadurch können Arbeitsplätze eingespart werden und eine wesentlich effizientere Struktur beim Suchen und Finden von Dokumenten wird ermöglicht. Das Teilprojekt P1.3 (Einführung SAP FI/CO) geht mit den beiden Teilprojekten P1.1 und P1.2 einher und wird ebenfalls gerade noch im oberen, rechten Quadranten einsortiert. Allerdings ist hier die Wertsteigerung und die Kosteneinsparung nicht ganz so hoch wie bei den zusammenhängenden Teilprojekten, da die aktuellen Aufwände nicht direkt durch die Einführung von SAP FI/CO verringert werden und damit kein direkter RoI sofort erkennbar sein wird. Allerdings muss aufgrund der Abhängigkeit der drei Teilprojekte gesagt werden, dass sie sich gegenseitig unterstützen und daher nicht weit auseinander im Portfolio klassifiziert werden. Das Projekt P2 (Einführung SEPA) ist im unteren, rechten Quadranten einsortiert worden, da es dem Unternehmen strategisch keinen Vorteil bietet, da die bisherige Abrechnung genauso gut funktioniert hat und auf der Kosten- oder Return-Seite ebenfalls keinen Nutzen bringt, sondern nur Geld kostet. Es ist als gesetzliche Anforderung zwar durchzu-

führen, bringt aber im Grunde nur Mehraufwand, der keinen strategischen Nutzen liefert. Projekte, die in diesem Quadranten landen, sollten nach nochmaliger Prüfung möglichst schnell beendet werden, da sie keinen Nutzen liefern und nur Kosten verursachen. In solchen Fällen ist ein Portfolio sehr hilfreich, da es sehr schnell visuell aufzeigt, welche Projekte wirklichen Nutzen liefern und welche Projekte schnell beendet werden können, da sie nur Kosten produzieren, aber keinen Nutzen liefern.

Das nutzen- und risikoorientierte IT-Portfolio

Häufig wird das *Risiko* von IT-Projekten zwar in dem jeweiligen Projekt betrachtet, aber häufig nicht im Gesamtkontext aller laufenden Projekte. Das führt leider oft zu einer hohen Quote von gescheiterten IT-Projekten. Deshalb ist eine Risikobetrachtung aller Projekte empfehlenswert. In unserem Beispiel in Abb. 8 ist – in Anlehnung an das nutzen- und strategieorientierte Portfolio – auf der Ordinate wieder der RoI angegeben und auf der Abszisse das Risiko des Projektes.

Es wird in diesem Portfolio visuell sehr schnell deutlich, dass alle Projekte durchaus ein Risiko beinhalten, welches größer als 30 % ist. Daher muss bei allen Projekten ein detailliertes Risiko- und Qualitätsmanagement eingeführt werden, um die Risiken im Griff zu behalten. Allerdings ist nur ein Projekt mit einem Risiko des Scheiterns von größer als 50 % im Portfolio zu finden: Die Einführung von SAP in den Auslandsstandorten. Wichtig ist bei der Klassifizierung und der Bewertung, welche Art von Risiko dem Projekt zu Grunde liegt. Hier ist es nicht so sehr die eigentliche technische Implementierung von

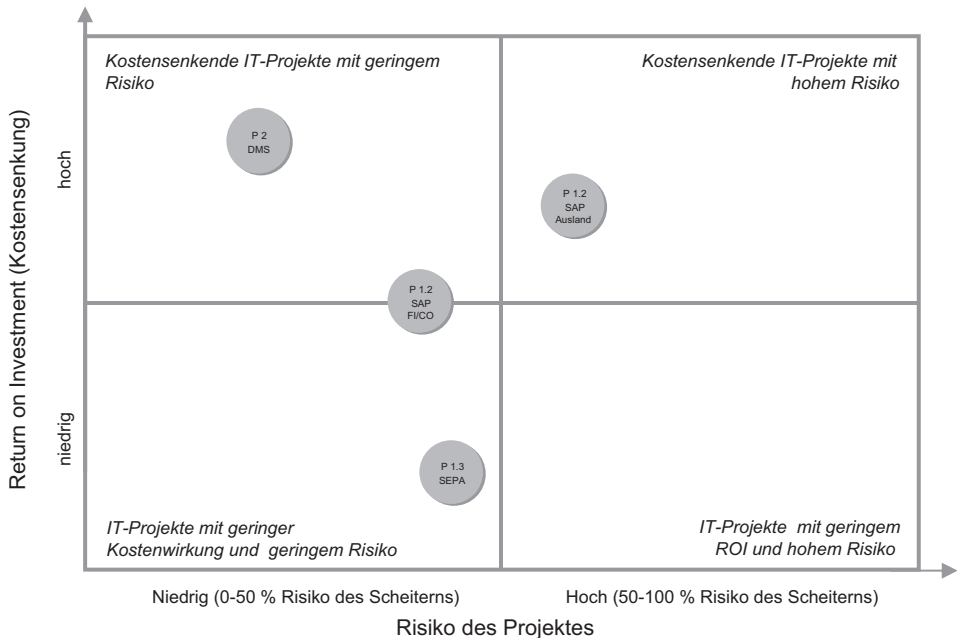


Abb. 8 IT-Projekt-Portfolio: Risikoabschätzung der Projekte

SAP in den Auslandsstandorten, sondern die Schulung und anschließende Nutzung von SAP. Das Problem ist die geringe Qualifikation in den Auslandsstandorten in den Fachbereichen, die dann mit SAP arbeiten müssen. Die beste SAP-Installation bringt nichts, wenn die Bedienung und die Funktionen nicht richtig genutzt werden. Daher ist hier insbesondere eine enge und direkte Zusammenarbeit sowohl mit den betroffenen Fachbereichen im Headquarter als auch in den Auslandsstandorten anzuraten, damit das Projekt zum Erfolg werden kann.

Phase 3: Der Portfolio-Monitoring-Prozess

Nachdem das Projektportfolio erstellt oder auf den neusten Stand gebracht wurde, geht es um die Analyse und das Monitoring der Projekte. Im Rahmen der Überwachung der Projekte stehen folgende Aufgaben an:

- Prüfung der Projekte nach den üblichen Projektdreieck-Faktoren Zeit, Kosten und Qualität
- Prüfung und Einordnung der Projekte nach den drei in Phase 2 dargestellten Portfolioebenen
 - Beitrag zur Unterstützung der Unternehmensstrategie
 - Realisierungsrisiko
 - Realisierungswahrscheinlichkeit
- Treffen von Entscheidungen über die Neu-Einordnung oder das Weiterführen oder Stoppen von Projekten im Projektportfolio (siehe dazu als Entscheidungsmatrix die Abb. 9 in Anlehnung an Gadatsch [18]).

Nachdem die Entscheidungen getroffen wurden, müssen diese mit den daraus abgeleiteten Maßnahmen an alle Betroffenen kommuniziert werden (wichtig ist hier die Einbindung aller im Fachbereich Betroffenen, sofern sie nicht an der Entscheidung beteiligt waren).

Phase 4: Projektende: Abnahme und Bewertung

In der letzten Phase des Projektportfolioprozesses geht es um den Abschluss von Projekten. Auch hier werden wieder vier Teilschritte betrachtet:

- Die offizielle Übergabe des Projektes an den Fachbereich.
- Der offizielle Projektabschluss: Das Projekt muss final vom Fachbereich bewertet und abgenommen werden; erst dann kann das Projekt in der IT als offiziell beendet betrachtet werden und es geht in den Betrieb über, der durch einen Wartungsvertrag die weitere Unterstützung der zugrundeliegenden Applikation regelt.
- Abweichungen und Erfolge messen: Nach dem offiziellen Abschluss müssen noch ausstehende Abweichungen festgehalten werden.
- Lessons learned: Es ist darüber hinaus eine Art „Lessons learned“ immer sehr hilfreich, in der offen von allen Projektbeteiligten hilfreiche Erkenntnisse und Maßnahmen für weitere Projekte abgeleitet werden können.

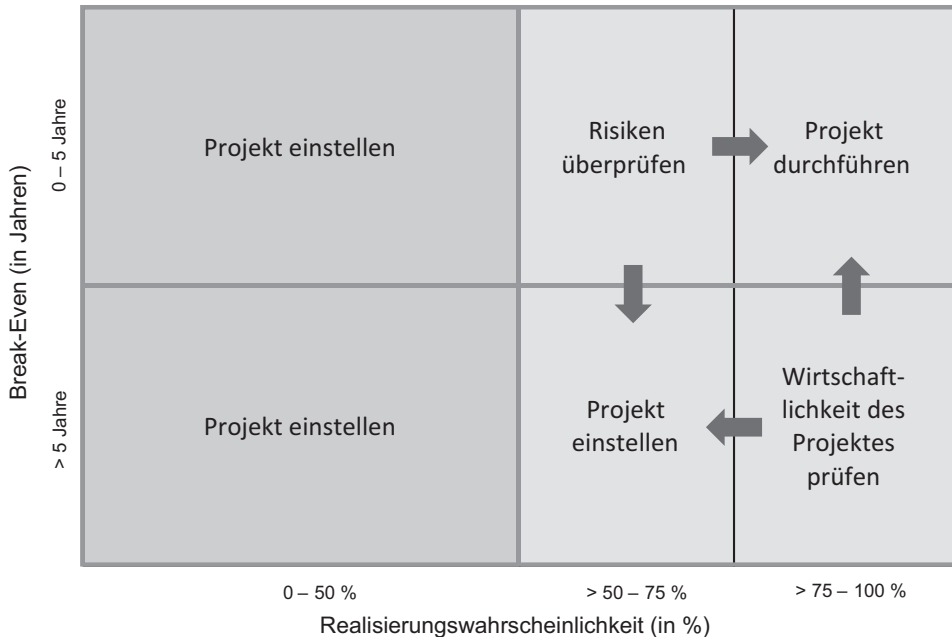


Abb. 9 Entscheidungen im IT-Projektportfolio treffen

Damit ist der Prozess der Portfoliobetrachtung von IT-Projekten abgeschlossen.

Organisatorische Einbindung

Die Verantwortung für den Projektportfoliomanagement-Prozess sollte direkt dem CIO oder IT-Leiter unterstellt sein und als Stabsstelle fungieren. Nur durch die direkte Anbindung an den CIO kann die Effizienz sichergestellt werden und politische Grabenkämpfe können proaktiv ausgeschlossen werden.

Neben der direkten CIO-Verantwortung ist die enge Einbindung der Fachbereiche erfolgskritisch. Dies erfolgt durch ein Gremium oder Komitee, welches regelmäßig tagen muss.

Wichtig ist die Kommunikation und Transparenz der Entscheidungen aus dem Portfolio-Komitee. Jeder Mitarbeiter muss wissen, welche Projekte aus welchem Grunde priorisiert wurden. Dies ist die tägliche Arbeits- und Motivationsbasis im Projektgeschäft einer IT-Organisation.

Arbeitsfragen und Umsetzung Schritt 6

Vorbereitungen für Schritt 6


Für die Bearbeitung der Aufgaben in Schritt 6 ist es wichtig, dass Sie alle bisherigen Ergebnisse noch einmal sichten zur Ableitung aller Maßnahmen. Darüber hinaus ist die Bud-

getierung sehr wichtig, die möglichst mit Argumentationsketten und sofern möglich auch mit Einsparpotenzialen aufwartet. Das IT-Portfolio sollte dann in einem neu zu schaffenden Gremium, gemeinsam mit dem Fachbereich, erarbeitet und alle Projekte darin gemeinsam bewertet werden.

Die Roadmap für die IT-Strategie

Im ersten Schritt werden zur Erstellung der Roadmap die Maßnahmen aus den jeweiligen Schritten 1–5 abgeleitet.

Es wird gestartet mit Schritt 1, für den ein IST-SOLL-Vergleich der Reifegrade aller Prozesse vorgenommen wird (basierend aus den Ergebnissen aus Schritt 1). In dem Arbeitsblatt 1 können Sie jetzt alle Untersuchungsgegenstände aus Schritt 1 heranziehen, in denen ein Delta zwischen Ist und Soll klafft.

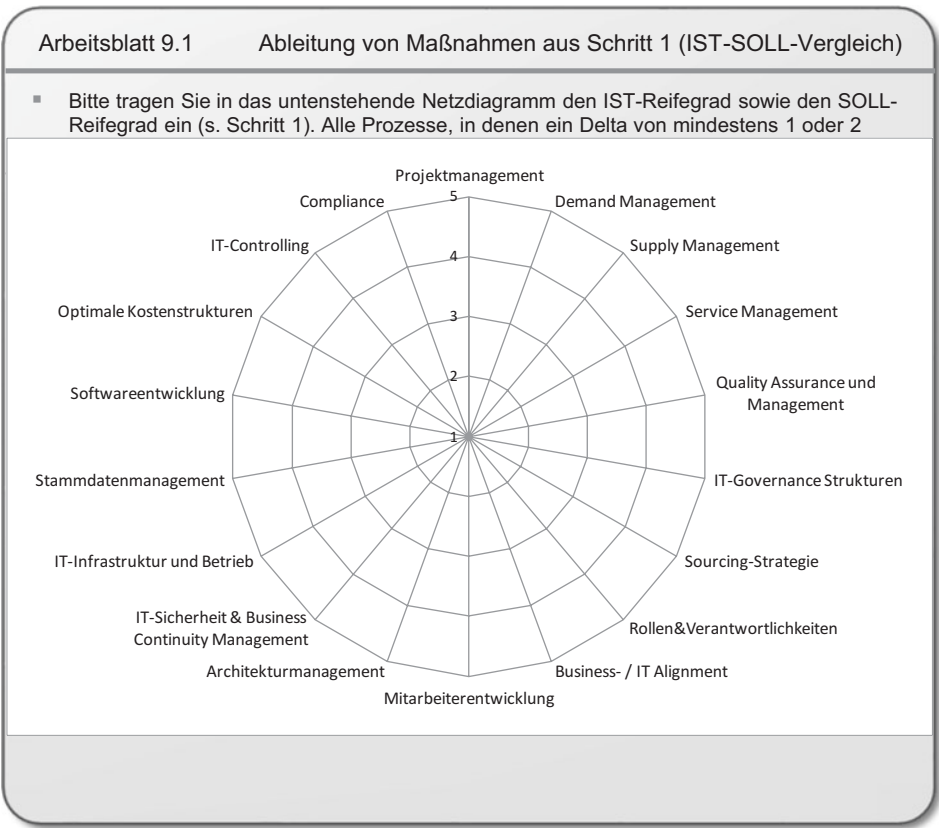

Um Maßnahmen abzuleiten für die Bereiche, in denen noch ein Unterschied zwischen Ist und Soll klafft, dient das folgende Arbeitsblatt 2. Dort tragen Sie in die Spalten 1 und 2 noch einmal die Bereiche mit den zu großen Deltas zwischen Ist und Soll ein und dann muss von Ihnen entschieden werden, welche Maßnahmen dazu abgeleitet werden sollen.

Arbeitsblatt 9.2 Ableitung von Maßnahmen aus Schritt 1

- Bitte tragen Sie in die Spalte 1 noch einmal alle Bereiche aus Schritt 1 ein, die ein zu großes Delta zum SOLL haben, in Spalte 2 den IST und den SOLL Reifegrad und in Spalte 3 die Maßnahmen, die nötig sind um das SOLL zu erreichen

[illegible]

In dem nächsten Arbeitsblatt 3 werden die Maßnahmen von Schritt 2 aus den Herausforderungen für die IT abgeleitet:

Arbeitsblatt 9.3 Ableitung von Maßnahmen aus Schritt 2

■ Bitte tragen Sie in die untenstehende Tabelle in Spalte 1 die Herausforderungen ein, die in Schritt 2 erkannt wurden und die Maßnahmen, die daraus abgeleitet werden in Spalte 3

Herausforderungen, die in Schritt 2 erarbeitet wurden	Maßnahmen, die daraus abgeleitet werden
BEISPIEL: IT-Kosten prüfen und transparenter machen, um Einsparungen zu verhindern	Es ist großer Druck entstanden durch den neuen Vorgesetzten, der die IT-Kosten senken möchte; es ist daher notwendig, dass in einem ersten Schritt die IT-Kosten transparent gemacht werden, um überhaupt zu verstehen, für was das Geld ausgegeben wird und um mögliche Kostentreiber zu erkennen. Hilfreich wäre die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung für die IT sowie ein IT-Controlling. Darüber hinaus wird im Rahmen der Einführung von Demand/Supply im Demand-Zweig das IT-Controlling etabliert mit Business Cases und Wirtschaftlichkeitsrechnungen pro Projekt. Dies sollte als Maßnahme auf jeden Fall in die Roadmap aufgenommen werden.

Viele der bereits genannten Maßnahmen sind organisatorischer Natur und passen daher in den Schritt 5 (IT-Organisation/IT-Governance). Daher sollten hier noch einmal alle Maßnahmen aufgelistet werden, die thematisch zu Schritt 5 passen:

Arbeitsblatt 9.5

Ableitung von Maßnahmen aus Schritt 5

- Bitte tragen Sie in die untenstehende Tabelle in Spalte 1 die erkannten Themen und Probleme aus dem Schritt 5 (zum Beispiel Organisation überarbeiten oder IT-Rolle neu definieren) und dann die Maßnahmen in Spalte 3 (z. B. Projekt „Neue Rolle der IT“)

[illegible]

Alle jetzt ermittelten Maßnahmen müssen noch einmal zusammengefasst und geclustert werden nach organisatorischen und technischen Maßnahmen, was in dem Arbeitspaket 6 geschieht.

Arbeitsblatt 9.6

Zusammenfassung aller Maßnahmen

- Bitte tragen Sie in die untenstehende Tabelle in Spalte 1 alle bisher gefundenen organisatorischen Maßnahmen ein (z. B. „Neue Rolle der IT definieren“ oder „Demand/Supply einführen“) und daneben die technischen Maßnahmen (alle aus der Applikationsroadmap und sonstige technische Maßnahmen)

[illegible]

Als letzten Schritt müssen diese Maßnahmen in einen Zeitkontext gebracht werden, was mithilfe der Roadmap geschieht. Dazu dient das folgende Arbeitsblatt 7, in der alle Maßnahmen in eine zeitliche Reihenfolge gebracht werden. Darüber hinaus werden die Maßnahmen hier zu thematisch und zeitlich zueinander passenden Bündeln zusammengefasst und farblich markiert nach organisatorischen sowie technischen Maßnahmen.

Arbeitsblatt 9.7

Die IT-Roadmap

- Jetzt müssen alle entdeckten Maßnahmen geclustert, zusammengefasst, Verdopplungen erkannt und gestrichen und dann in die unten vorbereitete Roadmap gebracht werden.
- Eine Clusterung mit Hilfe der Farbe kann erfolgen nach applikatorischen/technischen oder organisatorischen Maßnahmen

Ermittlung des IT-Budgets

Nachdem die IT-Roadmap erstellt ist und damit klar ist, was alles idealerweise gemacht werden sollte, folgt die Bewertung aller Maßnahmen auf monetärer Basis. Denn nur wenn klar ist, was die Maßnahmen kosten, kann die Unternehmensleitung diese freigeben und ein Budget dafür zur Verfügung stellen. Die folgende Tabelle dient der monetären Bewertung aller Maßnahmen.

Arbeitsblatt 9.8

Ermittlung des IT-Budgets

■ Bitte übertragen Sie in die untenstehende Tabelle in Spalte 1 alle Maßnahmen aus der Roadmap ein, um dann pro Maßnahme eine Kostenkalkulation in Spalte 2 zu machen. Spalte 3 gibt den errechneten Gesamtbetrag an.

Maßnahmen aus der Roadmap	Kostenkalkulation	Kosten-schätzung

In dem folgenden Arbeitsblatt 9 können die Einsparungen ermittelt oder zumindest argumentativ die Potenziale für Einsparungen genannt werden und es kann eine Einschätzung erfolgen, ob die Maßnahmen ausreichend sind für die Unternehmensziele Rendite und Mehrwert.

Arbeitsblatt 9.9

Einsparpotenziale und Renditeentscheidung pro Maßnahme

▪


Um zu prüfen, welches Einsparpotenzial welche Maßnahme bietet und ob diese Maßnahme dem Renditeziel des Unternehmens entspricht, dient die folgende Tabelle. Spalten 1 und 2 können übernommen werden aus Arbeitsblatt 9.8. Spalte 3 beschreibt argumentativ die Einsparpotenziale. Spalte 4 quantifiziert diese (falls möglich) und Spalte 5 sagt aus, ob diese Maßnahme dem Renditeziel des Unternehmens entspricht.

Projekt/Maßnahme	Kosten (in T€)	Potenziale für Einsparungen	Einsparungen quantifiziert	Erzeugt genügend Mehrwert und entspricht dem Renditeziel des Unternehmens

Das Projektportfolio


Zumindest aus allen technischen Maßnahmen werden IT-Projekte abgeleitet, aber auch die organisatorischen Maßnahmen sollten als Projekt aufgesetzt werden und dann in einem Portfolio geprüft werden. Dazu dienen die folgenden zwei Arbeitspakete, in denen alle

Maßnahmen als Projekte in einem Portfolio abgebildet werden und damit eine Entscheidung herbeigeführt werden kann, welches Projekt welchen strategischen Nutzen sowie ROI bietet, welche Projekte größere Risiken beinhalten und welche Projekte abschließend auf jeden Fall durchgeführt werden sollen, weil der strategische Nutzen, der ROI sehr hoch und das Risiko sehr niedrig sind und welche Projekte besser zunächst verschoben oder abgesagt werden sollten.

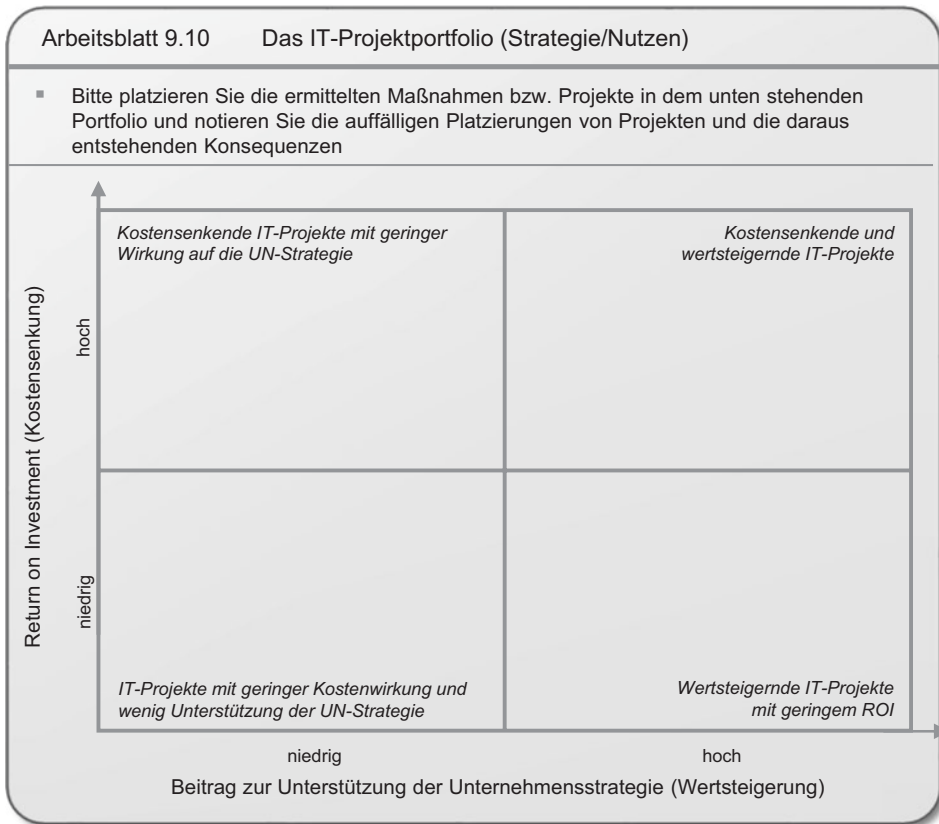

Arbeitsblatt 9.11

- Bitte platzieren Sie die gerade schon platzierten Projekte jetzt in dem Risiko-orientierten Portfolio unten und überlegen Sie, bei welchen Projekten sich jetzt ein so hohes Risiko ergibt, dass es vielleicht keinen Sinn macht, dieses zu Ende zu führen.

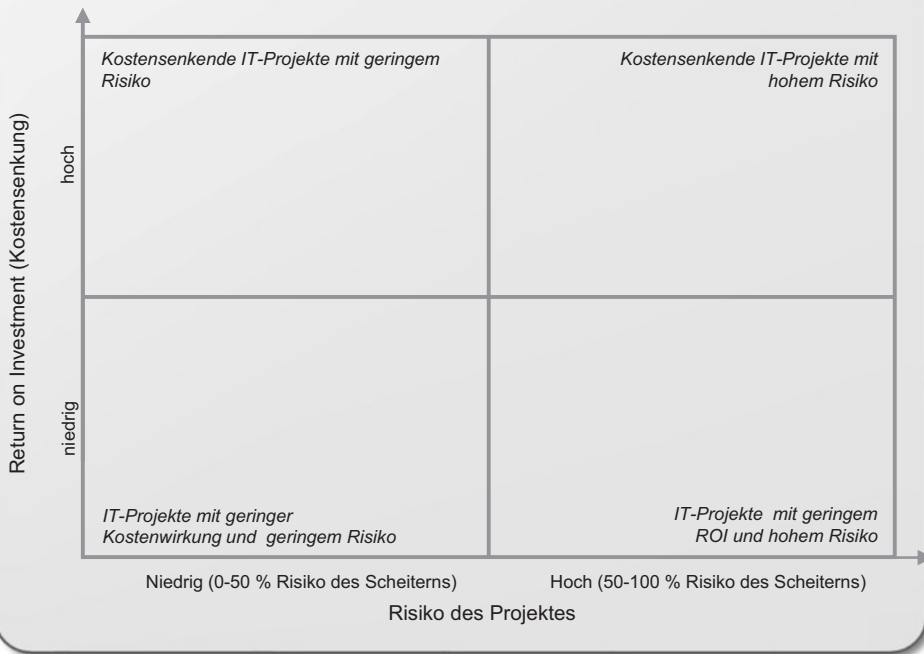

Fazit Schritt 6

Die Erstellung der Roadmap fasst alle getätigten Aussagen und Maßnahmen übersichtlich zusammen. Es wird damit deutlich, was alles zur Implementierung der IT-Strategie gehört und welche Aufgabenpakete geschnürt werden. Es werden zeitliche Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen den Maßnahmen und Projekten transparent und zeigen die Komplexität, die durch die grafische Darstellung in der Roadmap wieder etwas gemindert werden kann. Wichtig ist der dann folgende Schritt der Budgetierung und der Vorbereitung auf die Vorstellung im Top-Management zur Freigabe des 3–5 Jahres-Planes. Wenn dies geschafft ist, kann mit Hilfe des Projektportfolios ein Steuerungsinstrument genutzt werden, um die Projekte unter verschiedenen strategischen Gesichtspunkten zu monitoren und zum Erfolg zu führen.

Ihre wichtigsten Gedanken und Erkenntnisse zu Schritt 6:
